



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de **Infraestructura**
y **Obras Públicas**

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

**TERCER TRIMESTRE:
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE**

EJERCICIO FISCAL 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 03 DE OCTUBRE DE 2022.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS	
Unidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Programa de Desarrollo PMD	III. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Línea de acción PMD:	5.- ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE JULIO 2022 AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Objetivo del Proyecto: Contribuir a que la infraestructura del municipio sea moderna, funcional y cumpla cabalmente con las necesidades de la población y de quienes lo visitan mediante la entrega de una eficiente infraestructura urbana.

Descripción de la actividad/Proyecto: Se trabaja en la elaboración de Proyectos Ejecutivos de obra pública, los cuales están integrados por memorias descriptivas, planos arquitectónicos, especificaciones técnicas, catálogo de conceptos, programas de ejecución, etc., se realiza la contratación de la obra pública y los servicios relacionados con los mismos, cumpliendo con la supervisión de la construcción y con la normatividad aplicable al fondo de financiamiento y se integra el expediente técnico unitario de cada una de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a efecto de documentar la cuenta pública.

Población Objetivo: La población del Municipio de Solidaridad

Avances del Proyecto Obra Pública Realizada:

Se programaron 55(cincuenta y cinco) Obras Públicas a realizarse durante el ejercicio fiscal 2022, de los cuales se tienen 8 (ocho) obras públicas realizadas, es decir, se encuentran con un avance constructivo del 100%; estas obras públicas corresponden a las siguientes:

1. Reparación de Socavón en la Calle 1ra. entre Avenida 30 y Calle 35 del Municipio de Solidaridad.
2. Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad.
3. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad.
4. Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras.
5. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad.
6. Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad.
7. Pavimentación de Av. 70 Norte entre Av. Constituyentes y Calle 36 Norte en la Colonia el Pedregal.
8. Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad.

Representando un avance del 14.55%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Resultados Actividad 1: Se integran y validan 23 proyectos ejecutivos, de acuerdo a lo siguiente:

Inversión Programada con Recursos Fiscales:

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Beneficiados
1. Construcción de acceso a la localidad de Puerto Aventuras	\$ 3,000,000.00	22,878 habitantes
2. Conclusión de la Habilitación del Museo Interactivo Multicultural de Playa del Carmen 1era. Etapa.	\$ 4,750,000.00	4,000 habitantes
3. Construcción del Comedor Comunitario en el Centro de Desarrollo Comunitario el Peten	\$ 1,500,000.00	5,620 habitantes
4. Construcción de Parque Infantil en Calle Segarra, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen.	**Se omite dato por estar en Proceso de Licitación	1,555 habitantes
5. Construcción de Parque Infantil en Calle Tarragona, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen	** Se omite dato por estar en Proceso de Licitación	1,555 habitantes
6. Construcción de Espacio Deportivo en Av. Tumben Kin, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen.	** Se omite dato por estar en Proceso de Licitación	2,900 habitantes

Recursos Ramo 33 FORTAMUN:

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Beneficiados
7. Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Súper Manzana 075 en el Municipio de Solidaridad.	\$ 4,185,000.00	333,400 habitantes
8. Pavimentación de Avenida Loros entre Av. CTM y Av. Luis D. Colosio, Fracc. Villas del Sol.	\$ 7,167,290.00	333,400 habitantes
9. Repavimentación de la Avenida 7 sur entre Av. 10 y Boulevard Playa del Carmen.	\$ 8,000,000.00	4,200 habitantes
10. Rehabilitación de Filtro Policiaco en Carretera Federal km. 283, Playa del Carmen-Tulum.	**Proyecto en proceso de publicación de convocatoria.	333,400 habitantes
11. Rehabilitación de las Instalaciones del CEBIAM en la Colonia Ampliación Bellavista, en el Municipio de Solidaridad.	** **Proyecto en proceso de publicación de convocatoria.	333,400 habitantes



Recursos Ramo 33 FISM:

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Beneficiados
12. Construcción de la Pavimentación de la Av. 80, Av. 85 y Av. 90 norte entre Av. Constituyentes y Av. 36 del Municipio de Solidaridad.	\$ 3,340,487.73	3,349 habitantes
13. Rehabilitación de Pavimentación de la 115 Avenida entre Avenida Tumben kin y Avenida Mayapan del Municipio de Solidaridad.	\$ 9,987,481.69	333,400 habitantes

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
QUINTANA ROO
2024



Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Beneficiados
14. Construcción de 27 Pozos de Absorción en Diferentes Puntos en el Municipio de Solidaridad	\$ 2,723,234.41	333,800 habitantes
15. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Rehabilitación de Plaza Cívica en Escuela Jardín de niños Vicente Suarez, Col. Luis Donaldo Colosio.	\$ 2,066,622.05	414 alumnos
16. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Cancha Deportiva en Escuela Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Col. Villas del Sol	\$ 6,081,630.95	945 alumnos
17. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Ampliación y Rehabilitación de Cancha Deportiva en Escuela Secundaria Luz María Zaleta de Elsner, Col. Villas del Sol.	\$ 5,061,391.70	716 alumnos
18. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Cancha Deportiva en Escuela Primaria Evaristo Segundo, Col. Misión de las Flores.	\$ 6,015,120.21	476 alumnos
19. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Cancha Deportiva en Escuela Secundaria Tec. 40 Congreso Constituyente de 1974, en el Municipio de Solidaridad	\$ 5,792,841.45	450 alumnos
20. Construcción de la Pavimentación de la Av. 34 Norte entre la Av. 75 y la Av. 105 del Municipio de Solidaridad.	\$ 6,177,517.82	3,349 habitantes
21. Construcción de la Pavimentación en 95 av. y 100 av. Entre Constituyentes y Calle 36 Norte, en la Colonia Ejido Sur en el Municipio de Solidaridad.	\$ 3,150,000.00	3,349 habitantes
22. Rehabilitación y Ampliación al Centro de Salud Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad.	\$ 4,638,849.00	35,400 habitantes
23. Construcción de Techado en Área de impartición de educación física y ampliación y rehabilitación de cancha deportiva en Escuela Primaria Eduardo Priego León, col. Zazil-ha.	\$ 4,503,988.69	485 alumnos

Resultados de la Actividad 2. Se realiza integración de 11 expediente de licitación de obra pública, conteniendo la propuesta técnica, propuesta económica, proyecto ejecutivo, convocatoria, visita de obra, junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, dictamen técnico-económico, acta de fallo, contrato y fianzas correspondientes, para los siguientes:

No.	CON RECURSOS FISCALES
1	Rehabilitación de paraderos en el Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 05 de julio del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-018-2022 Monto Contratado \$ 1,999,927.09
2	Construcción de acceso a la localidad de Puerto Aventuras. Firma de Contrato 04 de agosto del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-032-2022 Monto Contratado \$ 2,996,948.67
3	Conclusión de la habilitación del Museo Interactivo Multicultural de Playa del Carmen 1era Etapa. Firma de Contrato 26 de septiembre del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-037-2022 Monto Contratado \$ 4,723,463.43



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



No.	CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN
4	Construcción de pasos peatonales en diversos puntos del municipio de Solidaridad, Segunda etapa. Firma de Contrato 13 de julio del 2022 15:30 horas Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-024-2022 Monto Contratado \$ 3,960,573.99
5	Pavimentación de carpeta asfáltica en la calle lirios entre calle ceiba y calle Caoba. Firma de Contrato 13 de julio del 2022 14:00 horas Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-025-2022 Monto Contratado \$ 1,397,028.22
6	Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas de la avenida 75 entre calle 36 norte y avenida sur, en el Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 13 de julio del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-026-2022 Monto Contratado \$ 9,808,108.20
7	Pavimentación de la Avenida diag. 65 entre Av. CTM y Av. Sur Firma de Contrato 19 de julio del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-027-2022 Monto Contratado \$ 22,026,364.87
8	Construcción de guarniciones y banquetas en la súper manzana 075 en el Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 04 de agosto del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-030-2022 Monto Contratado \$ 4,178,871.28
9	Pavimentación de avenida Loros entre Av. CTM y Av. Luis D. Colosio, Fracc. Villas del Sol. Firma de Contrato 04 de agosto del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-031-2022 Monto Contrato \$ 7,159,363.45
10	Repavimentación de la avenida 7 sur entre av. 10 y Boulevard Playa del Carmen. Firma de Contrato 26 de septiembre del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-035-2022 Monto Contrato \$ 7,997,333.35
11	Construcción de la pavimentación de la Av. 80, Av. 85 y Av. 90 norte entre Av. Constituyentes y Av. 36 del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 26 de septiembre del 2022 11:00 horas Nº Contrato HAS-SIyOP-FISM-036-2022 Monto Contrato \$ 3,325,487.00

Resultados de la Actividad 3. Se realiza supervisión de la obra pública contratada, teniendo los siguientes avances.

Obras Concluidas durante el 3er. trimestre:

NUM.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA OBRA	NO. DE CONTRATO	AVANCE FISICO
1	FORTAMUN	Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-003-2022	100%





NUM.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	NOMBRE DE LA OBRA	NO. DE CONTRATO	AVANCE FISICO
2	FORTAMUN	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-005-2022	100%
3	FORTAMUN	Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-006-2022	100%
4	FORTAMUN	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-009-2022	100%
5	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SIyOP-FORTAMUN-013-2022	100%
6	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-014-2022	100%
7	RECUSO FICAL	REHABILITACIÓN DE PARADEROS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SIyOP-RF-017-2022	100%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Evidencia Obras Concluidas:



CONTRATO: HAS-SH-OP-FORTAMUN-001-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 111 Y AVENIDA 71 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

MONTO DE CONTRATO: \$6,947,943.41 IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.


EMPRESA: INTERMAYA DEL CARIBE, S.A DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 de septiembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 100.00%

AVANCE FISICO: 100.00%

AVANCE EN ESTIMACION:

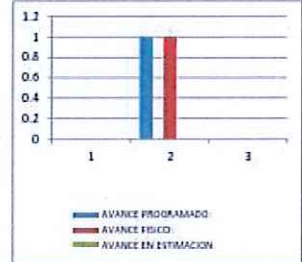

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

SE TERMINO CON LA PINTURA

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE FINIQUITO



CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID Ad
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	3,623.34	1.36%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	100.00	0.50%	M3
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO C	700.00	3.73%	M3
BANDEO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES	630.00	0.53%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL	1,296.00	11.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION	1,296.00	2.56%	M3
CAPTADORES	4.00	3.53%	PZA
PERFORACION	4.00	2.93%	ML
CONSTRUCCION DE GUARNICION 15X15X40	1314.00	8.10%	ML
RENVELACIONES DE REGISTROS	7.00	0.21%	PZA
RIEGO DE IMPREGNACION	5342.00	6.00%	M2
SUMINISTRO DE ASFALTO	5342.00	55.00%	M2
PINTURA TERMOPLASTICA PARA LINEAS DISCONTINUAS	400.00	0.30%	ML
PINTURA TERMOPLASTICA PARA LINEAS CONTINUAS	1408.00	2.31%	ML
PINTURA TERMOPLASTICA PARA PASOS PEATONALES	1236.00	2.02%	ML

[Handwritten signature]




H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SIYOP-FORTAMUN-005 - 2022
 OBRA: Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad
 FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2022
 FECHA TERMINO: 30 DE AGOSTO DE 2022
 MONTO DE CONTRATO: \$ 1,796,371.88 IVA INCLUIDO
 LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: CONSTRUCCIONES BAUPIS S. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
 AVANCE FISICO: 100.00%
 AVANCE EN ESTIMACION: 97.27%

CONVENIO: MODIFICATORIO: CB-HAS-SIYOP-FORTAMUN-005-2021
 FECHA DE INICIO:
 FECHA DE TERMINO:
 MONTO DE CONVENIO: IVA INCLUIDO

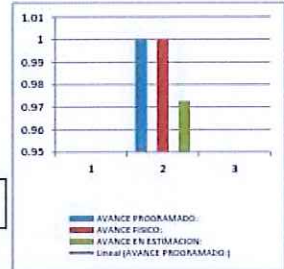


ETAPA DE LA OBRA
CANCHA DE FUTBOL Y DOMO DE BOX
OBSERVACIONES:

FOTOGRAFIAS

SE TERMINARON LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN LA UNIDAD DEPORTIVA, LOS CUALES CONSISTIERON EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS: A.- PREEJMINARES, B.- MALLA CICLONICA Y PORTERIAS, C.- PISO DE CANCHA DE FUTBOL, D.- ALBAÑILERIA PORTERIAS DE CANCHA, E.- GIMNASIO DE BOX, F.- ADECUACION DESCARGA PLUVIAL Y REGISTRO, G.- INSTALACION ELECTRICA. SOLAMENTE FALTA CERRAR DOCUMENTALMENTE.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO			
A.- PREEJMINARES		100%	
B.- MALLA CICLONICA Y PORTERIAS		100%	
C.- PISO DE CANCHA DE FUTBOL		100%	
D.- ALBAÑILERIA PORTERIAS DE CANCHA		100%	
E.- GIMNASIO DE BOX		100%	
F.- ADECUACION DESCARGA PLUVIAL Y REGISTRO		100%	
G.- INSTALACION ELECTRICA		100%	



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 Y OBRAS PÚBLICAS
 PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024



OBRA: **REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEP. BUENERA MAYA**

FECHA INICIO: **1 de Junio de 2022**
FECHA TERMINO: **28 de agosto de 2022**
DURACION DE LA OBRA: **90 DIAS**
LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD**
MUNICIPIO: **SOLIDARIDAD Q. ROO**
EMPRESA: **RAUL ARIEL HERNANDEZ CERBALLOS**

FECHA DE REPORTE: **28 de septiembre de 2022**
AVANCE PROGRAMADO: **100.00**
AVANCE FISICO: **100.00**
CONTRATO HAS-SlyOP-FORTAMUN-009-2022
FECHA INICIO CM: **22-06-2022**
FECHA TERMINO CM: **19-09-2023**
PLAZO 90 DIAS
MONTO DE CONTRATO: **\$ 1,582,799.82**

REPORTE DE OBRA AL 28 SEPTIEMBRE 2022

ETAPA DE LA OBRA	REPORTE DE SUPERVISION
se terminaron pruebas de encendido de luminarias, colocaron boyas, se instalaron las 2 terras fisicas y se monto gabinete.	



	CANT	UNID	%	%
PRELIMINARES	7			
demolicion de alumbracion	30	ML	2	2
retiro de malla ciclónica	310	M2	5	5
BANQUETAS Y GUAR	25			
excavaciones	30.45	M3	4	4
constr. base recta baja curva	82	ML	2	2
constr. rodapie	80	ML	0.5	0.5
sumido de banco	20.25	M3	3.5	3.5
colado de banquetas	225	M2	15	15
TACHONES	20			
muro de block	60	M2	4	4
memposteria cadenas	12.3	M3	10	10
castillos	18.9	ML	2	2
sum y coloc. reja acero	82	ML	10	10
señalización #14rura			0.5	0.5
ALUMBRADO	17	30		
trazo yubic de postes	188	ML	1	1
excavo para tubo pad	120	ML	7	7
teñido tub pad 2"	190	m3	3	3
base para poste piramidal	17	P2	7	7
montaje postes y lamparas	17	P2	14	14
montaje de registros	19	P2	2	2
teñido de cable	420	ML	4	4
coloc. tierras	2	P2	0.5	0.5
TERRAJERIAS	51.2	m3	0	0
PAVIMENTOS	270.97	m2	0	0
doc malla ciclon	1	2	2	2
rep. n de andadores	1	1	1	1
			100	100



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: HAS-SyOP-FORTAMUN-014-2022

OBRA: "REPAVIMENTACION DE LA AV. 79 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL"

MONTO DE \$1,918,026.35 IVA INCLUIDO
CONTRATO:
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: CONSTRUCTORA INMUSUR, S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 de septiembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
AVANCE FISICO: 100.00%
AVANCE EN ESTIMACION: 100.00%
FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO 2022
FECHA DE TERMINACION: 31 DE JULIO 2022

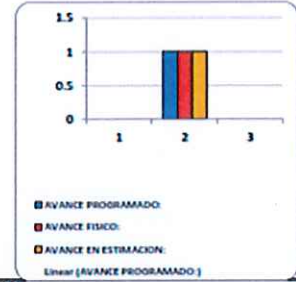

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD.

OBSERVACIONES:

OBRA CONCLUIDO AL 100 %.



CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION	1,504.80	100.00%	M2
DESPALME DE MATERIAL VEGETAL	601.92	100.00%	M2
RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	156.50	100.00%	M3
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	250.27	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL	307.13	100.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	307.13	100.00%	M3
PERFORACION DE POZO DE ABSORCION	60.00	100.00%	ML
RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUA	4.00	100.00%	PZA
SUMINISTRO Y TENDIDO DE MATERIAL DE BANCO PARA RECIBIR BANQUETA	93.14	100.00%	M3
RENIVELACION DE REGISTROS DE AGUA	4.00	100.00%	PZA
CONSTRUCCION DE GUARNICION CURVA	18.00	100.00%	ML
CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA	272.00	100.00%	ML
CONSTRUCCION DE GUARNICION BAJA	40.60	100.00%	ML
CONSTRUCCION DE CAPTADOR PLUVIAL	2.00	100.00%	PZA
RIEGOL DE IMPREGNACION	1,137.00	100.00%	M2
CARPETA ASFALTICA	1,137.00	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	71.13	100.00%	M3
BANQUETAS DE CONCRETO PREMEZCLADO	307.20	100.00%	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALÉTICA	3.00	100.00%	PZA
PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA PASO	90.00	100.00%	ML
PINTURA TERMOPLASTICA AMARILLA	213.00	100.00%	ML
CONSTRUCCION DE BASES PARA POSTES	4.00	100.00%	PZA
CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS	5.00	100.00%	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES	4.00	100.00%	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	4.00	100.00%	PZA



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: **HAS-SyOP-RF-017-2022**
OBRA: **"Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad"**

FECHA INICIO: **13 DE JUNIO DE 2022**
FECHA TERMINO: **10 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
MONTO DE CONTRATO: **\$ 2,408,354.39 IVA INCLUIDO**
LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**
EMPRESA: **ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V.**

FECHA DE REPORTE: **18 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
AVANCE PROGRAMADO: **100.00%**
AVANCE FISICO: **100.00%**
AVANCE EN ESTIMACION: **48.52%**

CONVENIO MODIFICATORIO: **FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO: MONTO DE CONVENIO: IVA INCLUIDO**



ETAPA DE LA OBRA
PRELIMINARES, MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS
OBSERVACIONES:

SE OBSERVAN AVANCES EN EL PARADERO DE LA CTM ENTRE AVENIDA 115 NORTE Y AVENIDA CHEMUYL. SE TRABAJA EN LA LIMPIEZA DEL AREA DE CADA PARADERO Y EN LA COLOCACION DEL BAJAREQUE. SE LE NOTIFICÓ A LA CONTRATISTA EL TEMA DOCUMENTAL Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS GUARNICIONES. EN LOS OTROS DOMOS NO HAY PERSONAL AVANZANDO.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
REHABILITACION DE PARADEROS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD			
A.1 PARADERO AVENIDA COLOSO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA 115 NORTE			
A.1.1 PRELIMINARES		100%	
A.1.2 ESTRUCTURA METALICA		100%	
A.1.3 ILUMINACION		100%	
A.2 PARADERO AVENIDA 20 DE JULIO ENTRE CALLE TULUM Y CALLE COBA			
A.2.1 ESTRUCTURA METALICA		100%	
A.2.2 ILUMINACION		100%	
A.3 PARADERO AVENIDA CTM ENTRE AV. 115 NORTE Y AV. CHEMUYL			
A.3.1 PRELIMINARES		100%	
A.3.2 ESTRUCTURA METALICA		100%	
A.3.3 ILUMINACION		100%	

FOTOGRAFÍAS



PARADERO AVENIDA LUIS DONALDO COLOSO ENTRE AV. MISION DEL CARMEN Y 115 NORTE



PARADERO AVENIDA 20 DE JULIO ENTRE CALLE TULUM Y CALLE COBA



PARADERO AVENIDA CTM ENTRE AV. CHEMUYL Y AVENIDA 115 NORTE



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Obras en Proceso:

No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FISICO
				INICIO	TERMINO	
1	RECURSO FISCAL	"ELABORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES ESTATALES Y/O FEDERALES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SIyOP-RF-001-022	13-abr-22	30-nov-22	74.37%
2	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA."	HAS-SIyOP-FORTAMUN-007-2022	26-may-22	19-oct-22	66.00%
3	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA."	HAS-SIyOP-FORTAMUN-008-2022	26-may-22	17-oct-22	38.00%
4	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SIyOP-FORTAMUN-010-2022	01-jun-22	09-oct-22	90.00%
5	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SIyOP-FORTAMUN-011-2022	01-jun-22	31-oct-22	85.00%
6	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAURA RIOJAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO."	HAS-SIyOP-FORTAMUN-012-2022	02-jun-22	15-nov-22	60.00%
7	RECURSO FISCAL	"REPARACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSOS PUNTOS DE PLAYA DEL CARMEN."	HAS-SIyOP-RF-015-2022	03-jun-22	30-oct-22	98.00%
8	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE CREMATARIO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SIyOP-RF-016-2022	13-jun-22	30-sep-22	95.00%
9	RECURSO FISCAL	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA CIVICA	HAS-SIyOP-RF-018-2022	08-jul-22	05-oct-22	78.00%
10	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SIyOP-FORTAMUN-019-2022	14-jun-22	11-oct-22	52.00%
11	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SIyOP-FORTAMUN-020-2022	29-jul-22	26-oct-22	59.00%
12	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-021-2022	04-jul-22	31-oct-22	42.00%
13	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM ENTRE AV. 115 A CARRETERA FEDERAL, Y AV. 115 ENTRE CALLE COBA A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-022-2022	05-jul-22	01-nov-22	75.00%
14	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. COLOSIO.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-023-2022	05-jul-22	15-dic-22	67%
15	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, SEGUNDA ETAPA.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-024-2022	03-08-22	30-nov-22	37%





No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FISICO
				INICIO	TERMINO	
16	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIRIOS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CAOBA.	HAS-SlyOP-FORTAMUN-025-2022	18-jul-22	15-sept-22	60.00%
17	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FORTAMUN-026-2022	18-jul-22	14-nov-22	60.00%
18	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. SUR	HAS-SlyOP-FORTAMUN-027-2022	25-jul-22	21-dic-22	12.00%
19	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SÚPER MANZANA 075 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FORTAMUN-030-2022	08-agost-22	26-nov-22	36.00%
20	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LOROS ENTRE AV. CTM Y AV. LUIS D. COLOSIO, FRACC. VILLAS DEL SOL.	HAS-SlyOP-FORTAMUN-031-2022	08-agost-22	05-nov-22	45.00%
21	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS.	HAS-SlyOP-RF-032-2022	29-agost-22	27-oct-22	30.00%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Evidencia de obras en proceso:




OBRA: ELABORACION, GESTION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES ESTATALES Y/O FEDERALES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL, DEL H AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
CONTRATO: HAS-SIyOP-RF-001-2022
FECHA INICIO: 13 de abril de 2022
FECHA TERMINO: 30 de noviembre de 2022
DURACION DE LA OBRA: 232 DIAS
LOCALIDAD: PUERTO AVENTURAS, PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: RIOL GABRIEL ROBLES MEDINA

28/09/2022
AVANCE REAL 79.29%
PROGRAMA A LA FECHA 74.37%

FECHA INICIO CM: 18-05-2022
FECHA TERMINO CM: 04-01-2023
PLAZO: 232 DIAS

REPORTE DE SUPERVISION DE 28-09-2022					OBSERVACIONES: EXPEDIENTES EN PROCESO
ETAPA DE LA OBRA	UNID	CANT	%	AVANCE	
REV DOCUMENTAL Y FICHAS DE OBRA	SERV	25	12	25	12
ARMADO DE PLANOS SIST INFO GEOGRAFICA	SERV	25	8.8	25	8.3
ANALISIS DE PLANOS SIST INFO GEOGRAFICA	SERV	25	8.7	25	8.7
ANALISIS TECNICO JURIDICO DE PROYECTOS	SERV	25	13.5	25	13.5
VINCULACION LEGAL CON NORMATIVA APLICABLE	SERV	25	10.66	25	10.66
ARMADO DE EXPEDIENTES PARA INGRESO A SEMA	SERV	25	7.5	25	7.5
INGRESO DE EXPEDIENTES ANTE AUTORIDAD AMBIENTAL	SERV	25	7.5	25	7.5
SEGUIMIENTO VISTAS TECNICAS POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	SERV	25	5.83	25	5.83
BOLICITUD DE STATUS DE PROYECTO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL	SERV	25	5.3	25	5.3
RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS DE INFORMACION COMPLEMENTARIA POR PARTE DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL	SERV	25	5.71	25	5.71
EN MATERIA E IMPACTO AMBIENTAL(MIA Y/O INFORME PREVENTIVO	BERV	1	5		
PAGO DERECHOS PROYECTO(MIA)	SERV	1	0.8		
PAGO DERECHOS RESIDUALES ESTATALES PARA PROYECTOS	SERV	25	9.2		
		(17-05)	(17-07)	(17-08)	(18-09)
AVANCE PROGRAMADO		16.35	18.96	20.76	17.63
AVANCE PROGRAMADO . ACUM		10.35	29.31	50.07	67.29
AVANCE REAL		27	35.44	52.44	77.57
HASTA BOLICITUD DE STATUS DE PROYECTO A LA AUTORIDAD AMBIENTAL					

se elabora convenio por exenciones y modificacion de voluemen. Las 25 obras contratadas ya se ejecutaron, se modificara la MIA

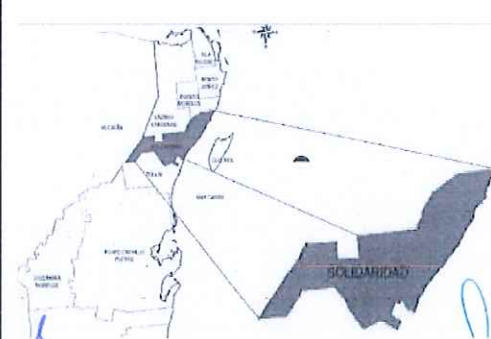


H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: **MAS-SIOP-FORTAMUN-010-2022**

OBRA: **REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD**

FECHA INICIO: 01 de Junio de 2022
FECHA TERMINO: 29 de agosto de 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ **4,053,391.50**


LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**
EMPRESA: **GRUPO MAS RENOVAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

FECHA DE REPORTE: 29 de septiembre de 2022


AVANCE PROGRAMADO: 100%
AVANCE FISICO: 88%
AVANCE EN ESTIMACION: 80%

CONVENIO: **CM-HAS-SIOP-FORTAMUN-010-2022**

FECHA INICIO: 20 DE JUNIO 2022
FECHA DE TERMINACION: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022

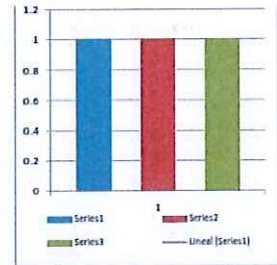

ETAPA DE LA OBRA
ACABADOS
OBSERVACIONES:

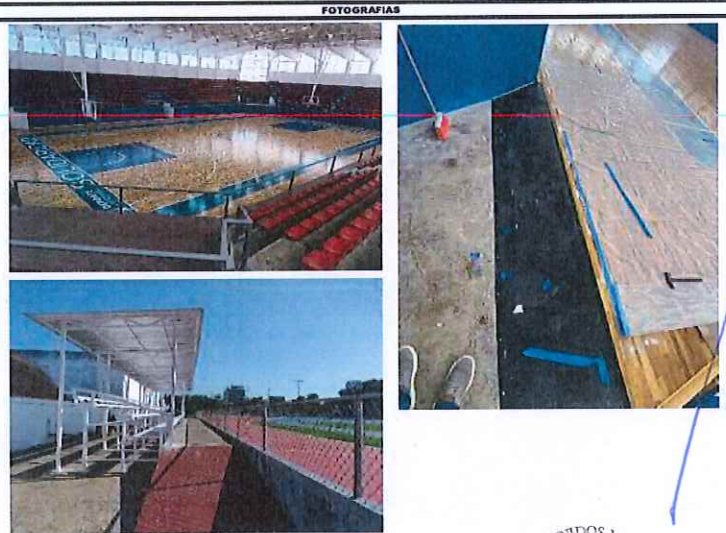

SOLO QUEDA PEDIENTE LA COLOCACION DE LOS TABLEROS Y LOS SEGUNDEROS QUE SEGUN EL CONTRATISTA LLEGAN LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
PRELIMINARES		100%	
RAMPA DE ACCESO		100%	
COMPLEMENTARIOS EN CUBIERTA		100%	
CANCHA DE USOS MULTIPLES		100%	
GRADAS Y CUBIERTA PISTA DE PATINAJE		100%	
LUMINARIAS CANCHA		100%	
MARCADORES Y SEGUNDEROS		20%	
PINTURA		80%	
IMPERMEABILIZACION AZOTEA		100%	



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SI-OP-FORTAMUN-012-2022

OBRA: Rehabilitación del Mercado municipal Diana Laura Rojas en la colonia Luis Donaldo Colosía

FECHA INICIO: 02 de junio de 2022

FECHA TERMINO: 29 de Septiembre de 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 2,995,712.81

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE RL. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 28 de septiembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 95%


AVANCE FISICO: 60%

AVANCE EN ESTIMACION: 25%

FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO 2022

FECHA DE TERMINO: 17 DE OCTUBRE DE 2022

MONTO DE CONVENIO: \$2,995,712.81



ETAPA DE LA OBRA


OBSERVACIONES:

SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLADO DE LAS DOS LOSAS UBICADAS EN EL AREA DE ESCALERA Y EN LA FACHADA PRINCIPAL.

PARTIDAS	ALCANCES		UNIDAD
	CANTIDAD	EJECUTADO	
PRELIMINARES			
COLOCACION D PROTECCION DE REJERA PARA TOMA DE AGUA	1	100%	PZA
DESAMANTELMIENTO DE TANQUES DE GAS ESTACIONARIO	1.8	100%	PZA
DESAMANTELMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE	240	100%	ML
DEMOLICION DE BASES	60	100%	PZA
PREPARACION DE FIGURAD EN MURD	100	100%	ML
SANITARIO CABALLEROS			
DESAMANTELMIENTO DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
DESAMANTELMIENTO DE WC	2.00	100%	PZA
COLOCACION DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
RECUBRIMIENTO PARA MESETA	0.50	100%	M2
COLOCACION DE PISO	10.50	100%	M2
SANITARIO DAMAS			
DESAMANTELMIENTO DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
DESAMANTELMIENTO DE WC	3.00	100%	PZA
COLOCACION DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
COLOCACION DE WC	3.00	100%	PZA
COLOCACION DE PISO	10.50	100%	M2
RECUBRIMIENTO PARA MESETA	0.50	100%	M2
COLOCACION DE COCINA	1.00	100%	PZA
HABILITACION DE LOCALES PLANTA ALTA			
PREPARACION DE PANQUEAS EN TIENE	343.04	100%	ML
INTERMEDIABILIZACION			
RETIRO DE INTERMEDIABILIZANTE	2707.18	100%	M2
INTERMEDIABILIZACION DE AZOTEA	2707.18	60%	M2



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

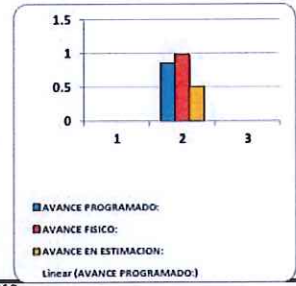

CONTRATO: HAS-SIVOP-RF-015-2022

OBRA:

"REPARACION DE VIALIDADES EN DIVERSOS PUNTOS DE PLAYA DEL CARMEN"

FECHA DE REPORTE: 29 de septiembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 85.00%

AVANCE FISICO: 88.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 51.0%

FEHA DE INICIO **03 DE JUNIO 2022**

FECHA DE TERMINACION: **30 DE OCTUBRE 2022**

MONTO DE \$6,766,012.82 IVA INCLUIDO

CONTRATO: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA RIVAL, S.A. DE C.V.

ETAPA DE LA OBRA
EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

FOTOGRAFIAS

OBSERVACIONES:
SE ESTA TRABAJANDO EN EL CRUCERO DE LA 115 AVENIDA NORTE CON AVENIDA PASEO CENTRAL Y EL CRUCERO DE LA AV. XPUHA Y AVENIDA PASEO CENTRAL, ASI COMO EL CRUCER DE LA AV. 125 CON PASEO CENTRAL Y EL CRUCERO DE LA AV. LIS CON AV. CONSTITUYENTES.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
DEMOLICION DE PAVIMENTO	1,089.77	100.00%	M3
TRAZO Y NIVELACION	7,629.53	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	545.18	100.00%	M3
AFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE	7,629.53	100.00%	M2
SUMINISTRO DE MATERIAL	1,330.87	100.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	1,330.87	100.00%	M3
RIEGO DE LIGA	7,629.53	87.00%	M2
CARPETA AFALTICA	7,629.53	87.00%	M2
CONSTRUCCION DE GUARNICION CURVA	31.34	86.00%	ML
CONSTRUCCION DE GUARNICION RECTA	150.67	86.00%	ML
RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIAL DESECHO	16.00	100.00%	M3
DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE Y GUARNICION	16.00	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RECIBIR BANQUETA	53.88	100.00%	M3
BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO	250.00	100.00%	M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO AMARILLA PARA GUARNICIONES	552.30	100.00%	ML
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICOPARA LINEA DE PARADA BLANCA	66.50	100.00%	M2
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TRAFICO PASOS PEATONALES	157.00	100.00%	ML



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SI/OP-RF-016-2022

OBRA:

"Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad".

FECHA DE REPORTE: 28 de septiembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 95.00%

AVANCE FÍSICO: 100.00%

FECHA INICIO: 13 DE JUNIO DEL 2022

FECHA TÉRMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MONTO DE CONTRATO: \$4,470,133.34

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

EMPRESA: INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA S.A DE C.V

REPROGRAMACION

CONVENIO: HAS-SI/OP-RF-016-2022

FECHA INICIO: 13 DE JUNIO DEL 2022


FECHA TÉRMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: HAS-SI/OP-RF-016-2022

FECHA INICIO: 13 DE JUNIO DEL 2022

FECHA TÉRMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

NO INCLUIDO



ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFÍAS
ACABADOS Y EQUIPAMIENTO	
OBSERVACIONES:	

SE COLOCA LOSETA CERAMICA , SE INICIA INSTALACION DE HORNO CREMATARIO Y PINTURA EN FACHADA.

ALCANCES			
CONCEPTOS	CLAVE	CANTIDAD	% AVANCE
PRELIMINARES	A	0.95%	0.95%
CIMENTACION	B	5.31%	5.31%
ESTRUCTURA	C	17.12%	17.12%
ALBAÑERIA Y ACABADOS	D	12.50%	11.00%
CANCLERIA Y HERRERIA	E	1.42%	0.00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	F	0.51%	0.51%
INSTALACIONES ELECTRICAS	G	7.56%	7.56%
JARDINERIA	H	0.8%	0.00%
OBRA EXTERIOR	I	38.74%	39.00%
AREA PREPARACION DE CUERPOS	J	0.58%	0.58%
AREA SALA VELACION	K	0.72%	0.72%
EXTRAORDINARIOS	L	13.83%	12.80%
TOTAL		100%	95%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




CONTRATO: HAS-SIOP-RF-018-2022
OBRA: REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA CIVICA

FECHA DE REPORTE: SEPTIEMBRE/20/2022
AVANCE PROGRAMADO: 90%
AVANCE FISICO: 75%
AVANCE EN ESTIMACION: 25%

FECHA INICIO: 08 DE JULIO DE 2022
FECHA TERMINO: 05 DE OCTUBRE DE 2022
MONTO DE CONTRATO: \$ 1,999,927.09

CONVENIO:
FECHA INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO
EMPRESA: DECO ELECTROMECANICA DEL CARMEN, S.A. DE C.V.



ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
COLOCACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y PINTURA	
OBSERVACIONES:	

LOS INODOROS LLEGAN LA PRIMER SEMANA DE OCTUBRE Y FALTAN 8 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO POR COLOCAR ASI COMO LA COLOCACION DE PROTECCION DEL PISO EN AREAS DE CELDAS

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
OBRA ELECTRICA MEDIA Y BAJA TENSION		90%	
PRELIMINARES		100%	
ALBANILERIA		95%	
ACABADOS		85%	
AIRE ACONDICIONADO		75%	
INSTALACION HIDROSANITARIA		60%	
ACABADO EN PISO DE CELDAS		10%	



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SI-OP-FORTAMUN-019-2022

OBRA: Rehabilitación de parques para actividades de recreación y esparcimiento en el Municipio de Solidaridad

FECHA INICIO: 14 de Junio de 2022

FECHA TERMINO: 11 de Octubre de 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 7,488,132.64

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 15 de Septiembre de 2023
 AVANCE PROGRAMADO: **81%**
 AVANCE FÍSICO: **52%**
 AVANCE EN ESTIMACIÓN: **25%**
 FECHA DE INICIO:
 FECHA DE TERMINO:
 MONTO DE CONVENIO:



ETAPA DE LA OBRA			
SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS PARA PORTERÍAS EN EL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PARA APLICACIÓN DE FUTIBOL EN EL PARQUE JUVENTUD			
PARTIDAS	ALCANCES	CANTIDAD	EJECUTADO
PARQUE MCTE HA			
RETIRO DE GRASO EN PALAPA		25	100%
REHABILITACIÓN DE PALAPA		1	100%
REHABILITACIÓN DE MERNAS Y BANCAOS		2	100%
APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA DE FUTIBOL		200.40	100%
RETIRO DE ANCIENOS		4	100%
RETIRO DE TUBERÍA EN DREJ COLECTOR		30	100%
RETIRO DE GRASA EXISTENTE EN DREJ COLECTOR		0.01	100%
DESARMAJE DE POSTO DE AEROSOLIZACIÓN		1	100%
PERFORACIÓN DE POSTO DE AEROSOLIZACIÓN		1	50%
COLOCACIÓN REDONDO		1	100%
COLOCACIÓN DE LAVAND		1	100%
COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA		1	100%
COLOCACIÓN DE FOCO LED		7	100%
COLOCACIÓN DE CONTRAFORT		4	100%
PARQUE EL PETEN			
RETIRO DE PASTO EXISTENTE EN CANCHA DE FUTIBOL		5.00	100%
RETIRO DE ESTRUCTURA METÁLICA CON MALLA CICLÓNICA		34.40	100%
DEMOLICIÓN DE GUARDACCIÓN		37.50	100%
COBRE EN PISO DE CONCRETO		40.50	100%
INDICACIONES MATERIALES		4.30	100%
PLANTAS DE CONCRETO		30.50	100%
CARRERA DE DESPLANTE		40.50	100%
CARRILES DE CONCRETO		10.40	100%
LAVIO DE BLOQUE		26.24	100%
PARQUE GUADALUPANA CALLE JUVENTUD			
RETIRO DE FALDON EXISTENTE		65.00	100%
RETIRO DE CAJON EXISTENTE		65.00	100%
RETIRO DE PASTO SINTETICO EXISTENTE		616.20	100%
RETIRO DE MALLA CICLÓNICA		112.40	100%
ÚTILIDAD DE FUSTES DE ALUMBRADO		5.00	100%
COLOCACIÓN DE FALDON		25.00	100%
ÚTILIDAD EN PISO DE CANCHA		641.30	100%
PARQUE GUADALUPANA ECOLOGICO			
RETIRO DE MALLA CICLÓNICA		340.00	100%
RETIRO DE PASTO SINTETICO		1167.48	100%
RETIRO DE PASTORALERA EN BARRANDA		28.00	100%
DESARMAJE DE MALLA CICLÓNICA		242.75	100%
COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA		242.35	100%
PARQUE LÁZARO CÁRDENAS			
DESARMAJE DE MALLA CICLÓNICA		174.00	100%
RETIRO DE FALDON LATERAL		37.00	100%
COLOCACIÓN DE FALDON		74.00	100%
COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA PORTERÍAS		2.00	60%
COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA EN CANCHA DE FUTIBOL		372.85	100%




H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SIOP-FORTAMUN-020-2022
 OBRA: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD"
 FECHA INICIO: 1 de Mayo de 2022
 FECHA TERMINO: 1 de octubre de 2022
 MONTO DE CONTRATO: \$ 4,175,172.14 IVA INCLUIDO
 LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: BASE CUATRO, S.A DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 28 de septiembre de 2022
 AVANCE PROGRAMADO: 83.00%
 AVANCE FISICO: 87.00%
 AVANCE EN ESTIMACION: 0.00%
 CONVENIO POR DIFERIMIENTO DE ANTICIPO
 FECHA INICIO: 28 de mayo de 2022
 FECHA TERMINO: 24 de octubre de 2022



ETAPA DE LA OBRA

PRELIMINARES, OBRA CIVIL

OBSERVACIONES:

SE INICIAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE LUMINARIA, COLOCACION DE POSTES Y BRAZOS, CABLEADO DE LOS POSTES HASTA EL REGISTRO, RELLENO DE LAS BASES Y REGISTROS DEL ALUMBRADO. SE TIENE LA CANALIZACION DE LAS LUMINARIAS, FALTA QUE SE REALICE LA RUPTURA DE LOS CRUCES ENTRE CALLES

FOTOGRAFIAS



CONCEPTOS	CANTIDAD	%
A "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD"	\$ 3,599,286.33	65.0%
A.1 PRELIMINARES	\$ 828,089.13	20.0%
A.2 OBRA CIVIL	\$ 628,978.07	15.0%
A.3 OBRA ELECTRICA	\$ 1,962,368.97	30.0%
A.4 SUBESTACION	\$ 179,850.10	0.0%
	\$ 3,599,286.33	
IVA 16%	\$ 575,885.81	
TOTAL	\$ 4,175,172.14	65.0%

Handwritten signature in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




CONTRATO: HAS-SyOP-FORTAMUN-021-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

AVANCE PROGRAMADO: 40.00%
AVANCE FISICO: 42.00%
AVANCE EN ESTIMACION:

29 de noviembre de 2022

MONTO DE CONTRATO: \$6,481,826.03 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: INTERMAYA DEL CARIBE, S.A DE C.V.

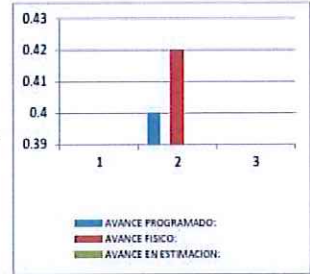


ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE COLADO DE BANQUETAS.

OBSERVACIONES:

ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA COLADO DE GUARNICIONES, ALTA BAJA, Y COLADO DE BANQUETAS.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO	1,842.18	0.42%	M2
GUARNICION RECTA 15X20X30 CM	707.80	3.24%	ML
SUMINISTRO DE MATERIAL	424.07	5.48%	M3
BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO	1,356.00	22.00%	M2
GUARNICION BAJA 15X20X10 CM	16.40	0.05%	ML
CONSTRUCCION DE RODAPIE	749.80	5.00%	ML
CORTE DE MATERIAL C	92.98	6.00%	M3

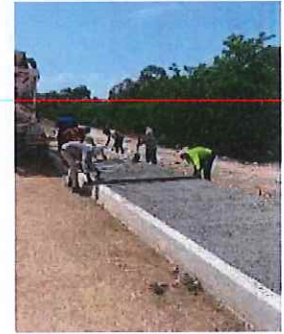

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: MAS-SINOP-FORTAMUN-022-2023

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM ENTRE AV. 115
A CARRETERA FEDERAL Y AV. 115 ENTRE CALLES COBA A AV. SUR DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

MONTO DE CONTRATO: \$7,156,550.00 IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO


EMPRESA: MOMENTO INGENIERIA SA DE CV

FECHA DE REPORTE: 29 de septiembre de 2023

AVANCE PROGRAMADO: 80.00%

AVANCE FISICO: 75.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 66.0%

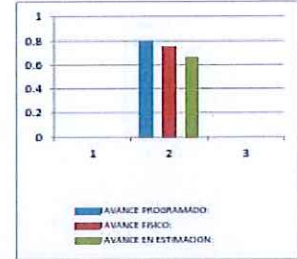

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

LA OBRA SE ENCUENTRA EN BANQUETAS Y GUARNICIONES.

OBSERVACIONES:

ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN HACIENDO TRABAJOS DE TERRACERIAS Y CICLOVIA EN LA 115



CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	7,780.00	75.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	121.00	100.00%	M3
CORTE DE MATERIAL TIPO C	13.44	45.00%	M3
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO	1,251.00	100.00%	M3
BANQUETA DE CONCRETO	6,258.00	68.00%	M2
RODAPIE 20 CM	1,822.00	50.00%	ML
RAMPA	96.00	21.00%	M2
GUARNICION	2,316.00	56.4%	ML
CICLOVIA	2,946.64	64.0%	M2



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SyOP-FORTAMUN-021-2022

FECHA DE REPORTE: 28 de septiembre de 2022


OBRA: PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. DIAG. 65 ENTRE CTM Y AV. COLOSIO

AVANCE PROGRAMADO: 47.50%
AVANCE FISICO: 52.00%

FECHA INICIO: 2 de julio de 2022

FECHA TERMINO: 31 de diciembre de 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 29,989,558.18 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: MAHARRA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A DE C.V.



ETAPA DE LA OBRA

PRELIMINARES

OBSERVACIONES:

SE REALIZA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE LAS CAJAS DE LOS POZOS DE ABSORCION, SE REALIZA LA EXCAVACION PARA LA MEDIA TENCION. SE REALIZA LA COLOCACION DE LA TUBERIA PVD DE 3", AL IGUAL SE ESTA REALIZANDO LA EXCAVACION PARA LOS REGISTROS DE MEDIA TENCION. SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA PARA LAS CAJAS DE POZOS DE ABSORCION. SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO POR PARTE DE AGUKAN. SE HAN REALIZADO LAS ZANJAS DE CRUCE ENTRE CARRILES. Y SE ESTA PROGRAMANDO EL CORTE POR LA VALIDAD.

FOTOGRAFIAS



CONCEPTOS	CANTIDAD	%
I PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AV. DIAG. 65 ENTRE CTM Y AV. COLOSIO	\$ 25,853,097.40	89.0%
I PAVIMENTACION	\$ 19,437,135.22	45.0%
II POZOS DE ABSORCION	\$ 555,282.48	6.0%
III GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLON	\$ 3,415,822.41	0.0%
IV AREA VERDE	\$ 126,026.73	0.0%
V ALUMBRADO	\$ 2,318,800.56	8.0%
	\$ 25,853,097.40	
	IVA 16%	\$ 4,136,490.78
	TOTAL	\$ 29,989,558.18 89.0%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO: *SyOP-FORTAMUN-024-2022*

OBRA: **"CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA".**

FECHA DE REPORTE: 28 de septiembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: **60.00%**
AVANCE FÍSICO: **37.00%**

FECHA INICIO: 19 DE JULIO DEL 2022
FECHA TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022

REPROGRAMACION

CONVENIO: **HAB-SyOP-FORTAMUN-024-2022**

FECHA INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: **HAB-SyOP-FORTAMUN-024-2022**


FECHA INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MONTO DE CONTRATO: \$1,840,373.99

IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

EMPRESA: **MARO WOOD STUDIO S.A DE C.V.**

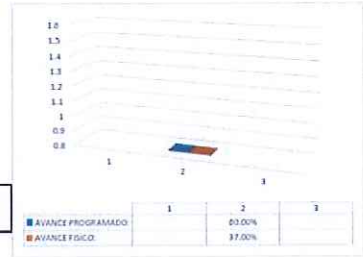

ETAPA DE LA OBRA

FOTOGRAFÍAS

PASO PEATONAL Y PRELIMINARES
OBSERVACIONES:

SE CONCLUYEN 3 PASOS PEATONALES Y SE AVANZA LA SEGUNDA MITAD DEL 4TO PASO PEATONAL, IGUAL SE TRAZAN DOS PASOS PEATONALES PARA SU PROXIMA CONSTRUCCION.



ALCANCES			
CONCEPTOS	CLAVE	CANTIDAD	% AVANCE
PRELIMINARES	A	6.00%	3.70%
PASO PEATONAL	B	87.00%	33.00%
SEÑALIZACION	C	7.00%	0.00%
TOTAL		100%	37%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SIOP-FORTAMUN-025-2022

OBRA: PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LIRIOS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CAOBA

FECHA DE REPORTE: 29 SEPTIEMBRE DE 2022

AVANCE PROGRAMADO: 100%

AVANCE FISICO: 55%

AVANCE EN ESTIMACION: 30%

FECHA INICIO: 18 DE JULIO DE 2022

FECHA TERMINO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,397,028.22


LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: JOSE FRANCISCO HERRERA Y PECH

CONVENIO:

FECHA INICIO:

FECHA DE TERMINACION:



ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
ELABORACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	
OBSERVACIONES:	



HOY SE INICIO LA COLOCACION DE GUARNICIONES, FALTA LA ELABORACION DEL POZO SE INICIA MAÑANA Y EL ASFALTO SE COLOCA EL SABADO

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION		100%	M2
DESMONTE DE TERRENO		100%	M2
DESPALME DE TERRENO		100%	M2
CORTE EN MATERIAL TIPO B		100%	M3
CORTE EN MATERIAL TIPO C		100%	M3
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO		100%	M3
FORMACION DE TERRACERIAS		100%	M3
RIEGO DE IMPREGNACION		100%	M2
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CM ESP.			M2
ELABORACION DE POZOS DE ABSORCION			PZA
GUARNICIONES Y BANQUETAS		10%	ML



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SI/OP-FORTAMUN-026-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

MONTO DE CONTRATO: \$9 808 108.20 IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: BASE CUATRO, S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 22 de septiembre de 2022


AVANCE PROGRAMADO: 00.00%

AVANCE FISICO: 00.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 0.0%

FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO 2022

FECHA DE TERMINACION: 14 DE NOVIEMBRE 2022



■ AVANCE PROGRAMADO:
■ AVANCE FISICO:
■ AVANCE EN ESTIMACION:
Linear (AVANCE PROGRAMADO)

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

REALIZAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y TRABAJOS DE TERRACERIAS EN LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION	6,227.00	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	747.00	100.00%	M3
CORTE DE MATERIAL TIPO C	297.00	100.00%	M3
AFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACIONES	6,000.00	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL	1,138.00	100.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	1,138.00	100.00%	M3
GUARNICIONES DE GUARNICION RECTA 15X20X30 CM	538.00	50.00%	ML
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO PARA BANQUETA	258.06	50.00%	M3
DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES DE CONCRETO.	67.95	100.00%	M2
BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO	3,095.00	50.00%	M2



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: HAS-SIOP-FORTAMUN-017-2022

OBRA:

PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. SUR.

AVANCE PROGRAMADO:

15.00%

AVANCE FISICO:

12.00%

AVANCE EN ESTIMACION:

29 de septiembre de 2022

MONTO DE


\$22,026,364.87

IVA INCLUIDO

CONTRATO:

PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

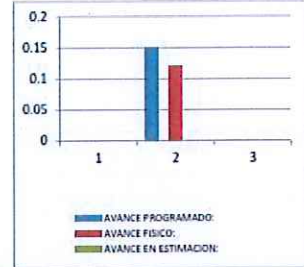

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA ETAPA DE PRELIMINARES.

OBSERVACIONES:

LA EMPRESA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE DESPALME Y RETIRO DE MATERIAL.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO	6,720.00	0.36%	M2
DESPALME EN TERRENO URBANO	2,048.00	0.76%	ML
DESMONTE	6,400.00	8.10%	M2
CORTE B	500.00	1.00%	M3
CORTE C	400.00	2.00%	M3



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: HAS-SiyOP-FORTAMUN-030-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SUPER MANZANA 075 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

MONTO DE CONTRATO: 4'178,871.28 IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.


EMPRESA: CONSTRUCCIONES BAUPI SA DE CV

FECHA DE REPORTE: 23 de septiembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 25.00%

AVANCE FISICO: 36.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 0.0%

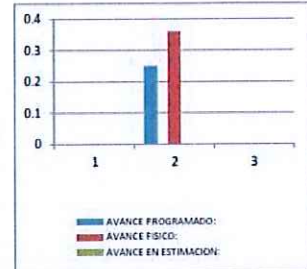

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRELIMINARES

OBSERVACIONES:

ACTUALMENTE ESTAN HACIENDO RODAPIES, GUARNICIONES, RELLENO Y COLADO DE BANQUETAS.



CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
DESPALME	2,333.76	40.00%	M2
TRAZO	2,333.76	40.00%	M2
EXCAVACION	446.75	20.00%	
CORTE EN C	460.15	15.00%	
RELLANO	834.51	26.00%	
BANQUETAS	1,701.78	20.00%	
RODAPIE	975.88	25.00%	
GUARNICIONES	1,457.08	25.00%	



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



CONTRATO: HAS-SivOP-FORTAMUN-031-2022

OBRA: PAVIMENTACION DE AVENIDA LOROS ENTRE AV. CTM Y AV. LUIS D. COLOSIO, FRACC. VILLAS DEL SOL

MONTO DE CONTRATO: \$7,159,363.45 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: INNOVACION DISEÑO Y VANGUARDIA EN CONSTRUCCION DEL CARIBE, S.A DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 de septiembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 25.00%

AVANCE FISICO: 45.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 0.0%

FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO 2022

FECHA DE TERMINACION: 05 DE NOVIEMBRE 2022




ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

REALIZAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y TRABAJOS DE TERRACERIAS EN SITIO.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION	10,553.81	100.00%	M2
ESCARIFICADO DE TERRENO EXISTENTE	8,134.14	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA DE MATERIAL TIPO B DE MATERIAL TIPO B	559.92	100.00%	M3
CORTE DE MATERIAL TIPO C	263.80	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO EN GREÑA	580.30	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE	688.80	85.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE BASE	688.80	85.00%	M3
RIEGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION	9,311.69	0.00%	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA	9,311.69	0.00%	M2

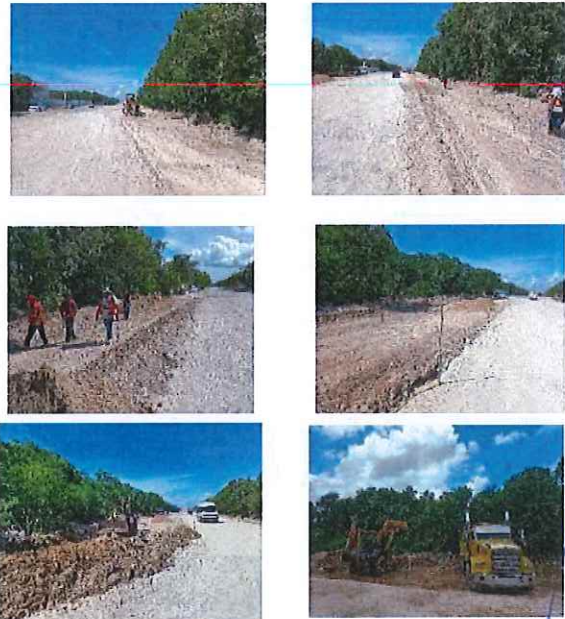

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




CONTRATO: HAS-SIVOP-FORTAMUN-032-2022
OBRA: "Construcción de acceso a la localidad de Puerto Aventuras"

FECHA INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2022
FECHA TERMINO: 01 DE OCTUBRE DE 2022
MONTO DE CONTRATO: \$ 2,996,048.67 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022
AVANCE PROGRAMADO: 88.00%
AVANCE FISICO: 30.00%
AVANCE EN ESTIMACION: 0.00%

CONVENIO: _____ FECHA DE INICIO: _____
MODIFICATORIO: _____ FECHA DE TERMINO: _____
MONTO DE CONVENIO: _____ IVA INCLUIDO

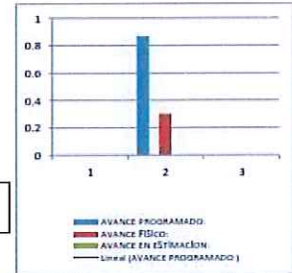

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFÍAS
PRELIMINARES, MANTENIMIENTO EN ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS	
OBSERVACIONES:	

SE ICONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE FUERTO AVENTURAS, SE REALIZAN LAS CIMENTACIONES A BASE DE MAMPONERIA Y RODAPIE DE BLOCK, SE TRABAJA EN LOS ARMADOS DE LAS COLUMNAS Y SE INICIA EL MANTENIMIENTO EN AL ESTRUCTURA METALICA.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
ACCESO A PUERTO AVENTURAS			
A PRELIMINARES		90%	
B CIMENTACION		35%	
C ESTRUCTURA		15%	
D ALBAÑILERIA		20%	
E HERRERIA		15%	
F INSTALACION ELECTRICA		10%	
G TERRACERIAS		40%	
H GUARNICIONES Y BANQUETAS		20%	
I PASO PEATONAL		0%	
J ACABADOS Y SEÑALIZACION		0%	



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Resultados de la Actividad 4. Se da seguimiento a la integración de 29 Expediente Técnicos Unitarios de Obra Pública, conteniendo la evidencia de la planeación, contratación, ejecución y control de las obras Públicas que realiza la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas:

No.	CON RECURSOS FISCALES
1	Elaboración, Gestión y Seguimiento de Trámites Estatales y/o Federales en Materia de Impacto Ambiental del H. Ayuntamiento de Solidaridad. Firma de Contrato 11 de abril del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-001-2022 Avance de Integración: 70%
2	Reparación de socavón en la Calle Ira. Entre Avenida 30 y calle 35 del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-002-2022 Avance de Integración: 95%
3	Reparación de vialidades en diversos puntos de Playa del Carmen Firma de Contrato 01 de junio del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-015-2022 Avance de Integración: 90%
4	Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 07 de junio del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-016-2022 Avance de Integración: 65%
5	Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 07 de junio del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-017-2022 Avance de Integración: 60%
6	Rehabilitación de las oficinas de la Secretaría de Justicia Cívica Firma del contrato No. Contrato Avance de Integración: 60%
7	Construcción de Acceso a la Localidad de Puerto Aventuras Firma del contrato No. Contrato Avance de Integración: 30%

No.	CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN
8	Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 25 de abril del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-003-2022 Avance de Integración: 90%
9	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 16 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-005-2022 Avance de Integración: 65%
10	Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras. Firma de Contrato 16 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-006-2022 Avance de Integración: 60%
11	Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Primera Etapa. Firma de Contrato 24 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-007-2022 Avance de Integración: 65%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



No.	CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN
12	Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Segunda Etapa. Firma de Contrato 24 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-008-2022 Avance de Integración: 65%
13	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 30 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-009-2022 Avance de Integración: 90%
14	Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad Deportiva Poliforum del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 30 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-010-2022 Avance de Integración: 60%
15	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Mario Villanueva del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 30 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-011-2022 Avance de Integración: 60%
16	Rehabilitación del Mercado Municipal Diana Laura Riojas en la Colonia Luis Donaldo Colosio. Firma de Contrato 31 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-012-2022 Avance de Integración: 45%
17	Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 31 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-013-2022 Avance de Integración: 90%
18	Pavimentación de Av. 70 Norte entre Av. Constituyentes y Calle 36 Norte en la Colonia el Pedregal. Firma de Contrato 31 de mayo del 2022 Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-014-2022 Avance de Integración: 90%
19	Rehabilitación de parques para actividades de recreación y esparcimiento en el Municipio de Solidaridad Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-019-2022 Avance de Integración: 55%
20	Construcción de alumbrado público en avenida Sur entre avenida 115 a la avenida 75 del Municipio de Solidaridad Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-020-2022 Avance de Integración: 45%
21	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Sur entre Avenida 115 a la Avenida 75 del Municipio de Solidaridad Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-021-2022 Avance de Integración: 55%
22	Construcción de guarniciones y banquetas de la Av. CTM entre Av. 115 a Carretera Federal, y Av. 115 entre Calle Coba a Av. Sur del Municipio de Solidaridad Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-022-2022 Avance de Integración: 55%
23	Pavimentación de Carpeta Asfáltica de la Av. Diag. 65 entre Av. CTM y Av. Colosio Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-023-2022 Avance de Integración: 55%
24	Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad, Segunda Etapa. Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-024-2022 Avance de Integración: 30%
25	Pavimentación de Carpeta Asfáltica en la Calle Lirios entre Calle Ceiba y Calle Caoba Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-025-2022 Avance de Integración: 45%
26	Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas de la Avenida 75 entre Calle 36 Norte y Avenida Sur, en el Municipio de Solidaridad Nº Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-026-2022 Avance de Integración: 30%





No. CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN	
27	Pavimentación de la Avenida Diag. 65 entre Av. CTM y Av. Sur N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-027-2022 Avance de Integración: 30%
28	Construcción de guarniciones y banquetas en la super manzana 075 en el Municipio de Solidaridad N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-030-2022 Avance de Integración: 30%
29	Pavimentación de avenida Loros entre Av. CTM y Av. Luis D. Colosio, Fracc. Villas del Sol. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-031-2022 Avance de Integración: 30%

Durante el segundo trimestre se reportó la obra denominada “Reparación de socavón en la Calle 1ra. Entre Avenida 30 y calle 35 del Municipio de Solidaridad.”, con Núm. de contrato HAS-SIyOP-RF-002-2022, con un avance del 90%, por lo que se consideró para el cumplimiento de la actividad de Integración de Expediente Técnico Unitario de Obra Pública al contener la documentación comprobatoria de la inversión pública realizada.

Para este tercer trimestre, siguiendo el mismo criterio de integración documental al 90%, tenemos 5 expedientes técnicos unitarios para registro de cumplimiento de esta actividad, los cuales corresponden a los siguientes:

No. CON RECURSOS FISCALES	
1	Reparación de vialidades en diversos puntos de Playa del Carmen Firma de Contrato 01 de junio del 2022 N° Contrato HAS-SIyOP-RF-015-2022 Avance de Integración: 90%

No. CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN	
2	Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 25 de abril del 2022 N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-003-2022 Avance de Integración: 90%
3	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 30 de mayo del 2022 N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-009-2022 Avance de Integración: 90%
4	Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad. Firma de Contrato 31 de mayo del 2022 N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-013-2022 Avance de Integración: 90%
5	Pavimentación de Av. 70 Norte entre Av. Constituyentes y Calle 36 Norte en la Colonia el Pedregal. Firma de Contrato 31 de mayo del 2022 N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-014-2022 Avance de Integración: 90%





INSPECCIONES POR USO DE LA VÍA PÚBLICA REALIZADAS	
Unidad Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Programa de Desarrollo PMD	III. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Línea de acción PMD:	5.- ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE JULIO 2022 AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022.

Objetivo del Proyecto: Contribuir al cuidado y conservación de la vía pública para que el municipio de solidaridad cuente con una infraestructura de calidad, que sea funcional para la población, y brinde buena imagen a nuestro municipio.

Descripción de la actividad/Proyecto: Se inspecciona y vigila la vía pública, para que la población haga un adecuado uso de la misma contando con los permisos correspondientes en estricto apego a la normatividad aplicable.

Población Objetivo: La población del Municipio de Solidaridad

Avances del proyecto Inspecciones por Uso de la Vía Pública:

Se programaron realizar durante el ejercicio fiscal 2022, 1400 Inspecciones por uso de la vía pública entre los permisos que llega a gestionar la ciudadanía y las obras que se intervienen en la vía pública, durante el primer trimestre se realizaron 253, en el segundo trimestre se realizaron 229, y en éste tercer trimestre se realizaron 220 inspecciones, representando un avance del 50.14% equivalente a 702 inspecciones de la vía pública realizadas.

Resultados Actividad/Proyecto:


1. Se realizaron 98 actas de inspección por uso de la vía públicas, de las cuales tenemos que 44 actas de inspección fueron atendidas por los ciudadanos acudiendo a la oficina para darle el seguimiento oportuno al mismo, como a continuación enlisto:





Evidencia:

JULIO -2022.									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
01/07/2022	157	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	85/20	EJIDO	OBSTRUCCION	ANDAMIOS-RAMPA	ATENDIDO	P#187	
01/07/2022	158	SE DEJO NOTIFICACION	JUAREZ/115-120	EJIDO	RUPTURA	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
04/07/2022	159	SE DEJO NOTIFICACION	28 JULIO/CHEMUYIL-PLAYA DEL CARMEN	28 DE JULIO	MODIFICACION	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
04/07/2022	160	JOSE SANTOS DE LA CRUZ ROMERO	75/34-36	PEDREGAL	OBSTRUCCION	SIMBRA	ATENDIDO	04/07/2022	
05/07/2022	161	HERRERA ORTIZ ELVIRA	CAOBA/NICTE-HA	EJIDO	OBSTRUCCION	TAPIAL-MATERIAL	NO SE HAN PRESENTADO		
05/07/2022	162	LOURDEZ YAMILI ALBORNOZ CANCHE	DURASNO/LILIS	FLORES	DAÑO	MEZCLA	PRESENTADO	05/07/2022	\$ 300.00
06/07/2022	163	INSGAR SA DE CV	15/1.	CENTRO	RUPTURA	RAMPA	ATENDIDO		
06/07/2022	164	SE DEJO NOTIFICACION	LILIS/SOLIDARIDAD		DAÑO	MARCAS DE CORTE	NO SE HAN PRESENTADO		
07/07/2022	165	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	85/20	EJIDO	2DO		ATENDIDO	P#187	
07/07/2022	166	SE DEJO NOTIFICACION	PROLONGACION 115	COPAN	RUPTURA	DRENAJE	NO SE HAN PRESENTADO		
07/07/2022	167	SE DEJO NOTIFICACION	SUR/SIN NOMBRE	PASEOS SISAL	RUPTURA	DRENAJE	NO SE HAN PRESENTADO		
08/07/2022	168	SE DEJO NOTIFICACION	23/75	EJIDO	INVASION	CASTILLO - ENERGIA E.			
11/09/2022	169	CARLOS MARTIN CARBALLO CAMAS	MONTE SINAI/MONTE CASCADAS	BOSQUE REAL	RUPTURA	RAMPA		11/07/2022	\$ 710.00
11/07/2022	170	GABRIEL RAMOS VERDE BERZUNZA	ISLA MARLLORCA/ANTILLAS	VILLAMAR II	OBSTRUCCION	ANDAMIOS		12/07/2022	\$ 300.00
11/09/2022	171	SE DEJO NOTIFICACION	35/2.	CENTRO	SELLOS006-007-008		NO SE HAN PRESENTADO		
12/07/2022	172	SE DEJO NOTIFICACION	38/25	COLOSO	INVASION	MURETE	NO SE HAN PRESENTADO		
12/07/2022	173	SE DEJO NOTIFICACION	CONSTITUYENTES/FLORES DE CIRUELO	FLORES	OBSTRUCCION	ANDAMIOS	ATENDIDO		
12/07/2022	174	SE DEJO NOTIFICACION	13/100-105	FORJADORES	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	NO SE HAN PRESENTADO		
13/07/2022	175	RAFAEL PECH DZUL	BUHOS/BUHOS	VILLAS DEL CARMEN	MODIFICACION	RAMPA	ATENDIDO		
14/07/2022	176	SE DEJO NOTIFICACION	ANDRE QROO	PEDREGAL	OBSTRUCCION	TAPIAL	ATENDIDO		





JULIO -2022.									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
14/07/2022	17	SE DEJO NOTIFICACION	4/20-25	CENTRO	OBSTRUCCION	TAPIAL	ATENDIDO	P#185	
15/07/2022	8	IH DEL CARIBE SA DE CV	42/5	ZAZIL-HA	OBSTRUCCION	ANDAMIOS	ATENDIDO	P#192	\$ 5,100.00
15/07/2022	17	SE DEJO NOTIFICACION	80/17	EJIDO	INVASION	TAPIAL	ATENDIDO	P#224	
15/07/2022	18	INMOBILIARIA 1034 SA DE CV	34/10	GONZALO GUERERERO	INVASION	REGISTRO	ATENDIDO		
18/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	SUR/SIN NOMBRE	PASEOS SISAL	RUPTURA	DRENAJE	ATENDIDO		
18/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	10/70.	COLOSIO	OBSTRUCCION	PUNTALES	ATENDIDO	P#189/2022	
19/07/2022	18	BANCO AZTECA SAIR	TECNOLOGICO/115-HIPOCAMPO	ARCO VIAL	RUPTURA	REGISTRO	ATENDIDO	P#199	
19/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	27/100-105	FORJADORES	DAÑO	MEZCLA	ATENDIDO		
19/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	19/135-140	BELLA VISTA	RUPTURA	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
19/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	MONTE DARO/MONTE ATLAS	BOSQUE REAL	DAÑO	MEZCLA	ATENDIDO		
21/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	GUACAMAYAS/BLVD PALMAS	PALMAS	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ATENDIDO	P#193	
21/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	TUCANES	PALMAS	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	NO SE HAN PRESENTADO		
21/07/2022	18	SE DEJO NOTIFICACION	75/CONST	EJIDO	RUPTURA	FIBRA OPTICA	NO SE HAN PRESENTADO		
25/07/2022	19	SE DEJO NOTIFICACION	MUYIL/ISLA MUJERES-JUAREZ	28 DE JULIO	MODIFICACION	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
26/07/2022	19	SE DEJO NOTIFICACION	28 DE JULIO	28 DE JULIO	OBSTRUCCION	ANDAMIOS	NO SE HAN PRESENTADO		
26/07/2022	19	SE DEJO NOTIFICACION	PALMA NAVIDAD	PALMAS	DAÑO	MEZCLA		26/07/2022	\$ 400.00
28/07/2022	19	SE DEJO NOTIFICACION	ALCATRAZ	FLORES	MODIFICACION	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
29/07/2022	19	SE DEJO NOTIFICACION	BALI	BALI	MODIFICACION	RAMPA	ATENDIDO		





JULIO -2022.									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
29/07/2022	195	SE DEJO NOTIFICACION	25/4-6.	CENTRO	OBSTRUCCION	RAMPA	ATENDIDO	P#216	
29/07/2022	196	SE DEJO NOTIFICACION	TINTAL	TINTAL	IMCUMPLIMIENTO	RAMPA	ATENDIDO	P#217	

AGOSTO									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
01/08/2022	197	SE DEJO NOTIFICACION	LILIS/SOLIDARIDAD		RUPTURA	DRENAJE	ATENDIDO		
02/08/2022	198	SE DEJO NOTIFICACION	50/10-5TA	CENTRO	RUPTURA	BANQUETA	NO SE HAN PRESENTADO		
04/08/2022	199	SE DEJO NOTIFICACION	50/5-10	COLOSIO	INVASION	TAPIAL	NO SE HAN PRESENTADO		
05/08/2022	200	INMOBILIARIA CADU	115/ISLA SANTILLAN-65		RUPTURA	RAMPA	ATENDIDO		
05/08/2022	201	SE DEJO NOTIFICACION	SOLIDARIDAD/MISION DEL CARMEN-115	28 DE JULIO	IMCUMPLIMIENTO	PERMISO - AP	ATENDIDO		
09/08/2022	202	SE DEJO NOTIFICACION	115/65-ISLAS ANTILLAS		RUPTURA	FIBRA OPTICA	NO SE HAN PRESENTADO		
10/08/2022	203	INMOBILIARIA 1034	30/34	GONZALO GUERERERO	IMCUMPLIMIENTO	PERMISO-ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
11/08/2022	204	SE DEJO NOTIFICACION	MUNI/SEGARRA	CATALUÑA	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO	P#242	
15/08/2022	205	SE DEJO NOTIFICACION	5TA/52	COLOSIO	OBSTRUCCION	PUNTALES	NO SE HAN PRESENTADO		
15/08/2022	206	SE DEJO NOTIFICACION	88/30-35	COLOSIO	INVASION	REGISTRO	NO SE HAN PRESENTADO		
17/08/2022	207	IVAN DE JESUS DE LA CRUZ	115/20-18	EJIDO	RUPTURA	RAMPA	ATENDIDO		
17/08/2022	208	INMOBILIARIA 1034	34/10	GONZALO GUERERERO	IMCUMPLIMIENTO	PERMISO-ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
18/08/2022	209	SE DEJO NOTIFICACION	21/100-110	FORJADORES	RUPTURA	RAMPA	ATENDIDO		


 H. ANUNCIAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 Y OBRAS PÚBLICAS
 PLAZA DEL GOBIERNO, QUINTANA ROO
 2024 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

AGOSTO									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
19/08/2022	210	SE DEJO NOTIFICACION	COBA/SOLIDARIDAD-COZUMEL	28 DE JULIO	INCUMPLIMIENTO	FALTA DE LIMPIEZA	NO SE HAN PRESENTADO		
19/08/2022	211	SE DEJO NOTIFICACION	TECNOLOGICO/15-UNIVERSIDADES	VILLAS RIVIERA	INCUMPLIMIENTO	FALTA DE LIMPIEZA	NO SE HAN PRESENTADO		
22/08/2022	212	VALDES DE NICOLAS HEFZIBA	GOLONDRINAS	PALMAS	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION		23/08/2022	\$ 500.00
22/08/2022	213	INMOBILIARIA CADU	115/ISLA SANTILLAN-65		MODIFICACION	RAMPA	ATENDIDO		
22/08/2022	214	INMOBILIARIA CADU	115/ISLA SANTILLAN-65		RUPTURA	FIBRA OPTICA	ATENDIDO		
22/08/2022	215	ENI NETWORKS SAPI DE CV	LILIS/JUAREZ-CONSTITUYENTES	FLORES	RUPTURA	FIBRA OPTICA		30/08/2022	\$ 24,055.00
23/08/2022	216	FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	115/CTM	CRUZ DE SERVICIO	INCUMPLIMIENTO	REPARACION	ATENDIDO		
23/08/2022	217	SE DEJO NOTIFICACION	MISION DEL CARMEN/COZUMEL-NACIONES	28 DE JULIO	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	NO SE HAN PRESENTADO		
23/08/2022	218	ALVARADO RODRIGUEZ YAZMIN	COBA/HUNAB	CATALUÑA	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	NO SE HAN PRESENTADO	24/08/2022	\$ 500.00
23/08/2022	219	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	5/1-JUAREZ	CENTRO	INCUMPLIMIENTO	PERMISO		27/08/2022	\$ 25,575.00
24/08/2022	220	SE DEJO NOTIFICACION	15/80-85	EJIDO	CONSTRUCCION	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
24/08/2022	221	SE DEJO NOTIFICACION	SOLIDARIDAD/COBA-TULUM		RUPTURA	FIBRA OPTICA	NO SE HAN PRESENTADO		
26/08/2022	222	SE DEJO NOTIFICACION	CARRET FED/20-22	EJIDO	MODIFICACION	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
29/08/2022	223	ORIMANUEL SA DE CV	25/80-85	EJIDO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	NO SE HAN PRESENTADO		
30/08/2022	224	SE DEJO NOTIFICACION	80/17	EJIDO	INVASION	TAPIAL	ATENDIDO	P#250	
30/08/2022	225	SE DEJO NOTIFICACION	50/5-100	COLOSIO	RUPTURA	TAPIAL-BANQUETA	NO SE HAN PRESENTADO		
30/08/2022	226	SE DEJO NOTIFICACION	MUNT/SEGOMA	CATALUÑA	RUTURA	FIBRA OPTICA	ATENDIDO	P#242	



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL COMERCIO, QUINTANA ROO
2021 - 2024



AGOSTO									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
30/08/2022	227	SE DEJO NOTIFICACION	MISION DEL CARMEN/COZUMEL-NACIONES	MISION DEL CARMEN	INVASION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	EN PROCESO		
30/08/2022	228	SE DEJO NOTIFICACION	CARRET FED/20-22	EJIDO	MODIFICACION	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
31/08/2022	229	SE DEJO NOTIFICACION	BALI	BALI	MODIFICACION	RAMPA	ATENDIDO		

SEPTIEMBRE									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
01/09/2022	230	SE DEJO NOTIFICACION	50/70-75	PEDREGAL	RUPTURA	BANQUETA	NO SE HAN PRESENTADO		
02/09/2022	230	SE DEJO NOTIFICACION	10/CTM-48	COLOSIO	RUPTURA	BANQUETA-MANIOBRA	NO SE HAN PRESENTADO		
05/09/2022	231	SE DEJO NOTIFICACION	115/8.	EJIDO	RUPTURA	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
06/09/2022	232	SE DEJO NOTIFICACION	CISNE	PALMAS	OBSTRUCCION	SIMBRA	NO SE HAN PRESENTADO		
	233								
CANCELADO									
07/09/2022	234	SALVAJE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE CV	40/15	ZAZIL-HA	RUPTURA	PUNTALES		15/09/2022	\$ 12,028.00
08/09/2022	235	SE DEJO NOTIFICACION	AV. 28 DE JULIO	28 DE JULIO	OBSTRUCCION	CIMBRA	NO SE HAN PRESENTADO		
09/09/2022	236	SE DEJO NOTIFICACION	70/30-35	COLOSIO	MODIFICACION	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
12/09/2022	237	SE DEJO NOTIFICACION	110/25-115	EJIDO	RUPTURA	RAMPA	NO SE HAN PRESENTADO		
12/09/2022	238	SE DEJO NOTIFICACION	FUENTE LA BASTILLA	SANTA FE	DAÑO	MEZCLA	NO SE HAN PRESENTADO		
13/09/2022	239	SE DEJO NOTIFICACION	115	WALMART	INCUMPLIMIENTO	PERMISO	NO SE HAN PRESENTADO		





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

SEPTIEMBRE									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
14/09/2022	240	ARQC 3 SAPI DE CV	26/25-30	GONZALO GUERERERO	OBSTRUCCION	ANDAMIOS		23/09/2022	\$ 488.00
19/09/2022	241	SE DEJO NOTIFICACION	5/26-28	CENTRO	RUPTURA	BANQUETA	NO SE HAN PRESENTADO		
19/09/2022	242	ARQC 3 SAPI DE CV	26/25-30	GONZALO GUERERERO	OBSTRUCCION	ANDAMIO	ATENDIDO	P#240	
21/09/2022	243	SE DEJO NOTIFICACION	20/50-52	COLOSIO	RUTURA	BANQUETA	NO SE HAN PRESENTADO		
21/09/2022	244	SE DEJO NOTIFICACION	6/120-125	EJIDO	RUPTURA	BANQUETA	ATENDIDO		
28/09/2022	245	SE DEJO NOTIFICACION	24/30-25	CENTRO	INCUMPLIMIENTO	PERMISO	NO SE HAN PRESENTADO		
26/09/2022	246	SE DEJO NOTIFICACION	29/85-80	FORJADORES	INCUMPLIMIENTO	P#222	EN PROCESO		
26/09/2022	247	SE DEJO NOTIFICACION	6/CARRETERA FEDERAL	EJIDO	RUPTURA	DRENAJE	NO SE HAN PRESENTADO		
28/09/2022	248	SE DEJO NOTIFICACION	JUAREZ/35	AVIACION	INVASION	TAPIAL	NO SE HAN PRESENTADO		
28/09/2022	249	SE DEJO NOTIFICACION	110/4	EJIDO	OSBTRUCCION	SIMBRA		29/09/2022	\$ 900.00
28/09/2022	250	SE DEJO NOTIFICACION	5/26-28	CENTRO	RUPTURA	2DA 241	NO SE HAN PRESENTADO		
29/09/2022	251	SE DEJO NOTIFICACION	85/21-25	EJIDO	INCUMPLIMIENTO	SELLOS	NO SE HAN PRESENTADO		
29/09/2022	252	SE DEJO NOTIFICACION	115/TECNOLOGICO-JACINTO PAT	MULTIPLAZA	INCUMPLIMIENTO	PERMISO	NO SE HAN PRESENTADO		
29/09/2022	253	SE DEJO NOTIFICACION	20/50-52	COLOSIO	RUPTURA	TUBOS	NO SE HAN PRESENTADO		

[Handwritten signature]



M. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL CARRIL, QUINTANA ROO
2021 - 2024



2. Se recibieron 122 solicitudes de permisos para uso de la vía pública, de los cuales se entregaron 86 permisos para uso de la vía pública, de acuerdo a lo siguiente:

Evidencia:

DEL 1 - 30 - JULIO - 2022.												
FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO	
01/07/2022	169	MICHAEL	PAPPANO			52/100-15	EJIDO	DRENAJE SANITARIO		30/06/2022	\$ 1,400.00	
01/07/2022	170	ROSA ELENA	FERREGUT	AVILAS		28	EJIDAL	ENERGIA ELECTRICA		05/07/2022	\$ 2,000.00	
01/07/2022	171	JORGE ARIEL	DE LA CUEVA	GAMBOA		52/1-5	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA		28/07/2022	\$ 2,000.00	
04/07/2022	172	YUDIKO	YEEKUN	GUZMAN		28/80	EJIDAL	DRENAJE SANITARIO	\$ 4,000.00		PASE A CAJA	
04/07/2022	173				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	60	EJIDAL	FIBRA OPTICA		25/08/2022	\$ 22,200.00	
08/07/2022	174				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	A	ARRECIFES	AGUA POTABLE-DRENAJE		08/07/2022	\$ 5,660.00	
08/07/2022	175	ROSA ELVIRA	HERRERA	ORTIZ		33/SOL-CAOBAS	EJIDAL	TAPIAL		12/07/2022	\$ 2,800.00	
08/07/2022	176				INGARS ENTERPRICES SA DE CV	1RA /15	AVIACION	RAMPA		14/07/2022	\$ 11,640.00	
11/07/2022	177				INGARS ENTERPRICES SA DE CV	1RA/15-20	AVIACION	TAPIAL		14/07/2022	\$ 8,370.00	
11/07/2022	178				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	50/66-68	FUNDADOR	AGUA POTABLE-DRENAJE			\$ 2,860.00	
11/07/2022	179				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	45/26-28	GLO GUERRERO	AGUA POTABLE			\$ 1,370.00	
11/07/2022	180				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	CHEMUYIL/CARRILLO PTO.	28 DE JULIO	AGUA POTABLE-DRENAJE			\$ 7,620.00	
11/07/2022	181				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	FLOR DE ROMERO/MENTA	FLORES	FIBRA OPTICA			PASE A CAJA	
12/07/2022	182	JOSE DE JESUS	BARCELA	USCANGA		FLOR DE ROMERO/CONSTITUYENTE	FLORES	ANDAMIOS	\$ 7,000.00	12/07/2022	\$ 1,000.00	



DEL 1 - 30 - JULIO -2022.

FECHA	NOMBRE	APPELLIDO	APPELLIDO O	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
14/07/2022	183			PACHOS DESARROLLOS SA DE CV	24/25-30	GONZALO GUERRERO	ENERGIA ELECTRICA		12/07/2022	\$ 4,400.00
14/07/2022	184	CHRISTIAN SALIM	DOMINGUEZ FLORES		50/48-5	CENTRO	ANDAMIOS		15/07/2022	\$ 1,000.00
18/07/2022	185			DESARROLLOS TURISTICOS LT SA DE CV	4/20-25	CENTRO	TAPIAL		21/07/2022	\$ 5,000.00
18/07/2022	186			JV DESARROLLOS SAPI DE CV	ANDRES QROO	PEDREGAL	ANDAMIOS		15/07/2022	\$ 440.00
19/07/2022	187			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	85/20	EIJDAL	ANDAMIOS		15/07/2022	\$ 1,336.00
19/07/2022	188			INMOBILIARIA SEPTIMO SAPI DE CV	26/5-10.	XAMAN-HA	BANQUETA		19/07/2022	\$ 6,640.00
19/07/2022	189	ISAAC	CABRERA		10/60-70	COLOSIO	PUNTALES		19/07/2022	\$ 1,800.00
19/07/2022	190			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	40/60-65	PEDREGAL	AGUA POTABLE		22/07/2022	\$ 1,920.00
19/07/2022	191			INMOBILIARIA 10X34 SA DE CV	10/34-38	CENTRO	ENERGIA ELECTRICA		25/07/2022	\$ 3,000.00
19/07/2022	192	JIMENA GUADALUPE	VAZQUEZ	IH DEL CARIBE SA DE CV	5/42-44	ZAZIL-HA	ANDAMIOS-MANIOBRA		20/07/2022	\$ 5,100.00
21/07/2022	193				GUACAMAYAS	PALMAS	MANIOBRA		21/07/2022	\$ 400.00
21/07/2022	194			RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	CIRUELO/FUEGO-SOLIDARIDAD	NATURA	ENERGIA ELECTRICA		11/08/2022	\$ 8,600.00
21/07/2022	195			GRUPO DESARROLLADOR HABITANIA DGH SAPI DE CV	CTM/20-15	ZAZIL-HA	ENERGIA ELECTRICA		06/09/2022	\$ 14,000.00
22/07/2022	196			GRUPO KATNA SA DE CV	FLAMINGOS-40	ZAZIL-HA	ENERGIA ELECTRICA		29/07/2022	\$ 1,000.00
22/07/2022	197			GRUPO KATNA SA DE CV	FLAMINGOS-40	ZAZIL-HA	ANDAMIOS		29/07/2022	\$ 11,800.00
26/07/2022	198	CANDI CAROLINA	MARTINEZ PECH		TUCANES	PALMAS	MANIOBRA		26/07/2022	\$ 400.00
26/07/2022	199			CECO CENTROS COMERCIALES SA DE CV	TECNOLOGICO/115-HIPOCAMPO		ENERGIA ELECTRICA		26/07/2022	\$ 2,000.00
26/07/2022	200			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	19/80-85	EIJDAL	AGUA POTABLE		22/08/2022	\$ 1,020.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL GOBIERNO, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



DEL 1 - 30 - JULIO - 2022.

FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
26/07/2022	201				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	15/70	EJIDAL	AGUA POTABLE		29/07/2022	\$ 1,040.00
26/07/2022	202				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	CONST/38,75 CARRET FED	PEDREGAL	FIBRA OPTICA		01/09/2022	\$ 1,030.38
26/07/2022	203	TOMASI ISOLINA	MANFORTE	ALBORNOS		30	AVIACION	RAMPA		04/08/2022	\$ 1,000.00

AGOSTO

FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
28/07/2022	204				ZENSOS SPAZIO SAPI DE CV	85/ARCO VIAL-COPAL	EJIDAL	RAMPA		03/08/2022	\$ 19,576.00
01/08/2022	205	ALFREDO	IBARRA	PATRON		100/29-41	EJIDAL	RAMPA	\$ 4,000.00	PRESUPUESTO	
01/08/2022	206	ALFREDO	IBARRA	PATRON		100/29-41	EJIDAL	MANIOBRA	\$ 1,400.00	PRESUPUESTO	
01/08/2022	207				CADENA COMERCIAL OXOSA DE CV	20/80-85	EJIDAL	RAMPA		02/08/2022	\$ 1,300.00
01/08/2022	208				RBA CATV SA DE CV	OLIVOS/SIN NOMBRE	FLORES	REPARACION FIBRA		04/08/2022	S/C
01/08/2022	209				RBA CATV SA DE CV	PALMAS II/FLORES DE NOCHE BUENA	PALMAS II	REPARACION FIBRA		04/08/2022	S/C
01/08/2022	210				RBA CATV SA DE CV	FLORES DE ROMERO/AMAPOLAS	FLORES	FIBRA OPTICA		17/08/2022	\$ 29,400.00
01/08/2022	211				TIERRA MAYA INMOBILIARIO DESARROLLADORES Y REAL ESTATES DE RL DE CV	17/80-85	EJIDAL	ENERGIA ELECTRICA		04/08/2022	\$ 13,000.00





FECHA		NUMERO DE PERMISO	AGOSTO				CANCELADO		FECHA PAGADO		
FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
01/08/2022	212				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	35/28-30	GONZALO GUERRERO	AGUA POTABLE		08/08/2022	\$ 1,400.00
03/08/2022	214				SOGACAM SA DE CV	CONST/85-70	COLLEJIDAL	RAMPA		04/08/2022	\$ 6,400.00
05/08/2022	215	ALEJANDRO	BRITO	SAN GERMAN		CHEMUYIL/NACIONES	28 DE JULIO	AGUA POTABLE		09/08/2022	\$ 8,000.00
05/08/2022	216				BRICKBOR SA DE CV	25/6-4.	CENTRO	MANIOBRA		03/08/2022	\$ 1,200.00
05/08/2022	217				PROYECTOS MNWZ, SA DE CV	11/65/70	EJIDAL	ENERGIA ELECTRICA		31/08/2022	\$ 10,400.00
05/08/2022	218				MYSTARD SA DE CV	13/56/70	EJIDAL	TAPIAL		10/08/2022	\$ 8,120.00
09/08/2022	219				DESARROLLOS EKASA SA DE CV	14/10-5.	CENTRO	TAPIAL-MANIOBRA		11/08/2022	\$ 3,600.00
11/08/2022	220				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	16/115-110	EJIDO	AGUA POTABLE		11/08/2022	\$ 1,880.00
15/08/2022	221				RBA CATV SA DE CV	FLOR CORAL/PARAISO	FLORES	FIBRA OPTICA	\$ 8,600.00		PRESUPUESTO
15/08/2022	222	ENIEREZ	RAMIREZ	ALVAREZ		29/85-80	FORJADORES	ENERGIA ELECTRICA		22/08/2022	\$ 37,500.00
15/08/2022	223				CONJUNTO PARNELLI SA DE CV	67/PROL. 115	EJIDAL	ENERGIA ELECTRICA	\$ 25,300.00		PASE A CAJA
15/08/2022	224	GUADALUPE	MONTES	CASTRO		42/25-20	ZAZIL-HA		\$ 1,000.00		
15/08/2022	225				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	PETEMPICH	FRONTEMAR	FIBRA OPTICA		30/08/2022	\$ 12,000.00
15/08/2022	226				ARQUITECTURA MAS 4	10/48-50	COLOSIO	RAMPA		18/05/2022	\$ 600.00
24/08/2022	227				PACHOS DESARROLLOS SA DE CV	24/25-30	GLO GUERRERO	RAMPA		24/08/2022	\$ 4,600.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



**Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas**

AGOSTO										
FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
24/08/2022	228			VIVO ARRENDADORA SA DE CV	CALZADA PTO. MAYA	PUERTO AVENTURAS	AGUA POTABLE-DRENAJE		24/08/2022	\$ 5,000.00
24/08/2022	229			PACHOS DESARROLLOS SA DE CV	24/25-30	GLO GUERRERO	ENERGIA ELECTRICA		24/08/2022	\$ 2,800.00
24/08/2022	230	LOPEZ	HECTOR OSWALDO		105/4	EJIDAL	RAMPA		24/08/2022	\$ 1,000.00
24/08/2022	231			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	40/60-65	EJIDAL	AGUA POTABLE		24/08/2022	\$ 1,920.00
29/08/2022	232			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	PLAYA SERENA/CIRUELO	PORTO ALTO	FIBRA OPTICA	\$	01/09/2022	\$ 6,000.00
29/08/2022	233			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV			FIBRA OPTICA	\$ 76,300.00		PRESUPUESTO
29/08/2022	234			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	PETEMPICH/JACINTO PAT	EJIDAL	FIBRA OPTICA	\$ 7,400.00		PRESUPUESTO
29/08/2022	235			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	COLOSIO/ESTRELLA-DEL SOL-PASEO REAL-CUMBRE	OLIVOS	FIBRA OPTICA	\$ 64,480.00		PRESUPUESTO
29/08/2022	236			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	COLOSIO/MAZULES-SINAL-CASCADAS	COLOSIO	FIBRA OPTICA	\$ 440,100.00		PRESUPUESTO
29/08/2022	237			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	RIVIERA/BILBAO-OLIVOS-MIDEL CARMEN- REAL IBIZA	GALAXIA II	FIBRA OPTICA	\$ 170,340.00		PRESUPUESTO
29/08/2022	238			ZENZO ESPACIO SAPI DE CV	85/ARCO VIAL-COPAL	BAMBU	PASO PEATONAL	\$	02/09/2022	\$ 12,000.00
29/08/2022	239	YAZMIN	ALVARO	RODRIGUEZ			MANIOBRA	\$ 300.00		
29/08/2022	240			ENI NETWORKS SAPI DE CV					02/09/2022	\$ 26,000.00
29/08/2022	241			WHITEBOX REAL ESTATE SAPI DE CV	26/20	CENTRO	TAPIAL		31/08/2022	\$ 2,200.00
29/08/2022	242	SERGIO	HORI	CICERO	SUR	PESCADORES	FIBRA OPTICA		31/08/2022	\$ 3,000.00
31/08/2022	243	EMIDIO	ONI		1/35.	CENTRO	RAMPA		03/09/2022	\$ 810.00



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



AGOSTO											
FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
31/08/2022	244				DESARROLLOS EKASA SA DE CV	24/10-5.	CENTRO	ANDAMIOS	\$ 2,200.00		
31/08/2022	245				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	5/COLOSIO	COLOSIO	AGUA POTABLE -DRENAJE		12/09/2022	\$ 4,320.00

SEPTIEMBRE											
FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
01/09/2022	246	NAHEL DE JESUS	NIETO	GARCIA		5/32-30	XAMAN-HA	TAPIAL		08/09/2022	\$ 6,000.00
07/09/2022	247				CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	NUEVA CREACION	28 DE JULIO	FIBRA OPTICA	\$ 1,095,486.00		
01/09/2022	248				CECO CENTROS COMERCIALES SA DE CV	TECNOLOGICO/HIPOCAMPO		AGUA POTABLE		01/09/2022	\$ 15,530.00
01/09/2022	249				CECO CENTROS COMERCIALES SA DE CV	TECNOLOGICO/HIPOCAMPO		DRENAJE		01/09/2022	\$ 2,000.00
01/09/2022	250	MARIA JUSTA	GUTIERREZ	MARTINEZ		17/80-85	EJIDAL	TAPIAL		01/09/2022	\$ 3,700.00
07/09/2022	251				HOSPITAL AMERIMED PLAYA DEL CARMEN SA DE CV	CARRETERA FED/20-22	EJIDAL	RAMPA		08/09/2022	\$ 8,200.00
07/09/2022	252				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	52/1-5	COLOSIO	AGUA POTABLE		12/09/2022	\$ 800.00
07/09/2022	253				CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	PUNTA ESTRELLA	PUNTA ESTRELLA	FIBRA OPTICA		29/09/2022	\$ 8,900.00
07/09/2022	254				SALVAJE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE RL DE CV	40/15	ZAZIL-HA	SIMBRA		15/09/2022	\$ 6,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE COLOSIO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




SEPTIEMBRE											
FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
07/09/2022	255				SALVAJE DESARROLLOS INMOBILIARIOS S DE RL DE CV	40/15	ZAZIL-HA	TAPIAL		15/09/2022	\$ 7,600.00
07/09/2022	256				ZENZO SPACIO SAPI DE CV	85/ARCO VIAL-COPAL	EJIDAL	RAMPA		07/09/2022	\$ 4,113.00
07/09/2022	257				SANTOS DE LA DIVERSION SA DE CV	12/5-1.	CENTRO	ENERGIA ELECTRICA		08/09/2022	\$ 7,000.00
09/09/2022	258				HI FIVE DESARROLLOS SA DE CV	28/5-10.	XAMAN-HA	TAPIAL		09/09/2022	\$ 6,760.00
12/09/2022	259				RBA CATV SA DE CV	FLOR DE ROMERO/NARCISO	FLORES	FIBRA OPTICA			S/C
12/09/2022	260	VICTORIA	GONZALEZ	JUAREZ		28/105	EJIDAL	TAPIAL		12/09/2022	\$ 3,000.00
15/09/2022	261				CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV	CIRUELO/PALMAS-28 DE JULIO	KU YAA'N	ENERGIA ELECTRICA		29/09/2022	\$ 6,000.00
15/09/2022	262				RBA CATV SA DE CV	CTM/LILIS		FIBRA OPTICA	\$ 20,000.00		
15/09/2022	263				RBA CATV SA DE CV	COLOSIO/PAMAS	PALMAS	FIBRA OPTICA	\$ 8,200.00		
15/09/2022	264				RBA CATV SA DE CV	CTM/LOROS		FIBRA OPTICA	\$ 17,400.00		
15/09/2022	265				RBA CATV SA DE CV	LOROS/SUR		FIBRA OPTICA	\$ 9,400.00		
15/09/2022	266				RBA CATV SA DE CV	COLOSIO/LILIS-TURQUESA		FIBRA OPTICA	\$ 457,400.00		
15/09/2022	267				RBA CATV SA DE CV	CIRUELO/CTM-COLOSIO		FIBRA OPTICA	\$ 159,400.00		
15/09/2022	268				RBA CATV SA DE CV	CONST/LIBRAMIENTO-HALCONES		FIBRA OPTICA	\$ 528,200.00		
15/09/2022	269				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	CIRUELO/ESTRELLA-FUEGO	PASO DE LOS OLIVOS	FIBRA OPTICA	\$ 2,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS
PLAZA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
2021 - 2024



FECHA		NUMERO DE PERMISO		SEPTIEMBRE									
NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO				
15/09/2022	270		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	COBAS/29	EJIDAL	FIBRA OPTICA	\$ 23,600.00						
15/09/2022	271		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	29/65	ENCANTO	FIBRA OPTICA	\$ 18,780.00						
15/09/2022	272		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	CAOBAS/80-KIN-35	FORJADORES	FIBRA OPTICA	\$ 724,460.00						
15/09/2022	273		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	PTO MAYA/ESCOTILLA-ZAPOTE	PTO. EVENTURAS	FIBRA OPTICA	\$ 76,000.00						
15/09/2022	274		ARQC3 SAPI DE CV	26/25-30	CENTRO	ENERGIA ELECTRICA		22/09/2022	\$ 10,400.00				
22/09/2022	275		IH DEL CARIBE SA DE CV	5/42-44	ZAZIL-HA	TAPIAL	\$ 9,000.00						
22/09/2022	276		LUROIA SAPI DE CV	4/105	EJIDAL	ENERGIA ELECTRICA		23/09/2022	\$ 11,000.00				
	277		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	AV. FLOR DE CIRUELO/ LAS FLORES-PALMAS	PALMAS	FIBRA OPTICA	\$ 63,000.00						
	278		RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	AV. TECNOLOGICO	GUADALUPANA	FIBRA OPTICA	\$ 2,000.00						
26/09/2022	279		DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	18/110-115	EJIDAL	DRENAJE SANITARIO		28/09/2022	\$ 3,400.00				
26/09/2022	280		DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	23/80-85	EJIDAL	DRENAJE SANITARIO		28/09/2022	\$ 3,400.00				
26/09/2022	281		DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	36/80	PEDREGAL	AGUA POTABLE		28/09/2022	\$ 940.00				
26/09/2022	282		SUN TOWERS DEVELOPMENTS SAPI DE CV	1/48.	COLOSIO	TAPIAL-MANIOBRA	\$ 9,400.00						
26/09/2022	283		GRUPO DESARROLLADOR HABITANIA GDH	CTM/15-20	ZAZIL-HA	TAPIAL-MANIOBRA	\$ 4,400.00						
26/09/2022	284		TOWN TOWER DEVELOPMENTS SAPI DE CV	1/40.	ZAZIL-HA	TAPIAL-MANIOBRA	\$ 4,400.00						
26/09/2022	285		TOWN TOWER DEVELOPMENTS SAPI DE CV	26/5-10.	XAMAN-HA	TAPIAL-MANIOBRA	\$ 4,044.00						



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL GOBIERNO, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

**Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas**

SEPTIEMBRE											
FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
26/09/2022	286				BORPROPERTY SA DE CV	42/1.	ZAZIL-HA	ENERGIA ELECTRICA		29/09/2022	\$ 21,200.00
26/09/2022	287				ITZAL SAPI DE CV	AV. 15	ZAZIL-HA	ENERGIA ELECTRICA		29/09/2022	\$ 8,440.00
27/09/2022	288				GRUPO CONSTRUCTOR PLAYA CAR SA DE CV	44/25-20	CENTRO	ANDAMIOS		29/09/2022	\$ 2,000.00
30/09/2022	289				LUSI Y KURT SA DE CV	CALLE 6	CENTRO	TUNEL TAPIAL		30/09/2022	\$ 8,759.00
30/09/2022	290				LUSI Y KURT SA DE CV	CALLE 6	CENTRO	MANIOBRA		30/09/2022	\$ 3,200.00

Elaboró: Ing. Yalit Guzmán González, Profesional Especializado de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

RESPONSABLE

Arq. Fabián Antonio Herrera Quiam
Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.



AUTORIZA

C. Teresita del Niño Jesús Flota Alcocer
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Unidad Responsable:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Programa de Desarrollo PMD	II. URBANIZACIÓN CON ARMONIA
Línea de acción PMD	9. CONTINUAR CON LOS ESFUERZOS DE DIGITALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRAMITES
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE JULIO AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Objetivo del Proyecto: Contribuir con la regulación y agilización de trámites aplicando las disposiciones normativas, en beneficio de la población del Municipio de Solidaridad.

Descripción de la Actividad: Recabar los documentos requeridos para que la población solidarensa cuente con la atención oportuna del trámite o documento que requiere.

Población objetivo: La población del Municipio de Solidaridad

Actividad/Proyecto:

1. Se expiden Constancias de cooperación por obra pública

Mes	Num. de Constancias Expedidas	Monto Recaudado
Julio	736	\$ 2,260,326.00
Agosto	1,016	\$ 2,861,155.00
Septiembre	702	\$ 3,917,100.00
Total	2,454	\$ 9,038,581.00

2. Se realiza alta al padrón de contratistas del Municipio de Solidaridad.

Mes	Inscripciones realizadas	Monto Recaudado
Julio	7	\$ 2,100.00
Agosto	5	\$ 1,500.00
Septiembre	8	\$ 2,400.00
Total	20	\$ 6,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



3. Se realiza renovación de inscripción al padrón de contratistas del Municipio de Solidaridad.

Mes	Renovaciones realizadas	Monto Recaudado
Julio	1	\$ 250.00
Agosto	1	\$ 250.00
Total	2	\$ 500.00

4. Se realiza expedición de pases a caja para pago de bases de concurso de obra, para las empresas contratistas que requieren participar en procesos de licitación de obra pública.

Mes	Bases de Concurso de Obra	Monto Recaudado
Julio	4	\$ 20,000.00
Septiembre	24	\$ 200,000.00
Total	28	\$ 220,000.00


Elaboró: Ing. Yalit Guzmán González, Profesional Especializado de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

RESPONSABLE

Arq. Fabián Antonio Herrera Quiam
Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.

AUTORIZA

C. Teresita del Niño Jesús Flota Alcocer
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024
