



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de **Infraestructura**
y **Obras Públicas**

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

CUARTO TRIMESTRE:
01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE

EJERCICIO FISCAL 2022

FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ENERO DE 2023.



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS	
Unidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Programa de Desarrollo PMD	III. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Línea de acción PMD:	5.- ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE OCTUBRE 2022 AL: 31 DE DICIEMBRE 2022

Objetivo del Proyecto: Contribuir a que la infraestructura del municipio sea moderna, funcional y cumpla cabalmente con las necesidades de la población y de quienes lo visitan mediante la entrega de una eficiente infraestructura urbana.

Descripción de la actividad/Proyecto: Se trabaja en la elaboración de Proyectos Ejecutivos de obra pública, los cuales están integrados por memorias descriptivas, planos arquitectónicos, especificaciones técnicas, catálogo de conceptos, programas de ejecución, etc., se realiza la contratación de la obra pública y los servicios relacionados con los mismos, cumpliendo con la supervisión de la construcción y con la normatividad aplicable al fondo de financiamiento y se integra el expediente técnico unitario de cada una de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a efecto de documentar la cuenta pública.

Población Objetivo: La población del Municipio de Solidaridad

Avances del Proyecto Obra Pública Realizada:

Se programaron 55(cincuenta y cinco) Obras Públicas a realizarse durante el ejercicio fiscal 2022, de las cuales se tienen 60 (sesenta) obras públicas realizadas, es decir, se encuentran con un avance constructivo del 100%; estas obras públicas corresponden a las siguientes:

1. Reparación de Socavón en la Calle 1ra. entre Avenida 30 y Calle 35 del Municipio de Solidaridad.
2. Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad.
3. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad.
4. Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras.
5. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad.
6. Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad.
7. Pavimentación de Av. 70 Norte entre Av. Constituyentes y Calle 36 Norte en la Colonia el Pedregal.
8. Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad.
9. Elaboración, Gestión y Seguimiento de Trámites Estatales y/o Federales en Materia de Impacto Ambiental Del H. Ayuntamiento de Solidaridad.
10. Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Primera Etapa.
11. Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad Deportiva Poliforum del Municipio de Solidaridad.
12. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Mario Villanueva del Municipio de Solidaridad.
13. Rehabilitación del Mercado municipal Diana Laura Riojas en la Colonia Luis Donaldo Colosio.
14. Reparación de Vialidades en Diversos Puntos de Playa del Carmen.
15. Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad.
16. Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad.
17. Rehabilitación de Parques para Actividades de Recreación y Esparcimiento en el Municipio de Solidaridad.



18. Construcción de Alumbrado Público en Avenida Sur entre Avenida 115 a la Avenida 75 del Municipio de Solidaridad.
19. Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Av. CTM entre Av. 115 a Carretera Federal, y Av. 115 entre Calle Coba a Av. Sur del Municipio de Solidaridad.
20. Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad, Segunda Etapa.
21. Pavimentación de Carpeta Asfáltica en la Calle Lirios entre Calle Ceiba y Calle Caoba.
22. Construcción de Guarniciones y Banquetas en la Súper Manzana 075 en el Municipio de Solidaridad.
23. Pavimentación de Avenida Loros entre Av. CTM y Av. Luis D. Colosio, Fracc. Villas del Sol.
24. Rehabilitación de Pavimentación de la 115 Avenida entre Avenida Tumben Kin y Avenida Mayapan del Municipio de Solidaridad.
25. Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Segunda Etapa.
26. Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Sur entre Avenida 115 a la Avenida 75 del Municipio de Solidaridad.
27. Pavimentación de Carpeta Asfáltica de la Av. Diag. 65 entre Av. CTM y Av. Colosio.
28. Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas de la Avenida 75 entre Calle 36 Norte y Avenida Sur, en el Municipio de Solidaridad.
29. Pavimentación de la Avenida diag. 65 entre Av. CTM y Av. Sur
30. Construcción de acceso a la localidad de Puerto Aventuras.
31. Repavimentación de la Avenida 7 Sur entre Av. 10 y Boulevard Playa del Carmen.
32. Construcción de la Pavimentación de la Av. 80, Av. 85 y Av. 90 Norte entre Av. Constituyentes y Av. 36 del Municipio de Solidaridad.
33. Conclusión de la Habilitación del Museo Interactivo Multicultural de Playa del Carmen Iera Etapa.
34. Construcción de 27 Pozos de Absorción en Diferentes Puntos en el Municipio de Solidaridad.
35. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Rehabilitación de Plaza Cívica en Escuela Jardín de Niños Vicente Suárez, Col. Luis Donald Colosio.
36. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Cancha Deportiva en Escuela Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Col. Villas del Sol.
37. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Ampliación y Rehabilitación de Cancha Deportiva en Escuela Secundaria Luz María Zaleta de Elsner, Col. Villas del Sol.
38. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Cancha Deportiva en Escuela Primaria Evaristo Segundo, Col. Misión de las Flores.
39. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Cancha Deportiva en Escuela Secundaria Tec. 40 Congreso Constituyente de 1974, en el Municipio de Solidaridad.
40. Construcción de Techado en Área de Impartición de Educación Física y Ampliación y Rehabilitación de Cancha Deportiva en Escuela Primaria Eduardo Priego León, Col. Zazil-ha.
41. Construcción de la Pavimentación de la Av. 34 norte entre la Av. 75 y la Av. 105 del Municipio de Solidaridad.
42. Construcción de la Pavimentación en 95 av. y 100 av. entre Constituyentes y calle 36 norte, en la Colonia Ejido Sur en el Municipio de Solidaridad.
43. Rehabilitación y Ampliación al Centro de Salud Luis Donald Colosio del Municipio de Solidaridad.
44. Construcción de Comedor Comunitario en el Centro de Desarrollo Comunitario El Peten.
45. Construcción de Nichos en el Panteón Municipal de la Colonia Luis Donald Colosio de Playa del Carmen.
46. Construcción de Subestación Eléctrica de 112.5 KVA para el Centro de inteligencia y monitoreo urbano de Solidaridad (CIMUS)
47. Construcción de Parque Infantil en Calle Segarra, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen.
48. Construcción de Parque Infantil en Calle Tarragona, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen.



49. Construcción de Espacio Deportivo en Av. Tumben Kin, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen.
50. Rehabilitación de las instalaciones del CEBIAM en la Colonia Ampliación Bellavista, en el Municipio de Solidaridad.
51. Pavimentación de la Av. 90 Norte entre Av. Sur y Calle 36 del Municipio de Solidaridad.
52. Rehabilitación del Edificio C4, en las Instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Municipio de Solidaridad, Primera Etapa.
53. Construcción de Paradero en la Av. Universidades y Av. Paseos del Mayab, Playa del Carmen.
54. Programa de Mejoramiento a la Vivienda.
55. Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 283, Playa del Carmen - Tulum.
56. Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 302, Playa del Carmen – Cancun.
57. Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 8.5, Playa del Carmen – Tintal.
58. Elaboración de Proyecto Integral, para la Plaza 28 de Julio en Playa del Carmen.
59. Habilitación de Oficinas para la Contraloría en el Nuevo Palacio Municipal.
60. Construcción acceso a Playa Inclusiva Pelicanos.

Representando un avance del 109.09%

Resultados Actividad 1: Se integran y validan, durante el 4to. trimestre, 09 proyectos ejecutivos, de acuerdo a lo siguiente:

Inversión Programada con Recursos Fiscales:

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Beneficiados
1. Construcción de Paradero en la Av. Universidades y Av. Paseos del Mayab, Playa del Carmen.	\$ 3,000,000.00	22,800 habitantes
2. Programa de Mejoramiento a la Vivienda.	\$ 8,378,036.30	555 habitantes
3. Elaboración de Proyecto Integral, para la Plaza 28 de Julio en Playa del Carmen.	\$ 1,750,000.00	333,400 habitantes
4. Habilitación de oficinas para la Contraloría en el Nuevo Palacio Municipal.	\$ 4,700,000.00	333,400 habitantes
5. Construcción acceso a Playa Inclusiva Pelicanos.	\$ 4,844,944.59	333,400 habitantes

Inversión Programada con Recursos Ramo 33 FORTAMUN:

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Beneficiados
6. Pavimentación de la Av. 90 norte entre Av. Sur y Calle 36 del Municipio de Solidaridad.	\$ 8,935,420.00	333,400 habitantes
7. Rehabilitación del Edificio C4, en las Instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Municipio de Solidaridad, Primera Etapa.	\$ 6,000,000.00	333,400 habitantes
8. Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 302, Playa del Carmen - Cancún.	\$ 9,500,000.00	333,400 habitantes
9. Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 8.5, Playa del Carmen - Tintal.	\$ 9,500,000.00	333,400 habitantes



2021-2024

Resultados de la Actividad 2. Se realiza integración de 28 expediente de licitación de obra pública, conteniendo la propuesta técnica, propuesta económica, proyecto ejecutivo, convocatoria, visita de obra, junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, dictamen técnico-económico, acta de fallo, contrato y fianzas correspondientes, para los siguientes:

No.	CON RECURSOS FISCALES
1	Construcción de Comedor Comunitario en el Centro de Desarrollo Comunitario El Peten. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-050-2022 Monto Contrato \$1,495,444.31
2	Construcción de Nichos en el Panteón Municipal de la Colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen N° Contrato HAS-SIyOP-RF-051-2022 Monto Contrato \$709,638.29
3	Construcción de Parque Infantil en Calle Segarra, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-053-2022 Monto Contrato \$ 1,992,940.62

No.	CON RECURSOS FISCALES
4	Construcción de Parque Infantil en Calle Tarragona, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-054-2022 Monto Contrato \$1,991,252.04
5	Construcción de Espacio Deportivo en Av. Tumben Kin, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen No Contrato HAS-SIyOP-RF-055-2022 Monto Contrato \$ 2,465,350.02
6	Construcción de Paradero en la Av. Universidades y Av. Paseos del Mayab, Playa del Carmen. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-059-2022 Monto Contrato \$ 2,999,506.80
7	Programa de Mejoramiento a la Vivienda. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-060-2022 Monto Contrato \$ 8,136,661.03
8	Elaboración de Proyecto Integral, para la Plaza 28 de Julio en Playa del Carmen. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-064-2022 Monto Contrato \$ 1,744,058.03
9	Habilitación de oficinas para la Contraloría en el Nuevo Palacio Municipal. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-065-2022 Monto Contrato \$ 4,697,604.01
10	Construcción acceso a Playa Inclusiva Pelicanos. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-066-2022 Monto Contrato \$ 4,805,599.18



No. CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN	
11	Construcción de Subestación eléctrica de 112.5 kva para el Centro de inteligencia y monitoreo urbano de Solidaridad (CIMUS) Nº Contrato SIyOP-FORTAMUN-052-2022 Monto Contrato \$ 2,965,932.69
12	Rehabilitación de las instalaciones del Cebiam en la Colonia Ampliación Bellavista, en el Municipio de Solidaridad. Nº Contrato SIyOP-FORTAMUN-056-2022 Monto Contrato \$ 11,185,744.07
13	Pavimentación de la Av. 90 norte entre Av. Sur y Calle 36 del Municipio de Solidaridad. Nº Contrato SIyOP-FORTAMUN-057-2022 Monto Contrato \$ 8,934,299.03
14	Rehabilitación del Edificio C4, en las Instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Municipio de Solidaridad, Primera Etapa. Nº Contrato SIyOP-FORTAMUN-058-2022 Monto Contrato \$ 5,983,889.10
15	Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 283, Playa del Carmen - Tulum. Nº Contrato SIyOP-FORTAMUN-061-2022 Monto Contrato \$ 9,490,200.25
16	Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 302, Playa del Carmen – Cancun. Nº Contrato SIyOP-FORTAMUN-062-2022 Monto Contrato \$ 9,498,023.33
17	Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 8.5, Playa del Carmen – Tintal. Nº Contrato SIyOP-FORTAMUN-063-2022 Monto Contrato \$ 9,499,566.37

No. CON RECURSOS RAMO 33 FISM	
18	Rehabilitación de pavimentación de la 115 avenida entre avenida Tumben kin y avenida Mayapan del Municipio de Solidaridad. Nº Contrato HAS-SIyOP-FISM-039-2022 Monto Contrato \$ 9,982,766.66
19	Construcción de 27 pozos de absorción en diferentes puntos en el Municipio de Solidaridad. Nº Contrato HAS-SIyOP-FISM-040-2022 Monto Contrato \$ 2,710,209.92
20	Construcción de techado en área de impartición de educación física y rehabilitación de plaza cívica en escuela Jardín de niños Vicente Suarez, Col. Luis Donaldo Colosio. Nº Contrato HAS-SIyOP-FISM-041-2022 Monto Contrato \$ 2,062,366.15
21	Construcción de techado en área de impartición de educación física y cancha deportiva en escuela Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Col. Villas del Sol. Nº Contrato HAS-SIyOP-FISM-042-2022 Monto Contrato \$ 6,062,635.91
22	Construcción de techado en área de impartición de educación física y ampliación y rehabilitación de cancha deportiva en escuela secundaria Luz María Zaleta de Elsner, Col. Villas del Sol. Nº Contrato HAS-SIyOP-FISM-043-2022 Monto Contrato \$ 5,054,677.86



No. CON RECURSOS RAMO 33 FISM	
23	Construcción de techado en área de impartición de educación física y cancha deportiva en escuela primaria Evaristo Segundo, Col. Misión de las Flores. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-044-2022 Monto Contrato \$ 6,006,428.75
24	Construcción de techado en área de impartición de educación física y cancha deportiva en escuela secundaria Tec. 40 Congreso Constituyente de 1974, en el Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-045-2022 Monto Contrato \$ 5,782,838.74
25	Construcción de techado en área de impartición de educación física y ampliación y rehabilitación de cancha deportiva en escuela primaria Eduardo Priego León, Col. Zazil-ha. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-046-2022 Monto Contrato \$ 4,479,213.49
26	Construcción de la pavimentación de la Av. 34 norte entre la Av. 75 y la Av. 105 del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-047-2022 Monto Contrato \$ 6,174,196.69
27	Construcción de la pavimentación en 95 av. y 100 av. Entre Constituyentes y calle 36 norte, en la colonia ejido sur en el Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-048-2022 Monto Contrato \$ 3,118,344.38
28	Rehabilitación y Ampliación al Centro de Salud Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-049-2022 Monto Contrato \$ 4,620,827.00

Resultados de la Actividad 3. Se realizó la supervisión de las siguientes obras públicas contratadas:

Obras supervisadas durante el 4to. trimestre:

No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				INICIO	TERMINO
1	RECURSO FISCAL	“ELABORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES ESTATALES Y/O FEDERALES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD.”	HAS-SIyOP-RF-001-022	13-abr-22	30-nov-22
2	FORTAMUN	“CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA.”	HAS-SIyOP-FORTAMUN - 007-2022	26-may-22	18-nov-22
3	FORTAMUN	“CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA.”	HAS-SIyOP-FORTAMUN - 008-2022	26-may-22	16-nov-22



No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				INICIO	TERMINO
4	FORTAMUN	“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.”	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 010-2022	01-jun-22	09-oct-22
5	FORTAMUN	“REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.”	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 011-2022	01-jun-22	31-oct-22
6	FORTAMUN	“REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAURA RIOJAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.”	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 012-2022	02-jun-22	31-oct-22
7	RECURSO FISCAL	“REPARACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSOS PUNTOS DE PLAYA DEL CARMEN.”	HAS-SlyOP-RF-015-2022	03-jun-22	30-oct-22
8	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE CREMATORIO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SlyOP-RF-016-2022	13-jun-22	30-sep-22
9	RECURSO FISCAL	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE JUSTICIA CIVICA	HAS-SlyOP-RF-018-2022	08-jul-22	05-oct-22
10	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 019-2022	14-jun-22	11-oct-22
11	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 020-2022	29-jul-22	26-oct-22
12	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 021-2022	04-jul-22	31-oct-22
13	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AV. CTM ENTRE AV. 115 A CARRETERA FEDERAL, Y AV. 115 ENTRE CALLE COBA A AV. SUR DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 022-2022	05-jul-22	01-nov-22
14	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. COLOSIO.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 023-2022	05-jul-22	15-dic-22



No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				INICIO	TERMINO
15	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, SEGUNDA ETAPA.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 024-2022	03-08-22	30-nov-22
16	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE LIRIOS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CAOBA.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 025-2022	18-jul-22	15-sept-22
17	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 026-2022	18-jul-22	14-nov-22
18	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. SUR	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 027-2022	25-jul-22	21-dic-22
19	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA SÚPER MANZANA 075 EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 030-2022	08-agost-22	26-nov-22
20	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LOROS ENTRE AV. CTM Y AV. LUIS D. COLOSIO, FRACC. VILLAS DEL SOL.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 031-2022	08-agost-22	05-nov-22
21	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS.	HAS-SlyOP-RF-032-2022	29-agost-22	27-oct-22
22	FORTAMUN	REPAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA 7 SUR ENTRE AV. 10 Y BOULEVARD PLAYA DEL CARMEN.	HAS-SlyOP-FORTAMUN - 035-2022	04-oct-22	26-dic-22
23	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 80, AV. 85 Y AV. 90 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y AV. 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FISM-036-2022	04-oct-22	26-dic-22
24	RECURSO FISCAL	CONCLUSIÓN DE LA HABILITACIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO MULTICULTURAL DE PLAYA DEL CARMEN 1ERA ETAPA.	HAS-SlyOP-RF-037-2022	04-oct-22	26-dic-22



No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				INICIO	TERMINO
25	FISM	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBENKIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FISM-039-2022	21-oct-22	26-dic-22
26	FISM	CONSTRUCCIÓN DE 27 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIFERENTES PUNTOS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FISM-040-2022	21-oct-22	26-dic-22
27	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA EN ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ, COL. LUIS DONALDO COLOSIO.	HAS-SlyOP-FISM-041-2022	21-oct-22	26-dic-22
28	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR, COL. VILLAS DEL SOL.	HAS-SlyOP-FISM-042-2022	21-oct-22	26-dic-22
29	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARÍA ZALET DE ELSNER, COL. VILLAS DEL SOL.	HAS-SlyOP-FISM-043-2022	21-oct-22	26-dic-22
30	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO, COL. MISIÓN DE LAS FLORES.	HAS-SlyOP-FISM-044-2022	21-oct-22	26-dic-22
31	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA TEC. 40 CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1974, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FISM-045-2022	21-oct-22	26-dic-22



No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				INICIO	TERMINO
32	FISM	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EDUARDO PRIEGO LEÓN, COL. ZAZIL-HA.	HAS-SlyOP-FISM-046-2022	21-oct-22	26-dic-22
33	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 34 NORTE ENTRE LA AV. 75 Y LA AV. 105 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FISM-047-2022	21-oct-22	26-dic-22
34	FISM	CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN 95 AV. Y 100 AV. ENTRE CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE, EN LA COLONIA EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FISM-048-2022	21-oct-22	26-dic-22
35	FISM	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SlyOP-FISM-049-2022	21-oct-22	26-dic-22
36	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL PETEN.	HAS-SlyOP-RF-050-2022	21-oct-22	26-dic-22
37	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL PANTEÓN MUNICIPAL DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE PLAYA DEL CARMEN.	HAS-SlyOP-RF-051-2022	14-oct-22	12-nov-22
38	FORTAMUN	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA PARA EL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO URBANO DE SOLIDARIDAD (CIMUS)	HAS-SlyOP-FORTAMUN-052-2022	14-oct-22	26-dic-22
39	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN CALLE SEGARRA, FRACCIONAMIENTO CATALUÑA II, PLAYA DEL CARMEN.	HAS-SlyOP-RF-053-2022	31-oct-22	26-dic-22
40	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN CALLE TARRAGONA, FRACCIONAMIENTO CATALUÑA II, PLAYA DEL CARMEN	HAS-SlyOP-RF-054-2022	31-oct-22	26-dic-22



No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN	
				INICIO	TERMINO
41	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN AV. TUMBEN KIN, FRACCIONAMIENTO CATALUÑA II, PLAYA DEL CARMEN.	HAS-SIyOP-RF-055-2022	31-oct-22	26-dic-22
42	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEBIAM EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-056-2022	11-nov-22	26-dic-22
43	FORTAMUN	PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 90 NORTE ENTRE AV. SUR Y CALLE 36 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-057-2022	21-nov-22	26-dic-22
44	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO C4, EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, PRIMERA ETAPA.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-058-2022	21-nov-22	26-dic-22
45	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO EN LA AV. UNIVERSIDADES Y AV. PASEOS DEL MAYAB, PLAYA DEL CARMEN.	HAS-SIyOP-RF-059-2022	21-nov-22	26-dic-22
46	RECURSO FISCAL	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.	HAS-SIyOP-RF-060-2022	28-nov-22	27-dic-22
47	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FILTRO POLICIACO CARRETERA FEDERAL KM 283, PLAYA DEL CARMEN - TULUM.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-061-2022	30-nov-22	27-dic-22
48	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FILTRO POLICIACO CARRETERA FEDERAL KM 302, PLAYA DEL CARMEN - CANCUN.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-062-2022	30-nov-22	27-dic-22
49	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE FILTRO POLICIACO CARRETERA FEDERAL KM 8.5, PLAYA DEL CARMEN - TINTAL.	HAS-SIyOP-FORTAMUN-063-2022	30-nov-22	27-dic-22
50	RECURSO FISCAL	ELABORACIÓN DE PROYECTO INTEGRAL, PARA LA PLAZA 28 DE JULIO EN PLAYA DEL CARMEN.	HAS-SIyOP-RF-064-2022	19-dic-22	30-dic-22
51	RECURSO FISCAL	HABILITACIÓN DE OFICINAS PARA LA CONTRALORIA EN EL NUEVO PALACIO MUNICIPAL.	HAS-SIyOP-RF-065-2022	19-dic-22	30-dic-22
52	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN ACCESO A PLAYA INCLUSIVA PELICANOS.	HAS-SIyOP-RF-066-2022	19-dic-22	30-dic-22




Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 2021 - 2024



Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

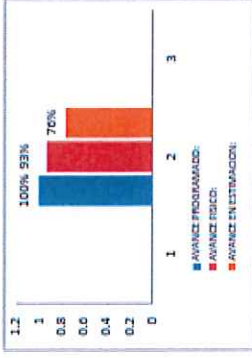

CONVENIO: MAS-SICOP-FORTAMUN-005-2022
FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 100%
AVANCE FISICO: 93%
AVANCE EN ESTIMACION: 76%
FECHA DE INICIO: 20 de junio de 2022
FECHA DE TERMINO: 17 de octubre de 2022
MONTO DE CONVENIO: \$3,342,405.40

CONTRATO: OBRAS DE CONSTRUCCION DE 30 POZOS DE ABSORCION EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA.
FECHA INICIO: 24 DE MAYO DE 2022
FECHA TERMINO: 22 de SEPTIEMBRE de 2022
MONTO DE \$ 5,342,405.40
CONTRATO:
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: MORH PERFORACIONES, S. DE R.L. DE C.V.

ETAPA DE LA OBRA
LA EMPRESA TRABAJA EN LOS CAPTADORES PLUVIALES
OBSERVACIONES:

Table with columns: PARTIDAS, ALCANCES, CANTIDAD, EJECUTADO, UNIDAD, AVANCE DE LA OBRA %





H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: HAS-SIYOP-FORTAMUN-012-2022

OBRA: Rehabilitación del Mercado Municipal Diana Laura Rojas en la colonia Luis Donaldo Colásio.


FECHA INICIO: 02 de junio de 2022

FECHA TERMINO: 20 de Septiembre de 2022

MONTO DE \$ 2,995,712.81

CONTRATO: PLAZA DEL CARMEN SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES S. DE RL DE CV.

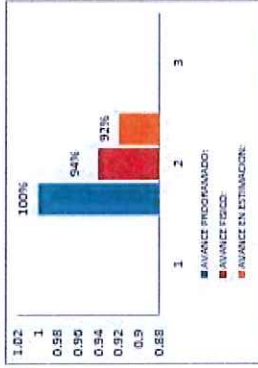

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 100%

AVANCE FÍSICO: 94%

AVANCE EN ESTIMACIÓN: 92%

FECHA DE INICIO: 02 DE JUNIO 2022

FECHA DE TERMINO: 17 DE OCTUBRE DE 2022

MONTO DE CONVENIO: \$2,995,712.81

FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO 2022

FECHA DE TERMINO: 31 DE OCTUBRE DE 2022

MONTO DE CONVENIO: \$3,695,772.80

ETAPA DE LA OBRA

OBSERVACIONES:

SE REALIZAN TRABAJOS DE APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE LOS LOCALES EN PLANTA BAJA

PARTIDAS	CANTIDAD	E EJECUTADO	UNIDAD
PRELIMINARES			
COLOCACION D EPROTECCION DE HERRERIA PARA TOMA DE AGUA	7	100%	PZA
DESMANTEAMIENTO DE TANQUES DE GAS ESTACIONARIO	18	100%	PZA
DESMANTEAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE	240	100%	ML
DEMOLICION DE BASES	60	100%	PZA
REPARACION DE FIEURAS EN MUROS	100	100%	ML
SANTABARO CABALLEROS			
DESMANTEAMIENTO DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
DESMANTEAMIENTO DE WC	2.00	100%	PZA
COLOCACION DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
RECUBRIMIENTO PARA MIESETA	0.96	100%	M2
COLOCACION DE PISO	10.50	100%	M2
SANTABARO DAMAS			
DESMANTEAMIENTO DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
DESMANTEAMIENTO DE WC	3.00	100%	PZA
COLOCACION DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
COLOCACION DE WC	3.00	100%	PZA
COLOCACION DE PISO	10.50	100%	M2
RECUBRIMIENTO PARA MIESETA	0.96	100%	M2
COLOCACION DE COLADERA	1.00	100%	PZA
HABILITACION DE LOCALES PLANTA ALTA			
REPARACION DE RANURAS EN FIRME	342.84	100%	ML
IMPERMEABILIZACION			
RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE	2707.18	100%	M2
IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA	2707.18	100%	M2
LOSAS			
COLADO DE TRABE DE 15 X 30 CM	78.47	100%	M2
COLADO DE TRABE DE 30 X 60 CM	12.07	100%	M2
LOSA DE YIGUETA Y BOVEDILLA	56.41	100%	M2
LOSA ARMADA	24.10	100%	M2



Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: MAS-SOP-0021-MUN-015-2022
OBRAS: Rehabilitación de parques para actividades de recreación y construcción en el Municipio de Solidaridad


FECHA INICIO: 14 de Julio de 2022

FECHA TERMINO: 11 de Octubre de 2022

MONTO DE \$ 7,488,132.64

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V.



FECHA DE REPORTE: 22 de Septiembre de 2022

AVANCE REAL: 100%

AVANCE PROGRAMADO: 44%

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

MONTO DE CONTRATO:



ETAPA DE LA OBRA			
PARTIDAS	ALCANCES	CANTIDAD	SECUENCIA UNIDAD
COLOCACION DE JUEGO INFANTIL EN EL PARQUE NICTE IMA			
PARQUE NICTE IMA			
RETIRO DE GRAMA EN PALAPA	C5	100%	M2
REHABILITACION DE PALAPA	7	100%	PZA
REHABILITACION DE CERCAS	8	100%	M
APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DE FUTBOL	2064.40	100%	M2
RETIRO DE ASFALTO	8	100%	M2
RETIRO DE TUBERIA EN DRENA COLECTOR	30	100%	M
RETIRO DE GRAMA EXISTENTE EN DRENA COLECTOR	0.07	100%	M2
REHABILITACION DE CERCAS	7	100%	PZA
REHABILITACION DE PISO DE REGADERON	1	100%	PZA
COLOCACION DE LAVANDIO	1	100%	PZA
COLOCACION DE CENTRO DE CARGA	7	100%	PZA
COLOCACION DE POCILLO	7	100%	PZA
CONTRATOS	4	100%	PZA
PARQUE EL PITEN			
RETIRO DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL	500	100%	M2
RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA CICLOFONA	38.40	100%	M2
RECONSTRUCCION DE GUARNICION	22.50	100%	M
CORTE EN PISO DE CONCRETO	42.50	100%	M
REHABILITACION DE MANTENIMIENTO B	4.38	100%	M
REHABILITACION DE MANTENIMIENTO B	4.38	100%	M
CANCHA DE ESPALANTE	40.50	100%	M
CANTILLOS DE CONCRETO	12.40	100%	M
MARCO DE BLOCK	86.28	100%	M2
APLICACION DE PINTURA EN TUBOS	200.08	100%	M2
REHABILITACION DE CALLE JOZEBERTO			
REHABILITACION DE CALLE JOZEBERTO	42.00	100%	M
RETIRO DE CANALON EXISTENTE	62.00	100%	M
RETIRO DE PASTO SINTETICO EXISTENTE	218.40	100%	M2
RETIRO DE MALLA CICLOFONA	173.40	100%	M2
REHABILITACION DE ALBISABAZO	4.00	100%	M2
COLOCACION DE PANTALLA	650.30	100%	M2
LIMPIEZA EN PISO DE CANCHA	650.30	100%	M2
APLICACION DE PINTURA EN CANCHA DE JUGOS MULTIPLES	500.30	100%	M2
COLOCACION DE LIMPIABUQUE EN AREA DE JUEGOS	5.00	100%	PZA
PARQUE LAZARO CARDENAS			
RETIRO DE MALLA CICLOFONA	387.00	100%	M2
RETIRO DE PASTO SINTETICO	1167.48	100%	M2
RETIRO DE PASTO SINTETICO EN BASASNDAL	28.00	100%	M2
DESMANTEAMIENTO DE MALLA CICLOFONA	242.25	100%	M2
REHABILITACION DE MANTENIMIENTO B	11.25	100%	M2
REHABILITACION DE PALAPA	1.00	100%	PZA
PARQUE LAZARO CARDENAS			
DESMANTEAMIENTO DE MALLA CICLOFONA	174.00	100%	M2
RETIRO DE PILDOR LATERAL	37.00	100%	M
REHABILITACION DE MANTENIMIENTO B	2.00	100%	M2
COLOCACION DE ESTRUCTURA PARA PORTERAS	2.00	100%	PZA
COLOCACION DE MALLA CICLOFONA EN CANCHA DE	272.88	100%	M2
COLOCACION DE TABLEROS EN CANCHA DE JUGOS	2.00	100%	PZA
APLANADOS EN MURDOS EN SANTIFEROS	20.94	100%	M2
COLOCACION DE COLADERAS	2.00	100%	PZA

[Handwritten signature]




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

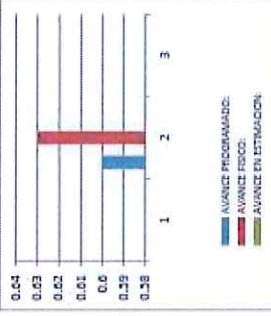

27 de diciembre de 2024
00.00%
03.00%

AVANCE PROGRAMADO:
AVANCE FÍSICO:
AVANCE EN ESTIMACIÓN:

CONTRATO: MAS-SYOP-FORTAMUN-021-2022
OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 A LA AVENIDA 125 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

MONTO DE \$6,481,820.03 IVA INCLUIDO
CONTRATO: LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: INTERMAYA DEL CARIBE, S.A DE CV

ETAPA DE LA OBRA


FOTOGRAFIAS

ENTRERAS, SEÑALÉTICA VERTICAL Y HORIZONTAL

OBSERVACIONES:

SE FINALIZA CON TODO EL COLLADO DE BANQUETAS, SE PROCEDE A PINTAR Y POSTERIORMENTE A COLOCAR LOS SEÑALAMIENTOS VERTICALES.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO	5,268.80	2.00%	M2
GUARNICION RECTA 15X20X30 CM	767.60	3.24%	ML
SUMINISTRO DE MATERIAL	366.33	15.00%	M3
BANQUETA DE CONCRETO FREMEZCLADO	4,370.42	26.09%	M2
GUARNICION BAJA 15X20X10 CM	16.40	0.05%	ML
CONSTRUCCION DE RODAPIE	2,399.91	6.00%	ML
CORTE DE MATERIAL C	373.35	2.06%	M3
CORTE MATERIAL B	183.49	0.89%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL SASCAB	260.57	4.15%	M3

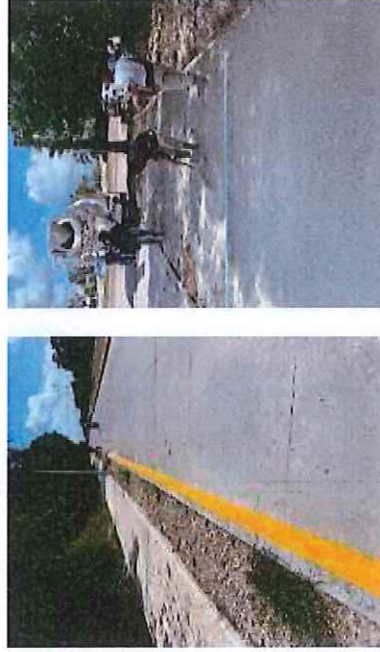

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

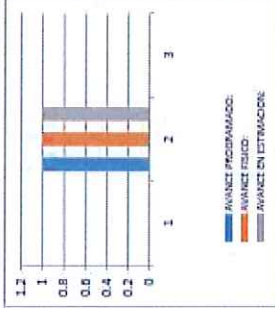

FECHA DE REPORTE: 27 de Septiembre de 2024
AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
AVANCE FÍSICO: 100.00%
AVANCE EN ESTIMACIÓN: 100.00%

CONTRATO: PAS-SJOP-FORTAMUN-023-2022
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y RAMQUETAS DEL A.V. CTM ENTRE AV. 115
A CARRETERA FEDERAL Y AV. 115 ENTRE CALLES COBA A AV. SUR DEL
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

MONTO DE CONTRATO: \$7,151,693.74 IVA INCLUIDA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: MOVIMIENTO INGENIERARIA SA DE CV

ETAPA DE LA OBRA

FOTOGRAFÍAS



LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA SIGUIENTE

OBSERVACIONES:

SE TERMINAN TRABAJOS


CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	7,750.00	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	121.00	100.00%	M3
CORTE DE MATERIAL TIPO C	13.44	100.00%	M3
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO	1,251.00	100.00%	M3
BANQUETA DE CONCRETO	6,235.00	100.00%	M2
RODAPIE 20 CM	1,032.00	100.00%	ML
GUARNICION	2,316.00	100.00%	ML
PINTURA GUARNICION	2,316.00	100.00%	ML
CICLOVIA	2,684.00	100.00%	M2
EXCAVACION DE ZANJA	356.71	100.00%	ML
SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO	356.71	100.00%	ML
CABLE	293.71	100.00%	ML
REGISTROS	13.00	100.00%	PZA
LETRERO	5.00	100.00%	PZA
ROTULADO DE MINUSVALIDOS	32.94	100.00%	MIV
LOSA TAPA	16.44	100.00%	MIV
TAPAS CIEGAS	10.00	100.00%	PZA





Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 Y OBRAS PÚBLICAS
 PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
 2021 - 2024

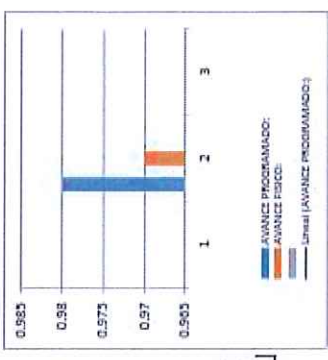

CONTRATO: HAS-SyOP-FORTAMUN-023-2022

OBRA: PAVIMENTACION DE CARPETA ASEALTIMA DE LA AV. DISG. GI ENTRE CTM Y AV. COLOSADO.

FECHA INICIO: 5 DE JUNIO DE 2022

FECHA TERMINO: 29 DE JUNIO DE 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 29,968,358.18 IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 97.00%

AVANCE FÍSICO: 97.00%

AMPLIACION: \$ 6,638,793.03

MONTO DEFINITIVO DE OBRA: \$ 36,607,151.21

ETAPA DE LA OBRA

PRELIMINARES

OBSERVACIONES:
 SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CAMELLO Y CARRILES DE 20X20X40 Y CONSTRUCCION DE GUARNICION PARA BANQUETAS DE 15X20X20. SE ESTAN REALIZANDO TAMBIEN EL COLADO DE BANQUETAS.
 SE HA INICIADO EL SUMINISTRO Y AFUCCION DE PINTURA TERMOPLASTICA, DIVIDIENDO LOS CARRILES Y EL AREA DE CICLOVIA, SE REALIZA AFUCCION DE PINTURA EN GUARNICIONES DEL CARRIL "A".

CONCEPTOS	CANTIDAD	%
I PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 4.45 C.M. DE FORTA CTM Y AV. COLOSADO	\$ 31,376,163.98	97.0%
II PAVIMENTACION	\$ 19,437,135.22	75.0%
III POZOS DE ABSORCION	\$ 555,282.48	2.0%
IV GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMELLO	\$ 3,415,822.41	9.0%
V AREA VERDE	\$ 128,828.73	1.0%
VI ALUMBRADO	\$ 2,318,800.56	8.0%
VII EXTRAORDINARIOS	\$ 5,723,096.58	2%
TOTAL	\$ 36,607,151.21	97.0%

FOTOGRAFIAS





H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

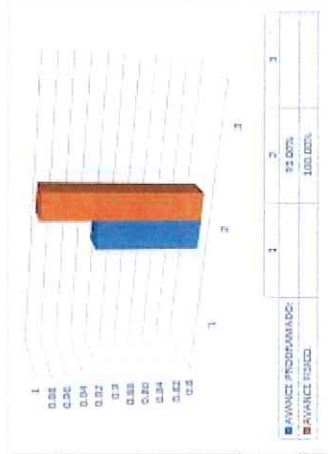



CONTRATO: SYOP-FORTAMUN-024-2022
FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA".
AVANCE PROGRAMADO: 92.00%
AVANCE FÍSICO: 100.00%

CONVENIO: HAS-SYOP-FORTAMUN-024-2022
FECHA INICIO: 03 DE AGOSTO DEL 2022
FECHA TERMINO: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022
REPROGRAMACION: IVA INCLUIDO

FECHA INICIO: 10 DE JULIO DEL 2022
FECHA TERMINO: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022
MONTO DE CONTRATO: \$3,980,573.99
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
EMPRESA: MARI WOOD STUDIO S.A DE C.V.

ETAPA DE LA OBRA: PASO PEATONALES Y PRELIMINARES

FOTOGRAFÍAS

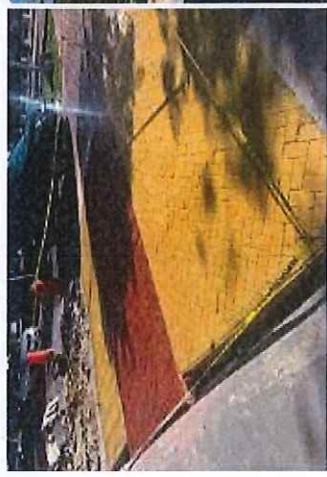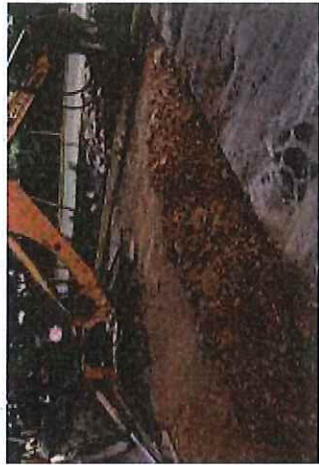

SE CONCLUYEN 11 PASOS PEATONALES, SE REALIZA SELLADO EL ÚLTIMO PASO PEATONAL COLADO.

ALCANCES			
CONCEPTOS	CLAVE	CANTIDAD	% AVANCE
PRELIMINARES	A	6.00%	6.00%
PASO PEATONAL	B	27.00%	56.00%
SEÑALIZACIÓN	C	7.00%	1.00%
TOTAL		100%	63%




Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas



CONVENIO:
FECHA INICIO:
FECHA DE TERMINACION:

CONTRATO: HAS-SIYOP-FORTAMUN-025-2022
OBRA: PAVIMENTACION DE CARPETA ASFALTICA EN LA CALLE LIROS ENTRE CALLE CEIBA Y CALLE CAOBA

FECHA DE REPORTE: 22 DE DICIEMBRE DE 2022
AVANCE PROGRAMADO: 100%
AVANCE FISICO: 100%
AVANCE EN ESTIMACION: 60%

FECHA INICIO: 18 DE JULIO DE 2023
FECHA TERMINO: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MONTO DE CONTRATO: \$ 1,397,028.22
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: JOSE FRANCISCO HERRERA Y PECH

FOTOGRAFIAS



ETAPA DE LA OBRA
LIMPIEZA FINAL DE OBRA

OBSERVACIONES:

OBRA TERMINADA

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION		100%	M2
DESMONTE DE TERRENO		100%	M2
DESPLAZO DE TERRENO		100%	M2
CORTE EN MATERIAL TIPO B		100%	M3
CORTE EN MATERIAL TIPO C		100%	M3
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO		100%	M3
FORMACION DE TERRACERIAS		100%	M2
RIEGO DE IMPREGNACION		100%	M2
COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 7 CM ESP.		100%	PZA
ELABORACION DE FOSOS DE ABSORCION		100%	M/L
GUARNICIONES Y BANQUETAS		100%	M/L
PINTURA EN VIALIDAD		100%	M/L



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

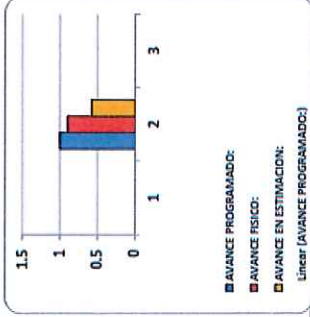

FECHA DE REPORTE: 27 de noviembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
AVANCE FÍSICO: 50.00%
AVANCE EN ESTIMACIÓN: 50.00%
FECHA DE INICIO: 18 DE JULIO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE 2022

CONTRATO: IAS-SINOP-FORTAMUN-026-2022
OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

MONTO DE \$9,808,108.20 IVA INCLUIDO
CONTRATO: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
LOCALIDAD: BASE CUATRO, S.A. DE C.V.
EMPRESA:

FOTOGRAFÍAS



ETAPA DE LA OBRA

EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

REALIZAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y TRABAJOS DE TERRACERIAS EN LA AVENIDA 75 ENTRE CALLE 36 NORTE Y AVENIDA SUR, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION	6,227.00	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	747.00	100.00%	M3
CORTE DE MATERIAL TIPO C	297.00	100.00%	M3
TRAPE Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACIONES	6,000.00	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL	1,138.00	100.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	1,138.00	100.00%	M3
GUARNICIONES DE GUARNICION RECTA 15X20X30 CM	1,548.99	100.00%	ML
SUMINISTRO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO PARA BANQUETA	256.06	100.00%	M3
DEMOLICION DE BANQUETAS EXISTENTES DE CONCRETO.	67.95	100.00%	M2
BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO	3,095.00	100.00%	M2
CONSTRUCCION DE RODAPIE DE 20 CMS	219.32	100.00%	ML
GUARNICIONES DE GUARNICION RECTA 15X20X10 CM	21.01	100.00%	ML



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

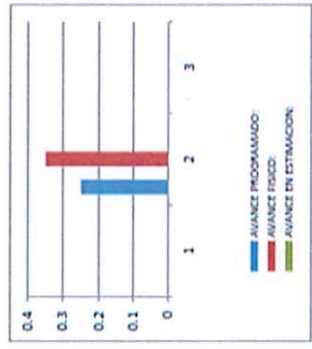

CONTRATO: 1045-SYOP-FORTAMUN-027-2022
 OBRA: PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DIAG. 65 ENTRE AV. CTM Y AV. SUR.
 AVANCE PROGRAMADO: 25.00%
 AVANCE FISICO: 35.00%
 AVANCE EN ESTIMACION: 0.00%

MONTO DE \$22,026,364.87 IVA INCLUIDO
 CONTRATO: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: ELECTRIFICACIONES Y PROYECTOS DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.

ETAPA DE LA OBRA FOTOGRAFÍAS

SUMINISTRO DE MATERIALES

OBSERVACIONES:

LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO TANTO DE SUBRASANTE COMO BASE HIDRAULICA. AMBOS SUMINISTROS SE CONFORMARON Y SE COMPACTARON PARA QUE EL TERRENO SEA ESTABLE. DE IGUAL MANERA AGUAMAN YA SE ENCUENTRA TRABAJANDO EN LO QUE SERA EL DRENAJE Y AGUA POTABLE.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO	6,003.00	0.36%	M2
DESPLAZO EN TERRENO URBANO	11,319.00	0.76%	ML
DESMONTE EN TERRENO URBANO	6,650.00	0.10%	M2
CORTE DE MATERIAL TIPO B	284.96	4.00%	M3
CORTE DE MATERIAL TIPO C	1,965.23	4.26%	M3
SUMINISTRO EN GREÑA	1,316.43	3.65%	M3
FORMACION MATERIAL EN GREÑA	1,316.43	0.87%	M3
SUMINISTRO DE CEMENTANTE	1713.00	11.00%	M3
FORMACION DE CEMENTANTE	1713.00	1.10%	M3





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: MAS-SDO-POSTAMUN-330-3022
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE GUARDERÍAS Y BANQUETAS EN LA SUPERMANZANA 053
CALLE MANCADO DE SOLIDARIDAD

MONTO DE \$ 4728,871.28 DOLIBULLIDO
CONTRATO: PLAZA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTANA ROO
LOCALIDAD: CONSTRUCCIÓN DE MAS-SDO
EMPRESA: CONSTRUCCIONES MARI SE DE CV

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2023
AVANCE PROGRAMADO: 50.00%
AVANCE FÍSICO: 50.00%
AVANCE EN ESTIMACIÓN: 50.00%

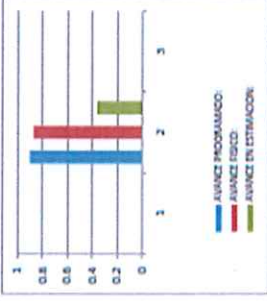

FOTOGRAFÍAS



LA OBRA SE ENCUENTRA EN MANO DE OBREROS Y GUARNICIONES

OBSERVACIONES:


SE REALIZA TRABAJOS PARA UN ESTACIONAMIENTO EN EL BMS

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
DESPLAZO	2,333.76	50.00%	M2
TRAZO	2,333.76	50.00%	M2
EXCAVACION	446.75	50.00%	M3
CORTE EN C	469.15	50.00%	M3
RELLANO	834.51	100.00%	M3
BANQUETAS	1,791.79	50.00%	M2
FOGAPE	972.89	50.00%	ML
GUARNICIONES	1,497.08	50.00%	ML

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

CONTRATO: HAS-SIOP-FORTAMUN-031-2022
 OBRA: PAVIMENTACION DE AVENIDA LOROS ENTRE AV. CTM Y AV. LUIS D. COLOSIO, FRACC. VILLAS DEL SOL
 MONTO DE \$7,159,363.45 IVA INCLUIDO
 CONTRATO: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: INNOVACION DISEÑO Y VANGUARDIA EN CONSTRUCCION DEL CARIBE, S.A DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
 AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
 AVANCE EN ESTIMACION: 100.00%
 FECHA DE INICIO: 08 DE AGOSTO 2022
 FECHA DE TERMINACION: 05 DE NOVIEMBRE 2022

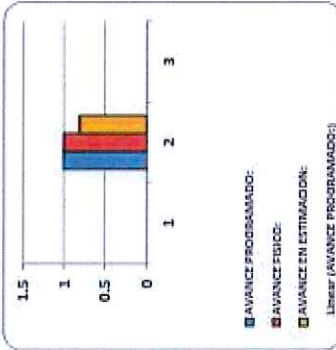


ETAPA DE LA OBRA **FOTOGRAFIAS**

EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

REALIZAN TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO Y TRABAJOS DE TERRACERIAS EN SITIO. CORTES EN B Y CORTES EN C.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION	10,553.01	100.00%	M2
ESCARIFICADO DE TERRENO EXISTENTE	6,134.14	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA DE MATERIAL TIPO B DE MATERIAL TIPO B	801.11	100.00%	M3
CORTE DE MATERIAL TIPO C	495.91	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE	2,085.00	100.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE BASE	2,085.00	100.00%	M3
REGO DE IMPREGNACION A BASE DE EMULSION	5,311.69	100.00%	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA	5,311.69	23.00%	M2

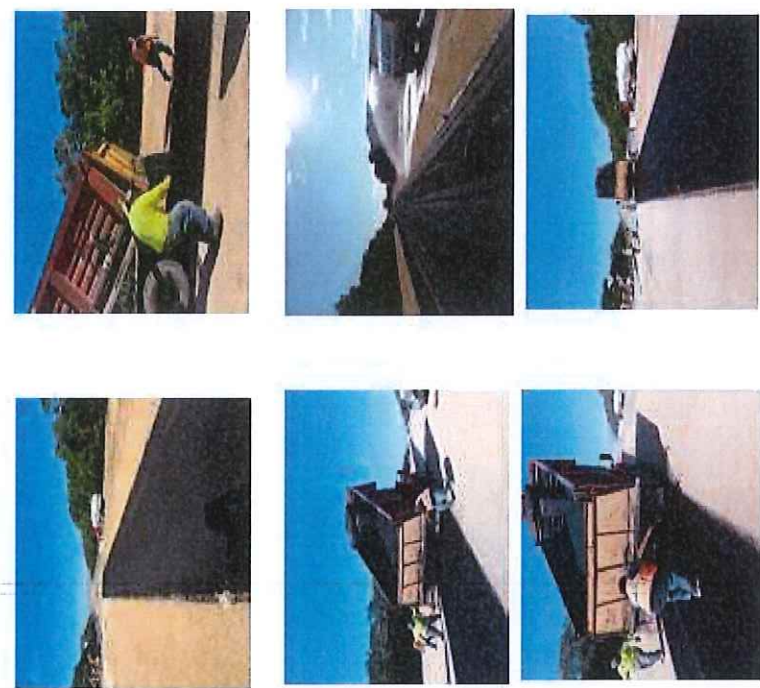



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

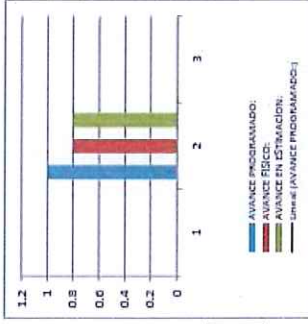

CONVENIO MODIFICATORIO: N/A INCLUIDO
 MONTO DE CONVENIO: N/A INCLUIDO
 FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2022
 FECHA DE TERMINO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
 AVANCE EN ESTIMACIÓN: 80.00%
 AVANCE FÍSICO: 80.00%
 AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
 FECHA DE REPORTE: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

CONTRATO: MAS-SINOP-BOBTAMUR-5032-2022
 OBRA: "Construcción de acceso a la localidad de Puerto Aventuras"
 FECHA INICIO: 08 DE AGOSTO DE 2022
 FECHA TERMINO: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
 MONTO DE CONTRATO: \$ 2,999,948.67 IVA INCLUIDO
 LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: CONSTRUCTORA INMAUSUR SA DE CV

ETAPA DE LA OBRA



ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS

OBSERVACIONES:

SE CONTINUAN LOS TRABAJOS EN EL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS. SE REALIZAN LOS ACABADOS EN LOS MUROS DE LOS ELEMENTOS QUE SOPORTARAN LA ESTRUCTURA. SE REALIZARON LOS CORTES EN LAS BANQUETAS Y SE DETALLAN LOS ACABADOS EN LA ESTRUCTURA METALICA SE TRABAJA EN LOS ARRIADOS DE LAS PERGOLAS Y EN LA INSTALACION DE LA VIGA MADRINA.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
ACCESO A PUERTO AVENTURAS			
A PRELIMINARES		100%	
B CIMENTACION		100%	
C ESTRUCTURA		90%	
D ALBAÑILERIA		90%	
E HERRERIA		90%	
F INSTALACION ELECTRICA		80%	
G TERRACERIAS		90%	
H GUARNICIONES Y BANQUETAS		80%	
I PASO PEATONAL		0%	
J ACABADOS Y SEÑALIZACION		0%	

FOTOGRAFIAS





H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: HAS-SYOP-FORTAMUN-935-2022
OBRA: Repavimentación de la avenida 7 sur entre av. 10 y Boulevard Playa del Carmen.

MONTO DE \$7,997,333.35 IVA INCLUIDO
CONTRATO: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
LOCALIDAD: GRUPO MAS RENOVACION CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

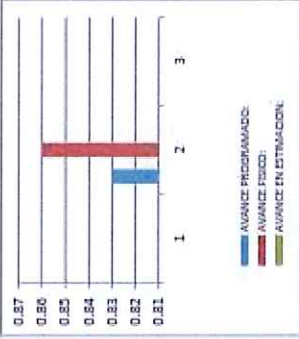

27 de diciembre de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 83.00%

AVANCE FISICO: 86.00%

AVANCE EN ESTIMACION:

ETAPA DE LA OBRA

LA OBRA SE CUENTA EN ETAPA DE SUMINISTRO DE CARPETA.

OBSERVACIONES:

SE CONTINUA CON EL SUMINISTRO DE LA CARPETA ASFALTICA. SE AVANZA EN AMBOS CARRILES PARA DEJAR ABIERTO AL TRANSITO Y NO PERJUDICAR EL FLUJO DE LOS AUTOS.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y INYELACION	8,067.96	1.79%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL B	1,248.23	5.12%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	897.99	7.44%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	897.99	1.42%	M3
RIEGO DE IMPREGNACION	8,067.96	4.59%	M2
SUMINISTRO DE CARPETA	8,067.96	66.00%	M2





Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 76.18
AVANCE FISICO: 44.91

CONTRATO HAS-SyOP-FISM-036-2022
FECHA INICIO CM: 76.18
FECHA TERMINO CM: 44.91
PLAZO DIAS
MONTO DE CONTRATO \$ 3'325,487.00

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV 86, AV 85 Y AV 90 NTE. ENTRE LA AV
CONSTITUYENTES Y AV 316 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

FECHA INICIO: 4 de octubre de 2022
FECHA TERMINO: 26 de diciembre de 2022
DURACION DE LA OBRA: 84 DIAS
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD Q. ROO
EMPRESA: GEOPEVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

REPORTE DE SUPERVISION

ETAPA DE LA OBRA
CONTINUAN LA CONSTRUCCION DE GUARNICION Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO PARA LAS BANQUETAS, RIEGO DE IMPREGNACION Y POREO EN LA CALLE 85 AV. ENTRE 34 Y CONSTITUYENTES Y ENTRE CALLE 34 Y 36: APLICACION DE CARPETA EN LA C-90 ENTRE 34 Y 36 AV.- SE INICIA RENOVACION DE POSTES DE ALUMBRADO 3 PZ EN C-85 ENTRE LA AV CONSTITUYENTES Y C-36 NT

	CANT	UNID	%
PRELIMINARES			2.20
trazo y nivelacion	200	ML	1.24
escarificado	200	M2	0.95
sondeos			0.07
TERRACERIAS			14.19
excav en caja ml 6	36.45	M3	3.35
sum ml banco	405	ML	9.3
form y como terracerias	20.25	M3	1.54
PAVIMENTOS			35.95
letra de impregnacion	2202.49	m2	1.7
aplic de carpeta asfalt	2202.49	M2	34.25
BANQUETAS Y GUAR			47.6
rodapie bleed, 13x20x40	491.91	ML	3.64
guarnicion recta 200	207.29	ML	2.00
guarnicion curva	133.05	ml	0.65
sum ml banco	24.33	ml	0.20
sum ml banco	84.02	m3	1.00
barras conoz pre 13x18 cm	560.11	m2	5.1
pern enarrils trafico micro	423.27	ml	0.79
conoz rampas	46.95	m2	1.40
pern termoplastica disconti	106.77	ml	0.19
pern termoplastica continua	571.3	ml	1.03
pern termoplast asos seat	592.2	ml	2.64
Perf de pozos			13.76
Captadores	6	PZ	0.21
Señalamientos alto	12	PZ	1.40
Recpe tomas domesticas	10	PZ	0.17
sum y sembrado palmetas	8	PZ	0.73
			100
			44.91



04 al 31-10	01 al 30-11	01 al 30-12
30.04	39.87	29.49
30.04	70.51	100.00
30.04	70.51	77.52
30.04	38.14	44.91

AV PROGRAMADO 29.49
AV ACUMULADO 100.00
AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA 77.52
AVANCE REAL EJECUTADO 44.91



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

CONTRATO: **M&S/02020-2022**

OBRA: **Construcción de la rehabilitación del Museo Interactivo Multicultural de Playa del Carmen Tercer Fase**


FECHA INICIO: **04 de Octubre de 2022**

FECHA TERMINO: **10 de Diciembre de 2022**

MONTO DE CONTRATO: **\$ 4,723,463.43**

LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

EMPRESA: **DEL CONSTRUCCIONES EXCELSIS, S.A. DE C.V.**



FECHA DE REPORTE: **27 de Septiembre de 2022**

AVANCE PROGRAMADO: **02%**

AVANCE FÍSICO: **37%**

AVANCE EN ESTIMACIÓN: **23%**

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

MONTO DE CONTRATO:

ETAPA DE LA OBRA			
PARTIDAS	ALCANCES	CANTIDAD	RECUPERO UNIDAD
FINES FINANES			
TRABAJO INTERIOR		24	100% M2
CONCRETO EN PISO DE CONCRETO		18.20	100% M2
REPOSICION DE PISO DE CONCRETO		5.76	100% M2
CIERRE Y CUBIERTA			
PAVIMENTACION		5.76	100% M2
PLANTILLA DE CONCRETO		4	100% PZA
BAJOS D-T DE CONCRETO		4.00	100% PZA
APORTE #21		2852.43	100% M3
CIMENTACION		15.21	100% M3
COLUMNAS METALICAS		15.21	100% M3
REPUTURA EN ESTRUCTURA		15.21	100% M3
ACABADOS			
COLOCACION DE MUROS DE TABLONCA		370.14	100% M2
COLOCACION DE MUROS DE DUREX		436.58	100% M2
COLOCACION DE PLAFON		371.96	100% M2
APLICACION DE PINTURA EN MUROS		804.18	30% M2
COLOCACION DE PISO		242.14	100% M2
COLOCACION DE PISO ANTI-DEFORMANTE		21.00	30% M2
CANCELERIA		15.60	100% M2
ILUMINACION Y CONTACTOS INTERIOR			
COLOCACION DE LUMINARIOS PANEL LED		24.00	100% PZA
COLOCACION DE REFLECTOR PARA PIEL		88.00	100% PZA
COLOCACION DE LUMINARIA LED PARA ALUMINUMAS		37.00	100% PZA
LUMINARIA EMPOTRABLE EN PLAFON		8.00	100% PZA
INSTALACION DE TRILLES		88.00	100% M2
INSTALACION DE PIEL		24.00	100% M2
SALIDAS ELECTRICAS PARA ILUMINACION		312.00	100% SAL
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO		46.00	100% SAL
ALIMENTADORES			
BANOS DE ESCUPOS		44.70	20% M2
AREAS ACONDICIONADAS			
COLOCACION DE AREAS ACONDICIONADAS		12.00	100% PZA



Avenida C. T. M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

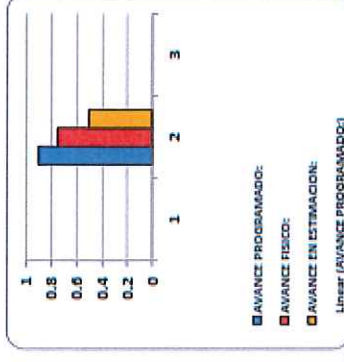

CONTRATO: HAS-SVOP-FISM-039-2022

OBRA: REHABILITACION DE PAVIMENTACION DE LA 115 AVENIDA ENTRE AVENIDA TUMBEN KIN Y AVENIDA MAYAPAN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD*

MONTO DE \$9,982,766.66 IVA INCLUIDO
CONTRATO: PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.
EMPRESA: CONSTRUCTORA RIVAL S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 90.00%
AVANCE FÍSICO: 75.00%
AVANCE EN ESTIMACION: 50.00%
FECHA DE INICIO: 21 DE OCTUBRE 2022
FECHA DE TERMINACION: 26 DE DICIEMBRE 2022

FOTOGRAFÍAS

ETAPA DE LA OBRA

EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION	10,225.46	100.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA DE MATERIAL TIPO B	3,044.96	75.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO	2,331.00	75.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION	2,331.00	75.00%	M3
RIEGO DE LIGA	10,225.45	90.00%	M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA	10,225.45	90.00%	M2





H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

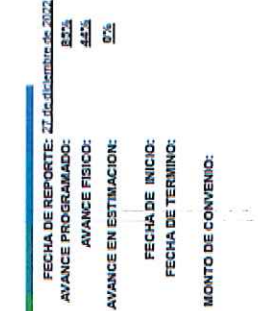

CONTRATO: HAS-SWOP-FSM-043-2023
 OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y AMPLIACION Y REMANEJADO DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA LUZ MARIA ZALETZA DE EISNER, COL. VILLAS DEL SOL.
 FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA TERMINO: 20 DICIEMBRE DE 2022
 MONTO DE \$ 5,054,677.86
 LOCALIDAD: ELAVA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: HERMINIO GERONIMO HERRERA*

FECHA DE REPORTE: 27 DE DICIEMBRE DE 2022
 AVANCE PROGRAMADO: 85%
 AVANCE FISICO: 44%
 AVANCE EN ESTIMACION: 0%
 FECHA DE INICIO:
 FECHA DE TERMINO:
 MONTO DE CONVENIO:

PARTIDAS	ALCANCES		UNIDAD
	CANTIDAD	EJECUTADO	
D.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SECCION 24.00*34.00M		44%	
POZO Y DREN PLUVIAL			
CANCHA DE USOS MULTIPLES			
ELECTRICO EN CUBIERTA			
OBRA EXTERIOR ANDADORES			
GRADAS (10.35*2.30M) 2 MODULOS			
AVANCE DE LA OBRA			44%

ETAPA DE LA OBRA
 FABRICACION DE ESTRUCTURA EN CAMPO, COLADO DE PISO, Y COL DE COLUMNAS METALICAS
 OBSERVACIONES:

LA EMPRESA TRABAJA EN LA COLACION DE LAS COLUMNAS METALICAS, Y COLANDO PISO DE CONCRETO.





H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLANA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



CONVENIO:
FECHA INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:

CONTRATO: HAS-SIVOP-FISM-044-2022
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA PRIMARIA EVARISTO SEGUNDO, COL. MISIÓN DE LAS FLORES."

FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO DEL CONTRATO \$ 6,74,196.05 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAZA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: CORPORATIVO IDECO DEL SURESTE S. DE R.L. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 DE DICIEMBRE DE 2022

AVANCE PROGRAMADO: 87%
AVANCE FÍSICO: 32%
AVANCE EN ESTIMACIÓN: 0%

ETAPA DE LA OBRA


ELABORACION DE GRADAS, COLOCACION DE ESTRUCTURA DE ACERO Y RELLENO Y COMPACTACION

OBSERVACIONES:

LLEGO A OBRA LA ESTRUCTURA METALICA Y SE INICIA SU COLOCACION. SE CONFORMO Y COMPACTO LA TERRACERIA PARA EL COLADO DE FIRME DE LA CANCHA

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION		100%	
CORTE EN MATERIAL TIPO B		100%	
CORTE EN MATERIAL TIPO C		100%	
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO		90%	
EXCAVACION PARA ZAPATAS		100%	
COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA		80%	HABILITADO
CUBIERTA DE LAMINA		0%	
COLADO DE FIRME		0%	
FALDON PERIMETRAL		0%	
ELABORACION DE GRADAS		0%	
PERFORACION DE POZOS		100%	
ELABORACION DE REGISTROS CAPTADORES		80%	
INSTALACION PLUVIAL		50%	
INSTALACION ELECTRICA		0%	

FOTOGRAFIAS

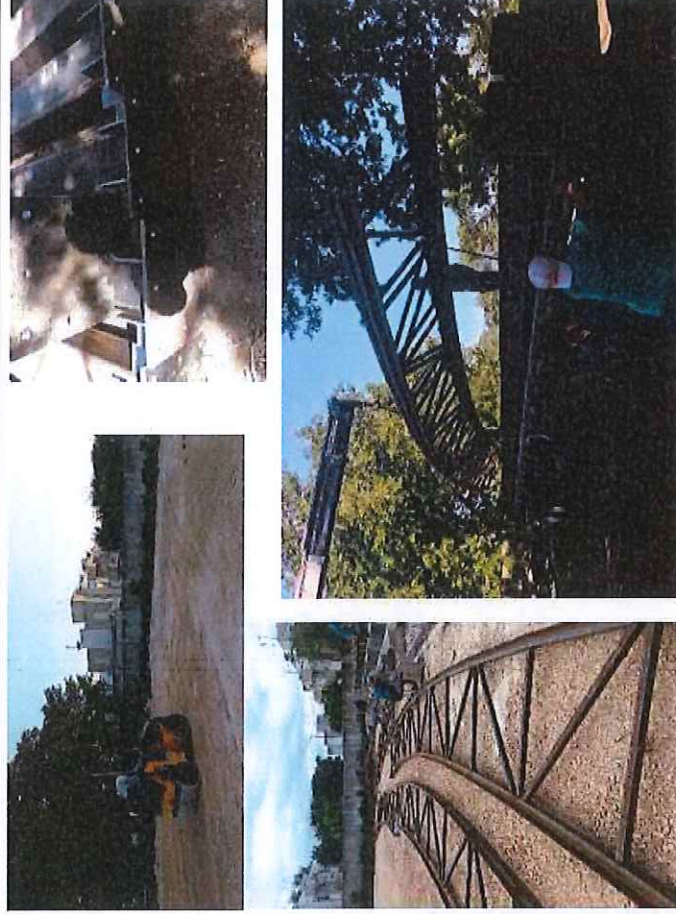



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Subsecretaría de Infraestructura
y Obras Públicas


CONTRATO: HAS-SIYOP-FISM-045-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA Y CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA SECUNDARIA

FECHA INICIO: 24 de octubre de 2022
FECHA TERMINO: 20 de diciembre de 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 5,782,838.74 **IVA INCLUIDO**
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: EDIFICACIONES PRESIDENTE S. A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 79.00%
AVANCE FISICO: 25.00%
AVANCE EN ESTIMACION: 0.00%

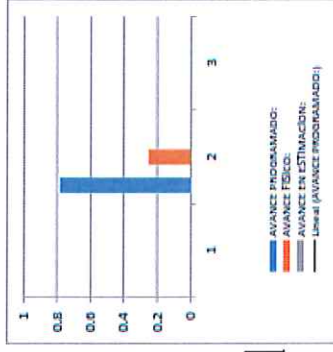

ETAPA DE LA OBRA

PRELIMINARES

OBSERVACIONES:

SE REALIZA TRABAJOS PRELIMINARES. TRAZO DEL AREA DEL DOMO, TRAZO DE LAS ZAPATAS. SE HA REALIZADO LA EXCAVACION DE LAS ZAPATAS, EL COLADO DE LAS MISMAS, ASI COMO TAMBIEN EL COLADO DE DADOS, SE HA INICIADO LOS TRABAJOS PRELIMINARES DE GRADAS. TAMBIEN SE ESTAN REALIZANDO CIMENTACION EN AREA DE CANCHA.

FOTOGRAFIAS



CONCEPTOS	CANTIDAD	%
D CONSTRUCCION DE TECHADO "SECUNDARIA" TEC. # CONGRESO CONSTITUYENTES	\$ 4,985,205.81	25.00%
D.1 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	\$ 3,820,958.90	20.00%
D.2 POZO Y DREN FLUVIAL	\$ 138,752.35	0.00%
D.3 CANCHA DE USOS MULTIPLES	\$ 828,792.67	2.00%
D.4 ELECTRICO EN CUBIERTA	\$ 147,194.76	0.00%
D.5 OBRA EXTERIOR ANDADORES	\$ 4,369.00	0.00%
D.6 GRADAS	\$ 245,138.13	3.00%
IVA 16%		
TOTAL	\$ 5,782,838.74	25.00%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

CONTRATO: **MA2-SY-OP-PEM-046-2022**
 Construcción de techado en zona de inundación de estación física y sanitación y
 obra: **rehabilitación de cancha deportiva en escuela primaria Eduardo Ballejo León, Col. Jard.**
 ME
 FECHA INICIO: **21 de Octubre de 2022**
 FECHA TERMINO: **26 de Diciembre de 2022**
 MONTO DE CONTRATO: **\$ 4,479,213.49**
 LOCALIDAD: **ELVA DEL CARMEN, QUINTANA ROO.**
 EMPRESA: **BASE CUBIERTO, S.A. DE C.V.**



ALCANCES	PARTIDAS	CANTIDAD	EJECUTADO	UNIDAD
SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE COLOCACION DE MUROS DE BLOCK, COLADO DE CASTILLOS Y COLADO DE LOSA MACIZA PARA BANJAS DEL INCOULO DE DRINAJE.	PRELIMINARES			
	TRAZO Y NIVELACION	726.00	100%	MD
	ALCANTARILLADO EN MATERIAL "C"	18.15	100%	MD
	CONSTRUCCION DE ESPERTEAS	8.00	100%	PZA
PRUBAS	CONSTRUCCION DE DADOS	8.00	100%	PZA
	PRUBAS			
	RECOLECCION EN MATERIAL "C"	20.68	100%	MD
	RECOLECCION EN MATERIAL "B"	10.34	100%	MD
COLADO DE CASTILLOS	CONSTRUCCION DE BANQUETERIA	8.78	100%	MD
	COLADO DE ESPALANTE	25.00	100%	ML
	CASTILLO DE 15 X 15	15.30	100%	ML
	MURO DE BLOCK	32.00	100%	MD
LOSA MACIZA PARA BANJAS	LOSA MACIZA PARA BANJAS	48.64	80%	MD





RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024


Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



CONVENIO:

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
 AVANCE PROGRAMADO: 91%
 AVANCE FÍSICO: 35%
 AVANCE EN ESTIMACIÓN: 02%

CONTRATO: HAS-SIVOP-FISM-047-2022
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA AV. 34 NORTE ENTRE LA AV. 73 Y LA AV. 103 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
 FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2022
 FECHA TERMINO: 28 DE DICIEMBRE DE 2022
 MONTO DE CONTRATO: \$ 6'174.196.69 IVA
 LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: GRUPO CHECHEN, S.A. DE C.V.

ETAPA DE LA OBRA
 TERRACERIAS Y GUARNICIONES Y BANQUETAS

FOTOGRAFIAS



SE REALIZO LA TERRACERIA DEL 50% DE LA CALLE Y GUARNICIONES Y BANQUETAS LLEVA UN AVANCE DE 30%

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION		100%	
CORTE EN MATERIAL TIPO B		50%	
CORTE EN MATERIAL TIPO C		50%	
RELLENDO CON MATERIAL DE BANCO		50%	
FORMACION DE TERRACERIAS		50%	
RIEGO DE IMPRESIONACION		0%	
COLOCACION DE CARPETA ASPALTICA DE 7 CM ESP.		30%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS		0%	
PINTURA EN VIALIDAD		0%	



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 80.00 %
AVANCE FISICO: 8.20 %

CONTRATO HAS-SNOP-RISM-048 -2022

FECHA INICIO CM: 21 de octubre de 2022
FECHA TERMINO CM: 07 DIAS

PLAZO DIAS: 07 DIAS
MONTO DE CONTRATO \$ 3'118,344.38

OBRA: CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA AV 55Y 100 AV NTE. ENTRE LA AV
CONSTITUYENTES Y CALLE 30 EN LA COL EJIDO SUR EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

FECHA INICIO: 21 de octubre de 2022
FECHA TERMINO: 07 DIAS

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD Q. ROO
EMPRESA: CARLOS GUALBERTO CALAM CUESTA

REPORTE DE OBRA 13 DE DICIEMBRE 2022

REPORTE DE SUPERVISION

ETAPA DE LA OBRA: se continua con la construcción de catidores, corte en material tipo c en calle 95...
formación de subrasante en c-100



	CANT	UNID	%
PRELIMINARES			
trazo y nivelacion	2520.97	M2	0.76
desmonte terreno	70.5	M2	0.5
Recpi tomas domiciliarias	9	PZ	0.5
renov carpintero y tapas	12	PZ	1
TERRACERIAS			24.20
excav en caja ml B	510	M3	
corte en C	185.84	M3	
afine y comp fondo excar	1855.57	M2	
sum ml arena subrasant	283.41	M3	
form y comp subrasant	282.41	M3	
sum ml blanco para base	377.87	M3	
form y comp base	377.87	M3	
PAVIMENTOS			33.90
trazo de impregnacion	1855.57	M2	
aplic de carpeta asf3	1855.57	M2	
BANDEJAS Y GUAR			
redapie black 13x20x40	24	M2	0.50
guarnicion recta 200	337	M2	4.00
somocost	4	PZ	0.12
sum ml blanco	852.37	M3	2.10
base concr pre 100 B con	3459.3	M2	9.62
apil amullas trafico micro	337	m2	0.83
cost rampas	47.8	m2	1.32
grn terraplenes discont	92.50	m2	0.34
pari terraplenes continua	358.2	m2	1.40
poni termo puros post-altos	392	m2	3.45
Perf de pozos			0
Catidores	100	m2	0
Deflecciones alto	4	PZ	0.5
Recpi tomas lago	8	PZ	1.00
sum y sembrado palmiers	13	PZ	0.6

	01 al 31-10	01 al 31-11	01 al 31-12
AV PROGRAMADO	15.12	59.55	20.99
AV ACUMULADO	15.12	75.07	100.00
AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA	11.47	73.1183	8.20
AVANCE REAL EJECUTADO	0	0	0

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024


Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

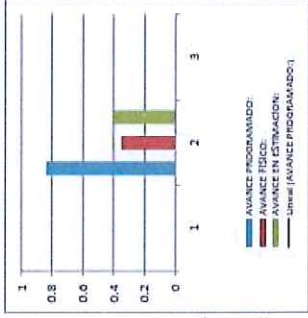

CONVENIO
MODIFICATORIO: IVA INCLUIDO

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 83.562%
AVANCE FÍSICO: 35.002%
AVANCE EN ESTIMACIÓN: 39.992%

FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
MONTO DE CONVENIO: IVA INCLUIDO

CONTRATO: MAS-SINOP-ISM-045-2022
OBRA: REHABILITACION Y AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO DE CONTRATO: \$ 4,020,827.00 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: "C. MONICA BEATRIZ PACHECO MALDONADO".

FOTOGRAFIAS



ETAPA DE LA OBRA

SIMENTACIONES Y ALBANILERIA
OBSERVACIONES:

SE CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ALBANILERIA CON LA COLOCACION DE BLOCK. SE REALIZAN LAS IMPERMEABILIZACIONES DE LAS CAÑERIAS. Y SE CONTINUA EN EL FRENTE DEL EDIFICIO CON LOS ARMADOS PARA COLAR CASTILLOS. SE TRABAJA EN LOS RELLENOS, EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS, HERRAULICAS Y SANITARIAS.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
1 REHABILITACION Y AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD LUIS DONALDO COLOSO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD			
1.1 PRELIMINARES		90%	
1.2 CIMENTACION		80%	
1.3 ALBANILERIA		20%	
1.4 ACABADOS		0%	
1.5 INSTALACIONES		10%	
1.6 HERRERIA Y CANCELERIA		0%	
1.7 OBRA EXTERIOR		20%	





H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS

PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

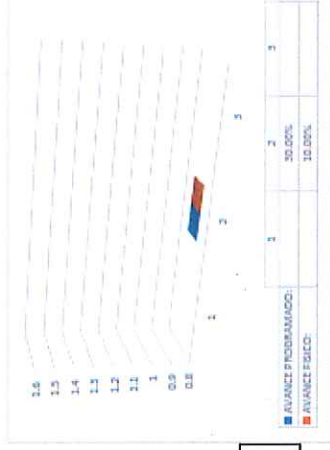

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022



CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022

CONVENIO: H45-SIYOP-050-2022
FECHA INICIO: 21 DE OCTUBRE DEL 2022
FECHA TERMINO: 26 DE DICIEMBRE DEL 2022



SE DEMOLIO MUROS QUE SERAN REMODELADOS, SE DESMANTELO SALIDAS ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, TAMBIEN SE CONSTRUYO MURO DE BLOCK EN AMPLIACION.

CONCEPTOS	CLAVE	CANTIDAD	% AVANCE
PRELIMINARES	B1	2.20%	2.20%
CIMENTACION	B2	3.07%	3.07%
ESTRUCTURA	B3	6.94%	4.00%
ALBAÑILERIA Y ACABADOS	B4	35.69%	
CANALERIA Y HERRERIA	B5	12.00%	
INSTALACION HIDRAULICA	B6	3.50%	
INSTALACION SANITARIAS	B7	9.76%	
INSTALACION ELECTRICA	B8	14.04%	
OBRA EXTERIOR	B9	9.00%	
BICELANES	B10	2.10%	
TOTAL		100%	10%



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

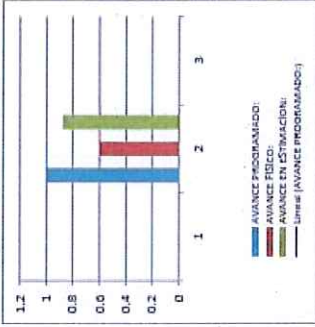

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
AVANCE FÍSICO: 80.00%
AVANCE EN ESTIMACIÓN: 87.47%

CONVENIO
MODIFICATORIO:
IVA INCLUIDO

CONTRATO: HAS-SIVOP-RE-015-2022
OBRA: "CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO DE PLAYA DEL CARMEN"

FECHA INICIO: 14 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
MONTO DE CONTRATO: \$ 700,638.20 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA S.A. DE C.V.

FOTOGRAFÍAS



ETAPA DE LA OBRA
ESTRUCTURA, ALBANILERIA E INSTALACIONES SANITARIAS
OBSERVACIONES:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE COLADO DE LAS LOSAS INTERMEDIAS DE LAS TRES ZONAS, SE PROCEDE A BLOQUEAR LOS NIVELES SUBSECUENTES A BASE DE MAJAO DE BLOCK Y SE REALIZAN LAS INSTALACIONES SANITARIAS.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
A. CONSTRUCCION DE NICHOS EN EL PANTEON MUNICIPAL DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSO DE PLAYA DEL CARMEN			
A.1 PRELIMINARES		100%	
A.2 CIMENTACION		100%	
A.3 ESTRUCTURA Y ALBANILERIA		60%	
A.4 ACABADOS		40%	
A.5 CONTROL DE ENTREGADOS		30%	





H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Subsecretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

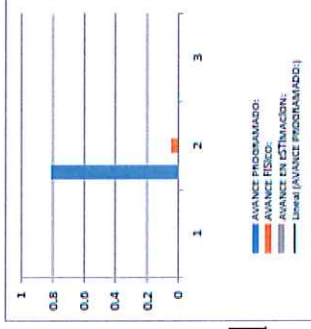

CONTRATO: HAS-SN0P-FORTAMUN-052-2022
 OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SUBSTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA PARA EL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO URBANO DE SOLIDARIDAD (CIMUS)
 FECHA INICIO: 14 de octubre de 2022
 FECHA TERMINO: 26 de diciembre de 2022
 MONTO DE CONTRATO: \$ 2,965,932.69 IVA INCLUIDO
 LOCALIDAD: PLAZA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
 EMPRESA: 65 GRADOS S. A. DE C. V.

FOTOGRAFIAS



CONCEPTOS	CANTIDAD	%
A REHABILITACION DEL CENTRO DE INTELIGENCIA Y MONITOREO (RUBRO DE SOLIDARIDAD) (CIMUS)	\$ 2,996,838.53	0.00%
A.1 PRELIMINARES	\$ 17,579.40	0.50%
A.2 CIMENTACION	\$ 114,478.47	0.00%
A.3 ESTRUCTURA	\$ 78,483.04	0.00%
A.4 ALBAÑILERIA	\$ 19,901.24	0.00%
A.5 CANCELERIA DE ALUMINIO	\$ 60,471.87	0.00%
A.6 INSTALACION ELECTRICA	\$ 2,212,409.93	0.00%
A.7 ANDADORES PERMETRALES	\$ 53,594.58	
IVA 16%	\$ 409,094.16	
TOTAL	\$ 2,965,932.69	0.50%

ETAPA DE LA OBRA
PRELIMINARES
OBSERVACIONES:
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS PRELIMINARES, EN EXCAVACION PARA LA CIMENTACION DEL CUARTO PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA.



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL CALLE TARRAGONA, FRACC CATALUÑA II

FECHA INICIO: 31 DE OCTUBRE 2022
FECHA TERMINO: 28 DE DICIEMBRE 2022

DURACION DE LA OBRA: 57 DIAS
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD Q. ROO
EMPRESA: MALLA CICLON DEL CARIBE S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 76.00 %
AVANCE FISICO: 10.13 %
CONTRATO HAS-S/0P-RF-054 -2022
FECHA INICIO CIM:
FECHA TERMINO CIM:
PLAZO DIAS
MONTO DE CONTRATO \$1,991,232.04
CI/VA \$1,718,596.59 S/VA

REPORTE DE SUPERVISION

ETAPA DE LA OBRA
INICIO DE OBRA: SE TRABAJA EXCAVACION Y COLOCACION DE RODAPIE EN AREA DE EJERCITADORES Y RELLENO CON MATERIAL SASCAB EN AREA DE JUEGOS

	CANT	UNID	%	AVANCE
PRELIMINARES	3.04	90000.00	3.03	3.03
trazo y nivelacion	2956.1	m2	2.6	
excav en caja ml B	08.28	m3	1.40	
excav en caja ml C	3.13	m3	0.97	
relleno	33.5	m3	1.5	3.63
ALBAÑERIA	24.81	423805	20.38	
Pavilla niveladora	220.11	ML	2.192041615	2.5
rodapie block 20x20x40	220.11	ML	2.90040644	3
firme 10 cm	213.20	m2	0.20103003	6.5
concreto eco 8 cm	337.75	m2	12.64803129	13.6
best curvas	47.12	ml	0.691860729	0.7
				29.3
JUEGOS INFANTILES	34.67	992183.00	34.07	
refiro y limpieza basura	61.16	m2	1.2	
sum poste sintetico	327.75	m2	11.67	
sum juego metalico	1	pe	21.6	
MOBILIARIO	10.92	187518.00	10.92	
sum inst ejercitadores	6	pe	7.85	
sum e inst bancas concreto	30	pe	1.97	
sum baspederos	3	pe	1.1	
INST ELECTRICA	23.96	411331.00	23.96	
trazo y niv inst postes	280.07	ml	0.21	
excav y relleno zanja	23.2	m3	1	
tub corrugado ead 2"	313	ml	1.0	
reg bases piramidales	10	pe	2.20	
reg electricos 40x40x60	10	pe	1.3	
tercerido de cable	603.19	ml	4.2	
inst termos	7	pe	4.6	
sumete 1.5x.00x2.00	1	pe	0.0	
sum y coloc luminarias 3mts	10	pe	0.01	
conectores derivadores	99	pe	1.13	
esq proteccion y tablero 00x12	1	pe	0.71	



01 al 31-10	01 al 30-11	01 al 28-12
0.88	30.19	02.50
0.88	37.07	74.00
0.88	31.04	54.00
0.88	3.04	10.13

AV PROGRAMADO 10.13
AV ACUMULADO 10.13
AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA 10.13
AVANCE REAL EJECUTADO 10.13



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

OBRA: CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO EN AVENIDA TUMBEN KIN, FRACCIONAMIENTO CATALUNA II

FECHA INICIO: 31 de octubre de 2022
FECHA TERMINO: 26 de diciembre de 2022
DURACION DE LA OBRA: 57 DIAS
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD Q. ROO
EMPRESA: INTERNAYADELCARIBE S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 89.00 %
AVANCE FISICO: 19.00 %
CONTRATO HAS-SIYOP-RF-035 -2022
FECHA INICIO CM: 31 de octubre de 2022
FECHA TERMINO CM: 26 de diciembre de 2022
PLAZO DIAS: 57
MONTO DE CONTRATO \$ 2,125,301.74
SI/VA \$ 2,405,350.02 C/VA

REPORTE AL 15-12-2022

REPORTE DE SUPERVISION

ETAPA DE LA OBRA: SE TRABAJA EN EXCAVACION DE ANDADORES Y CANCHA. CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA Y LAS GRADIAS



	CANT	UNID	%	2.03	2.03	2.23
PRELIMINARES						
trazo y nivelacion	958.35	m2	0.5			
excav en casa mtl B	59.3	m3	1			
excav en casa mtl C	2.5	m3	0.5			
Sellado	26.61	m3	0.03		14.9	
ALBAÑERIA						
Plantilla mezcladora	249.00	m2	3.1			1
molaple block 20x20x40	249.00	m1	3			
concreto ecologico	147.04	m2	5			
basta de concreto	30	m2	3			
retiro de escemento	50.22	m3	0.3			0.3
reubicacion arboles	25	m2	0.5			0.5
Canchas 12x17 mts	1	m2	17.05	17.6		0
retiro y limpieza basura	1869.97	m2				1
sum. pasto sintético	1869.97	m2			19.31	
juegos infantiles	1 m2		19.31	19.31		
gradas 10,320 x 20 mts	1 m2		12.77	12.77		0
MOBILIARIO						
sum. bot. extractores	0		1.47	1.47		
sum. bot. extractores	0		5.0	5.0		1.37
sum. bot. extractores	30		3	25.32		
INST ELECTRICA						
trazo y niv. mt postes			1			
excav y relleno zanja			2			
tub corrugado 6x2"	313	m1	2			
sum. bases piramidales	20	m2	5			
mta electricos 40x40x00	20	m2	3			
tenedida de cable			4			
bot. postes			1			
sum. bot. postes	1	m2	1			
sum. y cable luminaria 3mts	30	m2	2	98.56	100	15

21 al 31-10	01 al 30-11	01 al 29-12
19.12	56.95	20.93
19.12	79.07	100.00
11.47	51.55	59.00
0	10	10.00

AV PROGRAMADO 20.93
AV ACUMULADO 79.07
AVANCE PROGRAMADO A LA FECHA 11.47
AVANCE REAL REGISTRADO 0



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

CONTRATO: **HAS-SIXOP-FORTAMUN-056-2022**
OBRA: **REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CEBIAM EN LA COLONIA AMPLIACIÓN BELLA VISTA, EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.**

FECHA INICIO: 11 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA TERMINO: 30 DE DICIEMBRE DE 2022


MONTO DE CONTRATO: \$ 12,975,463.12

LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

EMPRESA: **SUMINISTROS E INFRAESTRUCTURAS DE TULUM S.A DE C.V.**

FECHA DE REPORTE: 27 de diciembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 85%
AVANCE FISICO: 30%
AVANCE EN ESTIMACION: 68%

CONVENIO:





ETAPA DE LA OBRA

EXCAVACION, CIMENTACION Y ALBANILERIA

OBSERVACIONES:

EDIFICIO 1.- SE REALIZA ACABADOS.- EDIFICIO EDIFICIO 2.- SE REHABILITAN 2 DE LAS JAULAS DE PERRITOS. 3.- SE CONTINUA CON LA CIMENTACION EDIFICIO Y 4.- SE INICIO CON EL COLADO DE PLANTILLAS PARA LA CIMENTACION.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION		100%	
EDIFICIO 1			
ALBANILERIA		100%	
INSTALACIONES		95%	
ACABADOS		80%	
IMPERMEABILIZACION		0%	
EDIFICIO 2			
ALBANILERIA		40%	
INSTALACIONES		20%	
ACABADOS		15%	
HERRERIA		0%	
EDIFICIO 3		0%	
CIMENTACION		80%	
ESTRUCTURA		20%	
ALBANILERIA		100%	
ACABADOS		0%	
EDIFICIO 4			
CIMENTACION		20%	
ESTRUCTURA		0%	
ALBANILERIA		0%	
ACABADOS		0%	

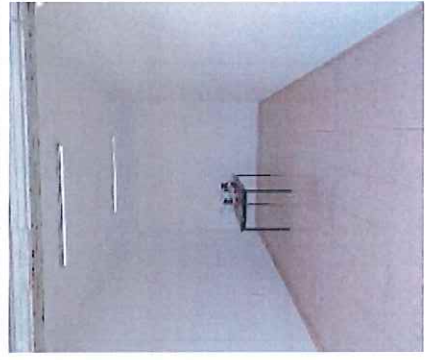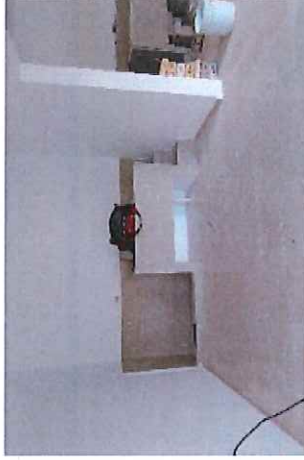



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024




RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas



Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

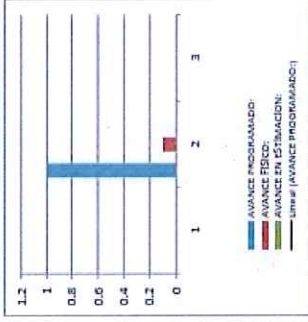

CONTRATO: **HAS-SIDOP-RE-005-2022**
OBRA: **"Construcción de paradero en av. Universidades y av. Paseo del Mayab, Playa del Carmen"**

FECHA INICIO: 21 DE NOVIEMBRE DE 2022
FECHA TERMINO: 20 DE DICIEMBRE DE 2022
MONTO DE CONTRATO: \$ 2,000,000.00 IVA INCLUIDO
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
EMPRESA: INMOBILIARIA XEBORG, S.A DE CV
REPRESENTANTE: LIC. JHONATAN J. SIBILLAS IGLESIBS

FECHA DE REPORTE: 27 de noviembre de 2022
AVANCE PROGRAMADO: 100.00%
AVANCE FÍSICO: 10.00%
AVANCE EN ESTIMACIÓN: 9.00%

CONVENIO MODIFICATORIO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINO:
MONTO DE CONVENIO:
IVA INCLUIDO

ETAPA DE LA OBRA

FOTOGRAFÍAS

ESTRUCTURA Y PAVIMENTOS
OBSERVACIONES:

SE INICIAN LOS TRABAJOS PRELIMINARES EN EL PARADERO SE REALIZAN LOS TRAZOS Y LAS EXCAVACIONES PARA LA CIMENTACION DE LAS ZAPATAS ASI COMO LAS DEMARCACIONES DE LAS BANQUETAS Y GUARNICIONES. EL HABILITADO DE PLACAS DE ACERO PARA EL SOPORTE DE LAS ESTRUCTURAS

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
A-1 Construcción de paradero en av. Universidades y av. Paseo del Mayab, Playa del Carmen			
A-1.1 PRELIMINARES		30%	
A-1.2 CIMENTACION		25%	
A-1.3 ESTRUCTURA		20%	
A-1.4 GUARNICIONES Y BANQUETAS		5%	
A-1.5 INSTALACION ELECTRICA		5%	
A-1.6 SERIALIZACION		5%	



[Handwritten signature]



Resultados de la Actividad 4. Se da seguimiento a la integración de 60 Expediente Técnicos Unitarios de Obra Pública, conteniendo la evidencia de la planeación, contratación, ejecución y control de las obras Públicas que realiza la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

Durante el segundo y tercer trimestre se reportaron los contratos de obra pública no. HAS-SIyOP-RF-002-2022, HAS-SIyOP-RF-015-2022, HAS-SIyOP-FORTAMUN-003-2022, HAS-SIyOP-FORTAMUN-009-2022, HAS-SIyOP-FORTAMUN-013-2022, y HAS-SIyOP-FORTAMUN-014-2022 con un avance igual o mayor del 90%, por lo que se consideraron para el cumplimiento de metas de la actividad de Integración de Expediente Técnico Unitario de Obra Pública al contener la documentación comprobatoria de la inversión pública realizada.

Para este cuarto trimestre, siguiendo el mismo criterio de integración documental al 90%, tenemos **54 expedientes técnicos unitarios** para registro de cumplimiento de esta actividad, los cuales corresponden a los siguientes:

No.	CON RECURSOS FISCALES
1	Elaboración, Gestión y Seguimiento de Tramites Estatales y/o Federales en Materia de Impacto Ambiental del H. Ayuntamiento de Solidaridad. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-001-2022
2	Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-016-2022
3	Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-017-2022
4	Rehabilitación de las oficinas de la Secretaria de Justicia Cívica No. Contrato HAS-SIyOP-RF-018-2022
5	Construcción de Acceso a la Localidad de Puerto Aventuras No. Contrato HAS-SIyOP-RF-032-2022
6	Conclusión de la Habilitación del Museo Interactivo Multicultural de Playa del Carmen 1era Etapa No. Contrato HAS-SIyOP-RF-037-2022
7	Construcción de comedor Comunitario en el Centro de Desarrollo Comunitario El Peten. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-050-2022
8	Construcción de nichos en el Panteón Municipal de la colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-051-2022
9	Construcción de Parque Infantil en Calle Segarra, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-053-2022
10	Construcción de Parque Infantil en Calle Tarragona, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-054-2022
11	Construcción de Espacio Deportivo en Av. Tumben Kin, Fraccionamiento Cataluña II, Playa del Carmen. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-055-2022
12	Construcción de Paradero en la Av. Universidades y Av. Paseos del Mayab, Playa del Carmen. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-059-2022
13	Programa de Mejoramiento a la Vivienda. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-060-2022
14	Elaboración de Proyecto Integral, para la Plaza 28 de Julio en Playa del Carmen. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-064-2022
15	Habilitación de oficinas para la Contraloria en el Nuevo Palacio Municipal. Nº Contrato HAS-SIyOP-RF-065-2022





No.	CON RECURSOS FISCALES
16	Construcción acceso a Playa Inclusiva Pelicanos. N° Contrato HAS-SIyOP-RF-066-2022

No.	CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN
17	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-005-2022
18	Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-006-2022
19	Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Primera Etapa. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-007-2022
20	Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Segunda Etapa. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-008-2022
21	Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad Deportiva Poliforum del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-010-2022
22	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Mario Villanueva del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-011-2022
23	Rehabilitación del Mercado Municipal Diana Laura Riojas en la Colonia Luis Donaldo Colosio. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-012-2022
24	Rehabilitación de parques para actividades de recreación y esparcimiento en el Municipio de Solidaridad N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-019-2022
25	Construcción de alumbrado público en avenida Sur entre avenida 115 a la avenida 75 del Municipio de Solidaridad N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-020-2022
26	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Sur entre Avenida 115 a la Avenida 75 del Municipio de Solidaridad N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-021-2022
27	Construcción de guarniciones y banquetas de la Av. CTM entre Av. 115 a Carretera Federal, y Av. 115 entre Calle Coba a Av. Sur del Municipio de Solidaridad N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-022-2022
28	Pavimentación de Carpeta Asfáltica de la Av. Diag. 65 entre Av. CTM y Av. Colosio N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-023-2022
29	Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad, Segunda Etapa. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-024-2022
30	Pavimentación de Carpeta Asfáltica en la Calle Lirios entre Calle Ceiba y Calle Caoba N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-025-2022
31	Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas de la Avenida 75 entre Calle 36 Norte y Avenida Sur, en el Municipio de Solidaridad N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-026-2022
32	Pavimentación de la Avenida Diag. 65 entre Av. CTM y Av. Sur N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-027-2022





No.	CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN
33	Construcción de guarniciones y banquetas en la super manzana 075 en el Municipio de Solidaridad N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-030-2022
34	Pavimentación de avenida Loros entre Av. CTM y Av. Luis D. Colosio, Fracc. Villas del Sol. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-031-2022
35	Repavimentación de la avenida 7 sur entre av. 10 y Boulevard Playa del Carmen N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-035-2022
36	Construcción de Subestación eléctrica de 112.5 kva para el Centro de inteligencia y monitoreo urbano de Solidaridad (CIMUS) N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-052-2022
37	Rehabilitación de las instalaciones del Cebiam en la Colonia Ampliación Bellavista, en el Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-056-2022
38	Pavimentación de la Av. 90 norte entre Av. Sur y Calle 36 del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-057-2022
39	Rehabilitación del Edificio C4, en las Instalaciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Municipio de Solidaridad, Primera Etapa. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-058-2022
40	Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 283, Playa del Carmen - Tulum. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-061-2022
41	Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 302, Playa del Carmen – Cancun. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-062-2022
42	Rehabilitación de Filtro policiaco Carretera Federal km 8.5, Playa del Carmen – Tintal. N° Contrato HAS-SIyOP-FORTAMUN-063-2022

No.	CON RECURSOS RAMO 33 FISM
43	Construcción de la pavimentación de la Av. 80, Av. 85 y Av. 90 norte entre Av. Constituyentes y Av. 36 del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-036-2022
44	Rehabilitación de pavimentación de la 115 avenida entre avenida Tumben kin y avenida Mayapan del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-039-2022
45	Construcción de 27 pozos de absorción en diferentes puntos en el Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-040-2022
46	Construcción de techado en área de impartición de educación física y rehabilitación de plaza cívica en escuela Jardín de niños Vicente Suarez, Col. Luis Donaldo Colosio. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-041-2022
47	Construcción de techado en área de impartición de educación física y cancha deportiva en escuela Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, Col. Villas del Sol. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-042-2022
48	Construcción de techado en área de impartición de educación física y ampliación y rehabilitación de cancha deportiva en escuela secundaria Luz María Zaleta de Elsner, Col. Villas del Sol. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-043-2022
49	Construcción de techado en área de impartición de educación física y cancha deportiva en escuela primaria Evaristo Segundo, Col. Misión de las Flores. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-044-2022





No.	CON RECURSOS RAMO 33 FISM
50	Construcción de techado en área de impartición de educación física y cancha deportiva en escuela secundaria Tec. 40 Congreso Constituyente de 1974, en el Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-045-2022
51	Construcción de techado en área de impartición de educación física y ampliación y rehabilitación de cancha deportiva en escuela primaria Eduardo Priego León, Col. Zazil-ha. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-046-2022
52	Construcción de la pavimentación de la Av. 34 norte entre la Av. 75 y la Av. 105 del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-047-2022
53	Construcción de la pavimentación en 95 av. y 100 av. Entre Constituyentes y calle 36 norte, en la colonia ejido sur en el Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-048-2022
54	Rehabilitación y Ampliación al Centro de Salud Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad. N° Contrato HAS-SIyOP-FISM-049-2022



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



INSPECCIONES POR USO DE LA VÍA PÚBLICA REALIZADAS	
Unidad Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Programa de Desarrollo PMD	III. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Línea de acción PMD:	5.- ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE OCTUBRE 2022 AL: 31 DE DICIEMBRE 2022.

Objetivo del Proyecto: Contribuir al cuidado y conservación de la vía pública para que el municipio de Solidaridad cuente con una infraestructura de calidad, que sea funcional para la población, y brinde buena imagen a nuestro municipio.

Descripción de la actividad/Proyecto: Se inspecciona y vigila la vía pública, para que la población haga un adecuado uso de la misma contando con los permisos correspondientes en estricto apego a la normatividad aplicable.

Población Objetivo: La población del Municipio de Solidaridad

Avances del proyecto Inspecciones por Uso de la Vía Pública:

Se programaron realizar durante el ejercicio fiscal 2022, 1400 Inspecciones por uso de la vía pública entre los permisos que llega a gestionar la ciudadanía y las obras que se intervienen en la vía pública, durante el primer trimestre se realizaron 253, en el segundo trimestre se realizaron 229, en el tercer trimestre se realizaron 220 inspecciones, y en este 4to. trimestre se realizan 208 representando un avance del 65% equivalente a 910 inspecciones de la vía pública realizadas.

Resultados Actividad/Proyecto:

1. Se realizaron 89 actas de inspección por uso de la vía públicas, de las cuales tenemos que 51 actas de inspección fueron atendidas por los ciudadanos acudiendo a la oficina para darle el seguimiento oportuno al mismo, como a continuación enlisto:



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL COMERCIO, JUJUMANÁ, Q. ROO
Evidencia:



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE 2022									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
03/10/2022	255	SE DEJO NOTIFICACION	120/JUARIZ	BELLA VISTA	RUPTURA	BANQUETA	AUN NO SE PRESENTAN		
04/10/2022	256	SE DEJO NOTIFICACION	XEL-HA/CARRRET FED		RUPTURA	PERMISO VENCIDO	AUN NO SE PRESENTAN		
05/10/2022	257	SE DEJO NOTIFICACION	10/CTM-48	COLOSIO	OBSTRUCCION	ANDAMIOS	AUN NO SE PRESENTAN		ATENDIDO
05/10/2022	258	SE DEJO NOTIFICACION	115/SOLIDARIDAD	COLOSIO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	AUN NO SE PRESENTAN		
06/10/2022	259	SE DEJO NOTIFICACION	100/CARRRET FEDERAL		RUPTURA	DEVAJE			ATENDIDO
07/10/2022	260	TIERRA MAYA GRUPO INMOBILIARIO DESARROLLO DORES Y REAL ESTATE S DE RL DE CV	17/80-85	EJIDO	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION			ATENDIDO#289
07/10/2022	261	SE DEJO NOTIFICACION	25/130-135	BELLA VISTA	RUPTURA	BANQUETA	AUN NO SE PRESENTAN		
10/10/2022	262	SE DEJO NOTIFICACION	80/33-85	EJIDAL	RUPTURA	FIBRA OPTICA	AUN NO SE PRESENTAN		
11/10/2022	263	SE DEJO NOTIFICACION	SAUCES/MONTE SINAI	BOSQUE REAL	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	AUN NO SE PRESENTAN		
11/10/2022	264	RED NACIONAL ULTIMA MILLA SA DE CV	MONTE ATLAS	BOSQUE REAL	INCUMPLIMIENTO	PERMISO		\$ 12,028.00	
11/10/2022	265	SE DEJO NOTIFICACION	10/CTM-48	COLOSIO	OBSTRUCCION	ANDAMIOS			ATENDIDO ACTA 256/2022
14/10/2022	266	SE DEJO NOTIFICACION	1/14	CENTRO	OBSTRUCCION	TAPAL	AUN NO SE PRESENTAN		
14/10/2022	267	SE DEJO NOTIFICACION	15/39-40	ZA-ZIL-HA	INCUMPLIMIENTO	PERMISO		P289	
17/10/2022	268	SE DEJO NOTIFICACION	5/10	CENTRO	OBSTRUCCION	TAPAL			ATENDIDO
17/10/2022	269	SE DEJO NOTIFICACION	15/38-40	ZA-ZIL-HA	OBSTRUCCION	TAPAL	AUN NO SE PRESENTAN		
17/10/2022	270	SE DEJO NOTIFICACION	PANAMA/AV GOLFO	MUNDO HABITAD	RUPTURA	FIBRA OPTICA		\$ 12,028.00	
18/10/2022	271	SE DEJO NOTIFICACION	25/130-135	BELLA VISTA	RUPTURA	BANQUETA			ATENDIDO
19/10/2022	272	SE DEJO NOTIFICACION	24/115-120	EJIDO	OBSTRUCCION	PUNTALES	AUN NO SE PRESENTAN		
20/10/2022	273	SE DEJO NOTIFICACION	CHEMUYULILAS NACIONES-28 JULIO	MUNDO HABITAD	CANALIZACION	DRENAJE			ATENDIDO
20/10/2022	274	SE DEJO NOTIFICACION	10/48	COLOSIO	OBSTRUCCION	ESTRUCTURA METALICA	AUN NO SE PRESENTAN		
20/10/2022	275	HAWAT S DE RL DE CV	10/CTM-48	COLOSIO	RUPTURA	BANQUETA			ATENDIDO
21/10/2022	276	SE DEJO NOTIFICACION	5/10	CENTRO	OBSTRUCCION	TAPAL			ATENDIDO
21/10/2022	277	SE DEJO NOTIFICACION	5/60 ESQ.	COLOSIO	OBSTRUCCION	MADERA			ATENDIDO
21/10/2022	278	SE DEJO NOTIFICACION	26/5-10	CENTRO	OBSTRUCCION	PUNTALES			ATENDIDO
24/10/2022	279	SE DEJO NOTIFICACION	80/KIN	EJIDO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA			ATENDIDO
24/10/2022	280	SE DEJO NOTIFICACION	45/54-56	COLOSIO	OBSTRUCCION	TAPAL	AUN NO SE PRESENTAN		
25/10/2022	281	GONZALO MANZANO JOSE EDUARDO	XEL-HA	GUADALUPAN A	RUPTURA	RAMPA		\$ 4,400.00	
26/10/2022	282	SE DEJO NOTIFICACION	FLOR DE CIRUELO/PALMAS 2 - 28 DE JULIO	PALMAS 2	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA		PAGADO	P#287
27/10/2022	283	SE DEJO NOTIFICACION	17/0-15	AVACION	OBSTRUCCION	TAPAL	AUN NO SE PRESENTAN		
27/10/2022	284	SE DEJO NOTIFICACION	10/20-15	CENTRO	OBSTRUCCION	TAPAL	AUN NO SE PRESENTAN		
31/10/2022	285	SE DEJO NOTIFICACION	6/45	CENTRO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA			ATENDIDO

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAZA DEL COMERCIO, QUINHANA ROO
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
04/11/2022	286	VIVO CONSTRUCCIONES SA DE CV	PUERTO MAYA	PUERTO AVENTURAS	INCUMPLIMIENTO	PERMISO			ATENDIDO
07/11/2022	287	CONSORCIO DE INGENIERIA INTEGRAL SA DE CV	FLOR DE CIRUELO		INCUMPLIMIENTO	PERMISO		27/12/2022	\$ 18,282.00
07/11/2022	288	HAWATS DE RL DE CV	10/CTM-48	CENTRO	RUPTURA	DRENAJE			\$ 2,200.00
07/11/2022	289	SE DEJO NOTIFICACION	15/38-40	ZAZIL-HA	INCUMPLIMIENTO	PERMISO	A UN NO SE PRESENTA		
07/11/2022	290	SE DEJO NOTIFICACION	15/38/38-40	ZAZIL-HA	2DA ACTA	#269	A UN NO SE PRESENTA		
08/11/2022	291	TIERRA MAYA GRUPO INMOBILIARIO DESARROLLADORES Y REAL ESTATE S DE RL DE CV	17/80-85	EJIDO	2DA ACTA	#260			ATENDIDO
08/11/2022	292	SE DEJO NOTIFICACION	1/14	CENTRO	2DA ACTA	#266	A UN NO SE PRESENTA		
09/11/2022	293	SANTIAGO FRANCISCO FRANCISCO	17/125-130	BELLA VISTA	RUPTURA	RAMPA			\$ 2,200.00
11/11/2022	294	ALFARO BERA RODRIGO	42/60-65	PEDREGAL	RUPTURA	RAMPA			\$ 2,200.00
14/11/2022	295	RED NACIONAL ULTIMA MILLA SA DE CV	NICARAGUA/NA COINES	MUNDO HABITAD	DAÑO	MEZCLA	A UN NO SE PRESENTA		
15/11/2022	296	SE DEJO NOTIFICACION	15/38-40	ZAZIL-HA	3RA -266-269	SELLOS/21-22	A UN NO SE PRESENTA		
15/11/2022	297	RED NACIONAL ULTIMA MILLA SA DE CV	LONDRES/GAVILANES-SUR	PESCADORES	REPORTE CIUDADANO	FALTA DE LIMPIEZA	A UN NO SE PRESENTA		
15/11/2022	298	SE DEJO NOTIFICACION	50/70-75	PEDREGAL	RUPTURA	POCETA	A UN NO SE PRESENTA		
15/11/2022	299	TIERRA MAYA GRUPO INMOBILIARIO DESARROLLADORES Y REAL ESTATE S DE RL DE CV	17/80-85	EJIDAL	3RA: 260-291	OBSTRUCCION DE MATERIALES			\$ 2,200.00
16/11/2022	300	SE DEJO NOTIFICACION	PETEMPI/COLOSIO-SOLIDARIDAD	CRUZ DE SEBASTIAN AVENTURAS	OBSTRUCCION	RAMPA	A UN NO SE PRESENTA		
16/11/2022	301	GRUPO VIVO	CALZADA PUERTO MAYA	CENTRO	RUPTURA	BANQUETA			ATENDIDO
17/11/2022	302	SE DEJO NOTIFICACION	5/10	CENTRO	3RA NOTIFICACION	TAPAL			ATENDIDO
17/11/2022	303	SE DEJO NOTIFICACION	CTM20-15	ZAZIL-HA	RUPTURA	RAMPA	A UN NO SE PRESENTA		
18/11/2022	304	COMPANIA MAYORISTA DE ABARROTES SA DE CV	DIG.70/12	EJIDAL	RUPTURA	RAMPA			ATENDIDO
18/11/2022	305	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A. DE B.M. BANREGIO GRUPO FINANCIERO		CRISTO REY	FALTA DE SENALIZACION	AGUA POTABLE- DREN			\$ 48,110.00
18/11/2022	306	ADALBERTO GUTIERREZ RAMIREZ	ALGAS/BARRA CUA-BOQUINETE	A RRECIFES	DAÑO	MEZCLA			\$ 2,800.00
23/11/2022	307	SE DEJO NOTIFICACION	25/6-4	CENTRO	MALA REPARACION		A UN NO SE PRESENTA		
24/11/2022	308	SE DEJO NOTIFICACION	CTM20-15	ZAZIL-HA	PERMISO	VENCIDO			\$ 24,055.00
25/11/2022	309	MANUEL RAMIRO HERNANDEZ	JUA REZ/115	EJIDAL	RUPTURA	EE			ATENDIDO
28/11/2022	310	FRACCIONAMIENTO SAMALA	A ACCESO CRISTO REY	SAMALA	INCUMPLIMIENTO	SENALIZACION			ATENDIDO
29/11/2022	311	SE DEJO NOTIFICACION	BOSQUES CRISTO REY	CRISTO REY	SELLOS		A UN NO SE PRESENTA		
29/11/2022	312	SE DEJO NOTIFICACION	52/55-60	PEDREGAL	RUPTURA	RAMPA	A UN NO SE PRESENTA		
30/11/2022	313	SE DEJO NOTIFICACION	GUAYABA/28 JULIO	28 DE JULIO	DAÑO	MEZCLA	A UN NO SE PRESENTA		
30/11/2022	314	ORLI MANUEL, S.A. DE C.V	100/IRA PRIVADA	EJIDAL	OBSTRUCCION	ANDAMIOS			\$ 12,028.00

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
2021 - 2024
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022

FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
01/12/2022	315	MEZA GORDILLO ERASMO MOISES	80/17-19	EJIDAL	MODIFICACION	RAMPA		13/12/2022	ATENDIDO
02/12/2022	316	SE DEJO NOTIFICACION	38/30	ZAZIL-HA	PERMISO VENCIDO	TAPAL		16/12/2022	ATENDIDO
02/12/2022	317	RENE ISRAEL CANO CHE CUPUL	1RA/20-22	CENTRO	OCCUPACION	ANDAMIOS	AUN NO SE PRESENTA	02/12/2022	\$ 440.00
05/12/2022	318	SE DEJO NOTIFICACION	85/52-54	PEDREGAL	OBSTRUCCION	TUBOS			
06/12/2022	319	BORROPORITY SA DE CV	1/40-42	ZAZIL-HA	PERMISO	VENCIDO		\$ 24,055.00	PRESUPUESTO
06/12/2022	320	BANCO REGIONAL DE MONTERREY S.A CRISTO REY	1/40-42	CRISTO REY	SELLOS	033-034		13/12/2022	\$ 48,110.00
07/12/2022	321	SE DEJO NOTIFICACION	10/48.	COLOSIO	PERMISO VENCIDO	PH#167		12/12/2022	ATENDIDO
07/12/2022	322	SE DEJO NOTIFICACION	4/20-25	CENTRO	PERMISO VENCIDO	VENCIDO		12/12/2022	ATENDIDO
07/12/2022	323	SE DEJO NOTIFICACION	CH/TINTAL	TINTAL	RUPTURA	CAMARAS			ATENDIDO
08/12/2022	324	SE DEJO NOTIFICACION	45/20	GONZALO GUE	RUPTURA	RAMPA	AUN NO SE PRESENTA		
08/12/2022	325	SE DEJO NOTIFICACION	16/40-45	GONZALO GUE	OBSTRUCCION	ANDAMIOS		08/12/2022	\$ 480.00
08/12/2022	326	SE DEJO NOTIFICACION	14/130-135	EJIDAL	OBSTRUCCION	ANDAMIOS		08/12/2022	ATENDIDO
12/12/2022	327	ENTORNO LUMA SAPI	26/28.	GONZALO GUE	OBSTRUCCION	TAPAL		12/12/2022	ATENDIDO
12/12/2022	328	SE DEJO NOTIFICACION	CORAL/BOQUINETE-BARRACUDA	ARRECIJES	RUPTURA	BANQUETA			\$ 14,055.00
15/12/2022	329	RED NACIONAL ULTIMA MILLA SA DE CP	PASO COPAN/115	JOYA/EJIDAL	RUPTURA	FIBRA OPTICA			\$ 43,955.00
14/12/2022	330	OPERACIONES COMERCIALES DE LA PE	AV. ALONDRA/AV. CHICH Y CONSTITUYE	VILLAS DEL SO	RUPTURA	BANQUETA/RAMPA		22/12/2022	ATENDIDO
14/12/2022	331	SE DEJO NOTIFICACION	24/10.	CENTRO	RUPTURA	BANQUETA	AUN NO SE PRESENTA		
14/12/2022	332	SE DEJO NOTIFICACION	COLOSIO/85	COLOSIO	OBSTRUCCION/RUPTURA	TAPAL	AUN NO SE PRESENTA		
15/12/2022	333	SE DEJO NOTIFICACION	PALMA XAGUA/BLVD PALMAS II	PALMAS 2	OCCUPACION	SIMBRA	AUN NO SE PRESENTA		
16/12/2022	334	SE DEJO NOTIFICACION	30/24.	GONZALO GUE	OCCUPACION	TAPAL	AUN NO SE PRESENTA		
19/12/2022	335	SE DEJO NOTIFICACION	15/38-40	ZAZIL-HA	5TA. ACTA	TAPAL	AUN NO SE PRESENTA		
19/12/2022	336	SE DEJO NOTIFICACION	COLOSIO/85	COLOSIO	OBSTRUCCION	TAPAL		20/12/2022	\$ 12,028.00
20/12/2022	337	SE DEJO NOTIFICACION	58/30-35	COLOSIO	RUPTURA	RAMPA	AUN NO SE PRESENTA		
20/12/2022	338	SE DEJO NOTIFICACION	82/10-5	COLOSIO	OCCUPACION	TAPAL		21/12/2022	ATENDIDO
21/12/2022	339	SE DEJO NOTIFICACION	42/15-20	ZAZIL-HA	OCCUPACION	TAPAL		26/12/2022	\$ 12,028.00
22/12/2022	340	SE DEJO NOTIFICACION	90/35	EJIDO	OBSTRUCCION	MATERIALES DE CONSTRUCCION	AUN NO SE PRESENTA		
23/12/2022	341	SE DEJO NOTIFICACION	40/115-125	EJIDO	OCCUPACION	CARPETA ASFALTICA	AUN NO SE PRESENTA		
26/12/2022	342	SE DEJO NOTIFICACION	44/20-25	ZAZIL-HA	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	AUN NO SE PRESENTA		
28/12/2022	343	SE DEJO NOTIFICACION	80/17	EJIDAL	RUPTURA	BANQUETA			ATENDIDO



RENOVAMOS PARA CRECER
SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura
y Obras Públicas

2. Se recibieron 119 solicitudes de permisos para uso de la vía pública, de los cuales se entregaron 87 permisos para uso de la vía pública, de acuerdo a lo siguiente:

Evidencia:

FECHA	NÚMERO DE TÍTULO	ENCARGADO	DETALLE	AFILIADO	SUBCONTRATISTA	PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	POB. PAGOS	FECHA	PAGADO
03/10/2022	291	CHRISTIAN ANTO	COLORADO	GONZALEZ	JUAREZ/25	AVANCIÓN	TAPAL	TAPAL		30/09/2022	\$ 5,000.00
03/10/2022	292	ALEJANDRO	SANCHEZ	RAMIREZ	1307/JUAREZ	BELLAVISTA	RAMPA	RAMPA		27/10/2022	\$ 2,000.00
05/10/2022	293				17/4	CENTRO	FIBRA OPTICA	FIBRA OPTICA		18/10/2022	\$ 1,200.00
05/10/2022	294				JUAREZ/70-60	CENTRO	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA		09/11/2022	\$ 10,600.00
05/10/2022	295				25/95-100	FORADORES	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE		05/10/2022	\$ 1,200.00
05/10/2022	296				5-	CENTRO	REPARACION	REPARACION		21/10/2022	\$ 9/C
06/10/2022	297				33/80-85	EJIDA	TAPAL	TAPAL		06/10/2022	\$ 5,200.00
10/10/2022	298	MIGUEL ANGEL	KURI	UGARTECHA	CALLE 6	CENTRO	POKETAS	POKETAS		14/10/2022	\$ 2,000.00
10/10/2022	299				OLIVOS/IN NOMBRE FLOR DE ROSA LAS FLORES	CENTRO	FIBRA OPTICA	FIBRA OPTICA		24/10/2022	\$ 8,960.00
10/10/2022	300				JUAREZ/2295 SUR	BELLAVISTA	DRENAJE/SANITARIO	DRENAJE/SANITARIO			\$ 3,220.00
11/10/2022	301				DESAEROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	BELLAVISTA	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE		10/11/2022	\$ 4,560.00
11/10/2022	302				DESAEROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	EJIDA	DRENAJE/SANITARIO	DRENAJE/SANITARIO			\$ 3,280.00
11/10/2022	303				DESAEROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	NICTE-HA	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE			\$ 1,000.00
12/10/2022	304				MANATIS, DE N.L. DE C.V.	COLOSIO	TAPAL	TAPAL		24/10/2022	\$ 2,200.00
13/10/2022	305				FIDECOMISO CIB/283 REPRESENTADO POR MOVIA	SMR/NAJULIS-TECNOLOGICO	DRENAJE	DRENAJE			\$ 45,500.00
13/10/2022	306				MALBEC CINCO SA DE CV	10/42	ZUL-HA	TAPAL		17/10/2022	\$ 6,000.00
13/10/2022	307				DESAEROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	30/70-75	EJIDA	AGUA POTABLE		19/10/2022	\$ 1,100.00
13/10/2022	308				BANCO INMOBILIARIO MEXICANO S.A. INSTITUCION	SMR/NAJULIS	CENTRO	AGUA POTABLE		17/10/2022	\$ 3,600.00
13/10/2022	309	ABEL	RODRIGUEZ	ARCEO	CTM/25	COLOSIO	ANDAMIOS	ANDAMIOS		13/10/2022	\$ 1,100.00
14/10/2022	310				5/42-44	COLOSIO	ANDAMIOS	ANDAMIOS			\$ 488.00
14/10/2022	311				48/10-5	COLOSIO	POKETA	POKETA		20/10/2022	\$ 2,000.00
17/10/2022	312				172-24	GONZALO GUBERN	RAMPA	RAMPA		30/10/2022	\$ 800.00
17/10/2022	313				DIVESAS SAN JORGE CASA DE CAMBIOS S.A. DE C.V.	PALMAS I	FIBRA OPTICA	FIBRA OPTICA		24/10/2022	\$ 2,450.00
17/10/2022	314				IBRA CATV, S.A. DE C.V.	CARRANTEL/VEL-HA-CALLE LOS CARNAJAS DEL SOL	AGUA POTABLE	AGUA POTABLE		25/10/2022	\$ 612,802.00
17/10/2022	315				DESAEROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	33/149-145	BELLAVISTA	AGUA POTABLE/DRENAJE			\$ 2,660.00
19/10/2022	316				DESAEROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	6/100	EJIDA	DRENAJE		30/10/2022	\$ 3,380.00
20/10/2022	317	MARIA TERESA DE	CACOA	BRAVO	GAUJANEP/PERICO-CORRIDONES	VILLAS DEL SOL	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA		20/10/2022	\$ 4,000.00
20/10/2022	318				4/20/25	CENTRO	MANOBRRA	MANOBRRA		11/10/2022	\$ 2,500.00
20/10/2022	319				5/48-CTM	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA		11/10/2022	\$ 2,000.00
20/10/2022	320	EDUARDO	CAMPOS	GOMEZ	CONSTITUYENTES/90	EJIDA	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA		21/10/2022	\$ 2,000.00
20/10/2022	321				30/48-50	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA		24/10/2022	\$ 28,000.00
20/10/2022	322				28/1/05	EJIDA	RAMPA	RAMPA		24/10/2022	\$ 1,000.00
24/10/2022	323	VICTORIA	GONZALEZ	JUAREZ	CARR/ED/72-74	EJIDA	TAPAL	TAPAL		24/10/2022	\$ 9,600.00
24/10/2022	324	DERIS	BRITO	WILBERT	26/5-10	XAMAR-HA	CHIMBRA	CHIMBRA		25/10/2022	\$ 800.00
24/10/2022	325				HOSPITAL AMERINDO PLAZA DEL CARMEN SA DE CV	CARR/ED/6-22	RAMPA	RAMPA		24/10/2022	\$ 700.00
27/10/2022	326				ENERGETICOS DE PLAYA SA DE CV	CHERU/PI/CARRIETA FEDERAL	REPARACION	REPARACION		22/11/2022	\$ 6,100.00
27/10/2022	327				FIJOS S.A.P.I. DE C.V.	TECOCANA	CONSTRUCCION BANQUETA	CONSTRUCCION BANQUETA		23/10/2022	\$ 9,000.00
27/10/2022	328				FIJOS S.A.P.I. DE C.V.	TECOCANA	RAMPA	RAMPA		23/10/2022	\$ 800.00
27/10/2022	329				MADEEN EN PLAYA S.A. DE C.V.	28 DE JUL	ENERGIA ELECTRICA	ENERGIA ELECTRICA		10/11/2022	\$ 5,180.00
31/10/2022	330	MANUEL	RAMIRO	HERNANDEZ	DESAEROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	JUAREZ/115-120	RAMPA	AGUA POTABLE/DRENAJE		10/11/2022	\$ 10,400.00
31/10/2022	331				AGUAMAN SOL S.A. DE C.V.	CALLE 14	CENTRO	DRENAJE		03/11/2022	\$ 8,000.00
31/10/2022	332				IBRA CATV SA DE CV	CIBUR/07/PALMAS SOLIDARIDAD	FIBRA OPTICA	FIBRA OPTICA			\$ 27770.00
31/10/2022	333				IBRA CATV SA DE CV	OLIVOS	FIBRA OPTICA	FIBRA OPTICA			\$ 76,450.00
31/10/2022	334				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	VILLAS DEL SOL	FIBRA OPTICA	FIBRA OPTICA			\$ 45,500.00
31/10/2022	335				TOTAL PLAYA TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	CANONIA 17/RAYO BEAL	VILLAS DEL SOL	FIBRA OPTICA		25/11/2022	\$ 65,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS
PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712.
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



DEL 1 AL 30-NOVIEMBRE -2022.

FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POB PAGAR	FECHA	PAGADO
07/11/2022	337				NEUTRAL NETWORKS S. DE R.L. DE C.V.	20/60-85	EIDAL	FIBRA OPTICA		20/11/2022	\$ 10,200.00
08/11/2022	338				TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	10/24.	CENTRO	REGISTRO FIBRA OPTICA	\$ 4,000.00		
08/11/2022	339				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	ANDRES QUINTANA ROO/65	PEDREGAL	DRENAJE	\$	28/11/2022	\$ 3,440.00
09/11/2022	340				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	AV. MEXICO/CALLE RIO DE JANEIRO	VILLAS RIVERA	FIBRA OPTICA	\$ 6,000.00		
11/11/2022	341	NAHEL DE JESUS	Nieto	GARCIA	5/32-30		XAMANHA	MANIOBRA		11/11/2022	\$ 1,000.00
15/11/2022	342	OSCAR	GOMEZ	DE LA FUENTE	55/46-48		PEDREGAL	BANQUETA		16/11/2022	\$ 1,100.00
15/11/2022	343				HSBC MEXICOS.A. INSTITUCION BANCARIA MULTIP	AV. BENITO JUAREZ/25-30	CENTRO	RAMPA		22/11/2022	\$ 4,800.00
15/11/2022	344	JOSE CARLOS	LORIA	CORREA	5/44.		CENTRO	TAPIAL		23/11/2022	\$ 760.00
16/11/2022	345				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN, S.A. DE CV	24/25/4-6.	CENTRO	AGUA POTABLE		16/12/2022	\$ 5,000.00
16/11/2022	346				HOTELERIA KAVIA S.A. DE C.V.	24/115-120	EIDAL	ANDAMIOS		24/11/2022	\$ 41,200.00
17/11/2022	347				SUN TOWERS DEVELOPMENTS S.A.P.I. DE C.V.	1/48-50	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA		25/11/2022	\$ 5,400.00
17/11/2022	348				SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL	PINTORES/PILOMEROS-30	NICTE-HA	AGUA POTABLE-DRENAJE			
24/11/2022	349				GRUPO KATNA SA DE CV	25/30-32	GONZALO GUERRA	TAPIAL-MANIOBRA		09/12/2022	\$ 251,400.00
24/11/2022	350				INDUSTRIA CURATOR SA DE CV	FLOR DE CIRUELO		DRENAJE			
24/11/2022	351				GRUPOS DESARROLLADORA HABITANIA GDH	CTM/15-20	ZAZUL-HA	RAMPA	\$ 3,800.00		
24/11/2022	352				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	CONST/130-135	EIDAL	AGUA POTABLE-DREN		28/11/2022	\$ 5,440.00
25/11/2022	353				OMEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	60/15-10	COLOSIO	TAPIAL-MANIOBRA		25/11/2022	\$ 2,600.00
25/11/2022	354				ACHE DESARROLLOS SA DE CV	5/772.	COLOSIO	CAMINO PEATONAL	\$ 7,854,270.00	02/12/2022	\$ 4,000.00
25/11/2022	355				TOTAL PLAYA TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	SOLIDARIDAD 45	CRISTO REY	FIBRA OPTICA			
28/11/2022	356				UC TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	TORTOLAS/PAVO REAL	LILIS	FIBRA OPTICA		02/12/2022	\$ 191,800.00
30/11/2022	357				SUN TOWER DEVELOPMENTS SAPI DE CV	03/48.	COLOSIO	TAPIAL-MANIOBRA		28/11/2022	\$ 9,400.00
28/11/2022	358	MANUEL	RAMIRO	HERNANDEZ	7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	JUAREZ/115-120	EIDAL	TAPIAL		30/11/2022	\$ 6,000.00
28/11/2022	359				OMEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	5/48-50	COLOSIO	BANQUETA		30/11/2022	\$ 2,400.00
30/11/2022	360					60/15-10	COLOSIO	ANDAMIOS		30/11/2022	\$ 2,000.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PUBLICAS
PLAYA DEL CARNEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



FECHA	NUMERO DE PERMISO	NOVEDADES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POB PAGAR	FECHA	PAGADO					
01/12/2022	361				GRUPO MAYA SA DE CV	25/22-20	GONZALO GUERRA	ENERGIA ELECTRICA		01/12/2022	\$ 38,975.00					
01/12/2022	362				COMPANIA MAYORISTA DE ABARROTES SA DE CV	70/JUAREZ	EIDAL	RANPA		13/12/2022	\$ 8,116.00					
01/12/2022	363				ORLI MANUEL S.A. DE C.V.	1/9-5-00	EIDAL	ANDAMIOS		02/12/2022	\$ 8,000.00					
02/12/2022	364				OMEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	60/04-15	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA		02/12/2022	\$ 2,000.00					
02/12/2022	365				DESARROLLOS EKAS SA DE CV	10/24-	CENTRO	ANDAMIOS		07/12/2022	\$ 2,200.00					
02/12/2022	366				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	PROL. COLOSIO/ABADOSA	MISION DEL CARN	FIBRA OPTICA	\$							
07/12/2022	367				SEJUBA SQUAD MEXICOS DERIL DE CV	1/20-22	GONZALO GUERRA	RANPA	\$	07/12/2022	\$ 1,200.00					
07/12/2022	368				ERASMO MOISES MEZA	80/17-19	EIDAL	BANQUETA	\$							
07/12/2022	369				FLORENTINO VAZQUEZ	25/24-26	GONZALO GUERRA	TAPAL	\$	08/12/2022	\$ 9,440.00					
08/12/2022	370				BORPROPERTY SA DE CV	32/LOTE 11	CENTRO	TAPAL		12/12/2022	\$ 3,410.00					
08/12/2022	371				BRICKBOR SA DE CV	25/4-6	CENTRO	TAPAL		12/12/2022	\$ 2,440.00					
08/12/2022	372				RBA CAT SA DE CV	OLIVOS/SIN NOMBRE	FLORES	FIBRA OPTICA	\$							
08/12/2022	373				SUPER WILLYS SA DE CV	ALONDRAY/CONSTITUYENTES	PISCADORES	ENERGIA ELECTRICA	\$	16/12/2022	\$ 7,000.00					
14/08/12/2022	374				TIERRA MAYA GRUPO INMOB. Y REAL. ESTATES S. DE	17/85-80	EIDAL	AGUA POTABLE/DRENAJE		08/12/2022	\$ 3,840.00					
12/12/2022	375				DESARROLLOS TURISTICOS L.T. SA DE CV	4/20-25	CENTRO	TAPAL		14/12/2022	\$ 5,000.00					
16/12/2022	376				ARQUITECTURAS MAS 4	10/68-50	COLOSIO	TAPAL	\$							
17/12/2022	377				CLAUDIA IBETH AGUIRRE	96/5-10	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA	\$	19/12/2022	\$ 11,000.00					
12/12/2022	378				DESARROLLOS EKAS SA DE CV	10/24 NTE	GONZALO GUERRA	REGISTRO		20/12/2022	\$ 4,000.00					
12/12/2022	379				CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	ENLACE PORTO	PORTO ALTO/MA	FIBRA OPTICA	\$							
20/12/2022	380				UC TELECOMUNICACIONES S.A.P.I. DE C.V.	25/80-	EIDAL	FIBRA OPTICA	\$							
13/12/2022	381				CONSTRUCCIONES ARVESA DE CV	ROMERO/GUERRAS	EIDAL	AGUA POTABLE	\$	14/12/2022	\$ 4,000.00					
13/12/2022	382				JOSE LUIS JIMENEZ	8/9-5	EIDAL	RANPA		14/12/2022	\$ 1,200.00					
15/12/2022	383				CANCELADO											
15/12/2022	384				TOWN TOWER DEVELOPMENT S.A.P.I. DE C.V.	CALLE 26	XAMANHA	BANQUETA	\$							
15/12/2022	385				BORPROPERTY SA DE CV	1/42-	ZAZIL-HA	BANQUETA	\$							
15/12/2022	386				SUN TOWER DEVELOPMENT SAPI DE CV	48/45-50	COLOSIO	BANQUETA	\$							
15/12/2022	387				OPERACIONES COMERCIALES DE LA PENINSULA SA	85/20-22	EIDAL	RANPA	\$							
15/12/2022	388				OPERACIONES COMERCIALES DE LA PENINSULA SA	ALONDRACHIC/CONSTITUYENTES	VILLAS DEL SOL	RANPA	\$							
15/12/2022	389				AUTOMOTORES SIGLO XXI	COLOSIO/ETEMPI/CH	GALAXIA	RANPA	\$							
15/12/2022	390				ENTORNO LUMA S.A.P.I. DE C.V.	45/30-26	GONZALO GUERRA	TAPAL	\$							
16/12/2022	391				DESARROLLOS EKAS SA DE CV	45/30-26	GONZALO GUERRA	RANPA	\$							
16/12/2022	392				PLAYA CALLE 37 S.A.P.I. DE C.V.	38/30-35	ZAZIL-HA	TAPAL	\$							
16/12/2022	393				HOTELERA KAVIA SA DE CV	24/113-120	EIDAL	ENERGIA ELECTRICA								
19/12/2022	394				FRANCISCO JAVIER AVILES	15/38-40	ZAZIL-HA	TAPAL								
19/12/2022	395				BORPROPERTY SA DE CV	42/5-1	ZAZIL-HA	TAPAL								
19/12/2022	396				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN S.A. DE C	31/SOL-CADABAS	EIDAL	ENERGIA ELECTRICA								
19/12/2022	397				HOTEL KM. S.A. DE C.V.	42/20-15	ZAZIL-HA	DRENAJE/POTABLE								
20/12/2022	398				HOTELERA KAVIA S.A. DE C.V.	24/113-115	ZAZIL-HA	TAPAL	\$	22/12/2022	\$ 2,000.00					
20/12/2022	399				HOTELERA KAVIA S.A. DE C.V.	24/113-115	EIDAL	RANPA	\$							
20/12/2022	400				HOTELERA KAVIA S.A. DE C.V.	24/113-	EIDAL	TAPAL	\$							
20/12/2022	401				JUAN DAVID MARQUEZ	82/5-10	COLOSIO	TAPAL		20/12/2022	\$ 2,300.00					
20/12/2022	402				JORGE GILBERTO PARRA	COLOSIO/096	COLOSIO	TAPAL		20/12/2022	\$ 7,000.00					
22/12/2022	403				DAVID GUILLERMO ALONSO	68/20-15	COLOSIO	DRENAJE/SANITARIO	\$	22/12/2022	\$ 3,380.00					
26/12/2022	404				VELAZQUEZ	JUAREZ/30	COLOSIO	ANDAMIOS	\$							
26/12/2022	405				NWIRH SA DE CV	PASEO DEL MAYAB/UNIVERSIDADES	GUADALUPANA	ENERGIA ELECTRICA	\$							
26/12/2022	406				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	8/MIUN-35	MAYA OCEAN CONI	FIBRA OPTICA	\$							
26/12/2022	407				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	23/JUAREZ	CENTRO	FIBRA OPTICA	\$							
26/12/2022	408				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	PLAYA DEL CARMEN/TITAL	GEDIS MAHARAJAH	FIBRA OPTICA	\$							
27/12/2022	409				GRUPO ASRNO S.A. DE C.V.	42/20-15	ZAZIL-HA	TAPAL	\$	27/12/2022	\$ 2,000.00					
28/12/2022	410				MARIA JUSTA GUTIERREZ	17/80-85	EIDAL	BANQUETA		28/12/2022	\$ 6,400.00					



Elaboró: Ing. Yalit Guzmán González, Profesional Especializado de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

RESPONSABLE

Arq. Fabián Antonio Herrera Quiam
Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.

AUTORIZA

Ing. Teresita del Niño Jesús Flota Alcocer
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Unidad Responsable:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS	
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL	
Programa de Desarrollo PMD	II. URBANIZACIÓN CON ARMONIA	
Linea de acción PMD	9. CONTINUAR CON LOS ESFUERZOS DE DIGITALIZACIÓN Y AGILIZACIÓN DE TRAMITES	
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE OCTUBRE 2022	AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022.

Objetivo del Proyecto: Contribuir con la regulación y agilización de trámites aplicando las disposiciones normativas, en beneficio de la población del Municipio de Solidaridad.

Descripción de la Actividad: Recabar los documentos requeridos para que la población solidarense cuente con la atención oportuna del trámite o documento que requiere.

Población objetivo: La población del Municipio de Solidaridad

Actividad/Proyecto:

1. Se expiden Constancias de cooperación por obra pública

Mes	Num. de Constancias Expedidas	Monto Recaudado
Octubre	779	\$ 2'707,925.00
Noviembre	870	\$ 2'662,846.00
Diciembre	683	\$ 2'145,661.00
Total	2332	\$ 7'516,432.00

2. Se realiza alta al padrón de contratistas del Municipio de Solidaridad.

Mes	Inscripciones realizadas	Monto Recaudado
Octubre	2	\$ 600.00
Noviembre	1	\$ 300.00
Total	3	\$900.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 a 2024



3. Se realiza expedición de pases a caja para pago de bases de concurso de obra, para las empresas contratistas que requieren participar en procesos de licitación de obra pública.

Mes	Bases de Concurso de Obra	Monto Recaudado
Octubre	11	\$ 55,000.00
Noviembre	8	\$ 40,000.00
Total	19	\$ 95,000.00

Elaboró: Ing. Yalit Guzmán González, Profesional Especializado de la Subsecretaria de Infraestructura y Obras Públicas.

+

RESPONSABLE

Arq. Fabián Antonio Herrera Quiam
Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.

AUTORIZA

Ing. Teresita del Niño Jesús Flota Alcocer
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y OBRAS PÚBLICAS
CARRILLO DEL CARMEN, QUINTANA ROO
2021 - 2024
