



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 2024

Secretaría de **Infraestructura**  
y **Obras Públicas**

# INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

## SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDO TRIMESTRE:  
01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

EJERCICIO FISCAL 2022



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE JULIO DE 2022.



OBRAS PÚBLICAS REALIZADAS	
Unidad Responsable:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Programa de Desarrollo PMD	III. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Línea de acción PMD:	5.- ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE ABRIL 2022 AL: 30 DE JUNIO 2022

**Objetivo del Proyecto:** Contribuir a que la infraestructura del municipio sea moderna, funcional y cumpla cabalmente con las necesidades de la población y de quienes lo visitan mediante la entrega de una eficiente infraestructura urbana.

**Descripción de la actividad/Proyecto:** Se trabaja en la elaboración de Proyectos Ejecutivos de obra pública, los cuales están integrados por memorias descriptivas, planos arquitectónicos, especificaciones técnicas, catálogo de conceptos, programas de ejecución, etc., se realiza la contratación de la obra pública y los servicios relacionados con los mismos, cumpliendo con la supervisión de la construcción y con la normatividad aplicable al fondo de financiamiento y se integra el expediente técnico unitario de cada una de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a efecto de documentar la cuenta pública.

**Población Objetivo:** La población del Municipio de Solidaridad

**Avances del Proyecto Obra Pública Realizada:**

Se programaron 55 Obras Públicas a realizarse durante el ejercicio fiscal 2022, de los cuales se tiene una obra pública realizada, es decir, se encuentra con un avance constructivo del 100%; esta obra corresponde a "Reparación De Socavón En La Calle Ira Entre Avenida 30 Y Calle 35 Del Municipio De Solidaridad." cuya inversión final es de \$ 996,856.74, realizándose en beneficio de 333,800 habitantes.

**Resultados Actividad 1:** Se integran y validan 26 proyectos ejecutivos, de acuerdo a lo siguiente:

**Inversión Programada con Recursos Fiscales:**

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Habitantes Beneficiarios
1. Reparación de Vialidades en Diversos Puntos de Playa del Carmen	\$ 6,780,000.00	333400
2. Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad	\$ 2,489,600.00	333400
3. Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad	\$ 4,485,580.00	333400
4. Rehabilitación de las oficinas de la Secretaria de Justicia Cívica.	\$ 2,000,000.00	333400

AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



**Recursos Ramo 33 FORTAMUN:**

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Habitantes Beneficiados
5. Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Av. 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad	\$ 12,057,552.00	3349
6. Construcción de Alumbrado Público en Avenida Sur entre Avenida 115 a la Avenida 75 del Municipio de Solidaridad	\$ 4,186,650.00	6708
7. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad	\$ 1,800,000.00	34365
8. Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras.	\$ 2,000,000.00	22878
9. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad	\$ 2,000,000.00	333400
10. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Poliforum del Municipio de Solidaridad	\$ 5,000,000.00	333400
11. Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad	\$ 10,885,290.00	8708
12. Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Primera Etapa	\$ 5,350,000.00	333800
13. Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Segunda Etapa	\$ 5,350,000.00	333800
14. Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Mario Villanueva del Municipio de Solidaridad	\$ 5,847,360.00	333400
15. Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad	\$ 3,961,450.00	333400
16. Rehabilitación del Mercado Municipal Diana Laura Riojas en la Colonia Luis Donaldo Colosio.	\$ 3,000,000.00	25000
17. Pavimentación de Av. 70 Norte entre Av. Constituyentes y Calle 36 Norte en la Colonia el Pedregal.	\$ 1,920,000.00	1800
18. Rehabilitación de Parques para Actividades de Recreación y Esparcimiento en el Municipio de Solidaridad.	\$ 7,500,000.00	333400
19. Construcción de Guarniciones y Banquetas de la Av. CTM entre Av. 115 a Carretera Federal y Av. 115 entre Calle Coba a Av. Sur del Municipio de Solidaridad.	\$ 7,156,550.00	8708
20. Pavimentación de Carpeta Asfáltica de la Av. Diag. 65 entre av. CTM y Av. Colosio	\$ 30,000,000.00	333400
21. Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad, Segunda Etapa.	*se omite dato por estar en proceso de licitación	333400



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Nombre del Proyecto	Monto Validado	No. De Habitantes Beneficiados
22. Pavimentación de Carpeta Asfáltica en la Calle Lirios entre Calle Ceiba y Calle Caoba	*se omite dato por estar en proceso de licitación	11132
23. Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas de la Avenida 75 entre Calle 36 Norte y Avenida Sur, en el Municipio de Solidaridad	*se omite dato por estar en proceso de licitación	51600



24. Pavimentación de la Avenida Diag. 65 entre Av. CTM y Av. Sur.	*se omite dato por programación de licitación	333400
25. Construcción de Subestación Eléctrica de 112.5 kva para el Centro de Inteligencia y Monitoreo Urbano de Solidaridad (CIMUS).	*se omite dato por programación de licitación	333400
26. Construcción de Nichos en el Panteón Municipal de la Colonia Luis Donaldo Colosio de Playa del Carmen.	*se omite dato por estar en proceso de licitación	333400

**Resultados de la Actividad 2.** Se realiza integración de 20 expediente de licitación de obra pública, conteniendo la propuesta técnica, propuesta económica, proyecto ejecutivo, convocatoria, visita de obra, junta de aclaraciones, acta de apertura de propuestas, dictamen técnico-económico, acta de fallo, contrato y fianzas correspondientes, para los siguientes:

No.	CON RECURSOS FISCALES
1	Elaboración, Gestión y Seguimiento de Tramites Estatales y/o Federales en Materia de Impacto Ambiental del H. Ayuntamiento de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 11 de abril del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SlyOP-RF-001-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 996,856.74
2	Reparación de Vialidades en Diversos Puntos de Playa del Carmen. <b>Firma de Contrato</b> 01 de junio del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SlyOP-RF-015-2022 <b>Monto Contratado</b> 6,766,012.82
3	Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 07 de junio del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SlyOP-RF-016-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 4,470,125.54
4	Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 07 de junio del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SlyOP-RF-017-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 2,408,354.39



**H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024**

No.	CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN
5	Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 25 de abril del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SlyOP-FORTAMUN-003-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 6,947,943.41
6	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 16 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SlyOP-FORTAMUN-005-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 1,796,371.88
7	Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras. <b>Firma de Contrato</b> 16 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SlyOP-FORTAMUN-006-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 1,971,948.54



No. CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN	
8	<p>Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Primera Etapa. <b>Firma de Contrato</b> 24 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-007-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 5,335,657.34</p>
9	<p>Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Segunda Etapa. <b>Firma de Contrato</b> 24 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-008-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 5,342,405.40</p>
10	<p>Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 30 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-009-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 1,982,799.82</p>
11	<p>Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad Deportiva Poliforum del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 30 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-010-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 4,953,391.50</p>
12	<p>Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Mario Villanueva del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 30 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-011-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 5,836,182.21</p>
13	<p>Rehabilitación del Mercado Municipal Diana Laura Riojas en la Colonia Luis Donaldo Colosio. <b>Firma de Contrato</b> 31 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-012-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 2,995,712.81</p>
14	<p>Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 31 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-013-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 3,947,969.01</p>
15	<p>Pavimentación de Av. 70 Norte entre Av. Constituyentes y Calle 36 Norte en la Colonia el Pedregal. <b>Firma de Contrato</b> 31 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-014-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 1,918,026.35</p>
16	<p>Rehabilitación de Parques para Actividades de Recreación y Esparcimiento en el Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 08 de junio del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-019-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 7,488,132.64</p>
17	<p>Construcción de alumbrado público en avenida Sur entre avenida 115 a la avenida 75 del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 28 de junio 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-020-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 4,175,172.14</p>
18	<p>Construcción de guarniciones y banquetas en avenida Sur entre avenida 115 a la avenida 75 del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 28 de junio del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-021-2022 <b>Monto Contratado</b> \$ 6,481,820.03</p>



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



No. CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN	
19	<p>Construcción de guarniciones y banquetas de la Av. CTM entre Av. 115 a Carretera Federal, y Av. 115 entre Calle Coba a Av. Sur del Municipio de Solidaridad.  <b>Firma de Contrato</b> 29 de junio del 2022  <b>N° Contrato</b> HAS-SlyOP-FORTAMUN-022-2022  <b>Monto Contratado</b> \$ 7,151,693.74</p>
20	<p>Pavimentación de carpeta asfáltica de la Av. Diag. 65 entre Av. CTM y Av. Colosio.  <b>Firma de Contrato</b> 29 de junio del 2022  <b>N° Contrato</b> HAS-SlyOP-FORTAMUN-023-2022  <b>Monto Contratado</b> \$ 29,989,558.18</p>



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

**Resultados de la Actividad 3.** Se realiza supervisión de la obra pública contratada, teniendo los siguientes avances.

**Obras Concluidas:**

NUM.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FISICO
1	RECURSO FISCAL	REPARACIÓN DE SOCAVÓN EN LA CALLE 1RA ENTRE AVENIDA 30 Y CALLE 35 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-RF-002-2022	26-mar-22	24-abr-22	100.00%



Evidencia Obras Concluidas:




CONTRATO: HAS-SIOP-RF-002-2022

OBRA: REPARACION DE SOCAVON EN LA CALLE 1RA ENTRE AVENIDA 30 Y CALLE 35 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD.

MONTO DE CONTRATO: \$996.856.74 IVA INCLUIDO  
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
EMPRESA: GEA CONSTRUCCIONES EXACTAS, S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 31 de mayo de 2022  
AVANCE PROGRAMADO: 100.00%  
AVANCE FISICO: 100.00%  
AVANCE EN ESTIMACION: 100.0%

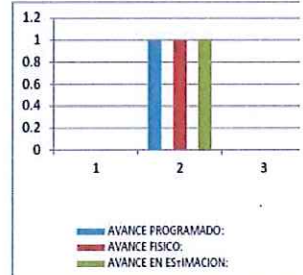


ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

SE FINALIZA LA OBRA

OBSERVACIONES:

SE CONCLUYE CON LA OBRA AL 100% DE LOS TRABAJOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD.
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	450.00	100.00%	M2
SONDEOS	4.00	100.00%	PZA
ESTUDIO GEOFISICO	1.00	100.00%	PZA
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO C	141.00	100.00%	M3
CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS CORTES	237.33	100.00%	M3
RELLENO Y CON PIEDRA CALIZA	85.80	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL	45.00	100.00%	M3
DEMOLICION DE BANQUETA	75.00	100.00%	M2
BANQUETA DE CONCRETO	75.00	100.00	M2
EXT01 RELENO	16.58	100.00	M3
EXT02 GRAVA	16.58	100.00	M3
EXT03 MAMPOSTERIA	61.43	100.00	M3
EXT04 RELLENO PARA BANQUETA	9.00	100.00	M3
EXT05 ESCARIFICADO	353.88	100.00	M2

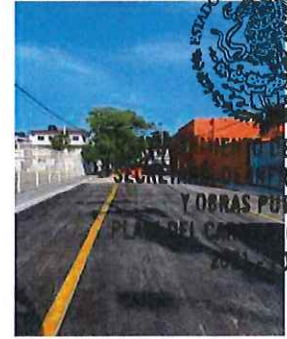

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2024

*[Handwritten signature]*



**Obras en Proceso:**

No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FISICO
				INICIO	TERMINO	
1	RECURSO FISCAL	"ELABORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE TRAMITES ESTATALES Y/O FEDERALES EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-RF-001-022	13-abr-22	30-nov-22	27.00%
2	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 115 Y AVENIDA 75 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-003-2022	27-abr-22	25-jul-22	20.00%
3	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-005-2022	18-may-22	30-ago-22	38.00%
4	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BÉISBOL DE LA LOCALIDAD DE PUERTO AVENTURAS."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-006-2022	18-may-22	15-ago-22	30.00%
5	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRIMERA ETAPA."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-007-2022	26-may-22	22-sep-22	0.00%
6	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE 50 POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-008-2022	26-may-22	22-sep-22	1.00%
7	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA RIVIERA MAYA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-009-2022	01-jun-22	29-ago-22	2.00%
8	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA POLIFORUM DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-010-2022	01-jun-22	29-ago-22	5.00%
9	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA MARIO VILLANUEVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-011-2022	01-jun-22	29-ago-22	0.00%
10	FORTAMUN	"REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DIANA LAURA RIOJAS EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-012-2022	02-jun-22	29-sep-22	14.00%
11	FORTAMUN	"CONSTRUCCIÓN DE PASOS PEATONALES EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-013-2022	02-jun-22	29-sep-22	2.00%
12	FORTAMUN	"PAVIMENTACIÓN DE AV. 70 NORTE ENTRE AV. AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 36 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL."	HAS-SlyOP-FORTAMUN-014-2022	02-jun-22	31-jul-22	25.00%
13	RECURSO FISCAL	"REPARACIÓN DE VIALIDADES EN DIVERSOS PUNTOS DE PLAYA DEL CARMEN."	HAS-SlyOP-RF-015-2022	03-jun-22	30-oct-22	25.00%
14	RECURSO FISCAL	CONSTRUCCIÓN DE CREMATARIO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SlyOP-RF-016-2022	13-jun-22	10-sep-22	8.00%
15	RECURSO FISCAL	REHABILITACIÓN DE PARADEROS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SlyOP-RF-017-2022	13-jun-22	10-sep-22	10.00%







No.	FONDO DE FINANCIAMIENTO	OBRA	CONTRATO	PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCE FISICO
				INICIO	TERMINO	
16	FORTAMUN	REHABILITACIÓN DE PARQUES PARA ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD	HAS-SlyOP-FORTAMUN-019-2022	14-jun-22	11-oct-22	6.00%

**Evidencia de obras en proceso:**




CONTRATO: HAS-SlyOP-FORTAMUN-003-2022

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE AVENIDA SUR ENTRE AVENIDA 119 Y AVENIDA 73 DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

MONTO DE CONTRATO: \$6,947,943.41 IVA INCLUIDO  
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.  
EMPRESA: INTERMAYA DEL CARIBE S.A DE C.V

FECHA DE REPORTE: 30 de Junio de 2022  
AVANCE PROGRAMADO: 18.00%  
AVANCE FISICO: 20.00%  
AVANCE EN ESTIMACION:

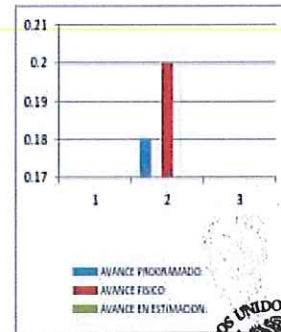

**ETAPA DE LA OBRA**

**FOTOGRAFÍAS**

LA OBRA DE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE TERRACERIAS.


**OBSERVACIONES:**

ACTUALMENTE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE SUMINISTRO DE BASE HIRAUICA, FORMACION Y CONSTRUCCION DE CAPTADORES.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO	2,000.00	1.36%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	200.00	1.50%	M3
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO C	133.07	1.42%	M3
BANDEO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES	390.05	0.33%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL	1,127.00	9.66%	M3
FORMACION Y COMPACTACION	200.00	3.00%	M3
CAPTADORES	4.00	3.00%	PZA



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

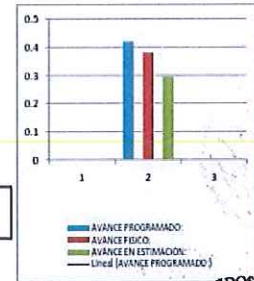

CONTRATO: HAS-SlyOP-FORTAMUN-005 - 2022

FECHA DE REPORTE: 20 DE JUNIO DE 2022

OBRA: "Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad"

AVANCE PROGRAMADO: 41.92%

AVANCE FÍSICO: 38.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 29.40%

FECHA INICIO: 18 DE MAYO DE 2022

FECHA TERMINO: 30 DE AGOSTO DE 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 1,796,371.88 IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: "CONSTRUCCIONES BAUFI S.A. DE C.V."

CONVENIO MODIFICATORIO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE INICIO: \_\_\_\_\_  
FECHA DE TERMINO: \_\_\_\_\_  
MONTO DE CONVENIO: \_\_\_\_\_  
IVA INCLUIDO

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
CANCHA DE FUTBOL Y DOMO DE BOX	
OBSERVACIONES:	

SE REALIZAN LOS TRABAJOS DE DETALLES EN LA CANCHA DE FUTBOL Y SE ESTA PINTANDO LA MALLA PERIMETRAL. SE TRABAJA EN LA PUERTA DE ACCESO. EN EL AREA DE PORTERIAS Y SE CONTINUAN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ELECTRICIDAD EN EL AREA DEL DOMO DE BOX.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
<b>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIO</b>			
A.- PRELIMINARES		100%	
B.- MALLA CICLONICA Y PORTERIAS		90%	
C.- PISO DE CANCHA DE FUTBOL		85%	
D.- ALBANILERIA PORTERIAS DE CANCHA		35%	
E.- GIMNASIO DE BOX		15%	
F.- ADECUACION DESCARGA PLUVIAL Y REGISTRO		15%	
G.- INSTALACION ELECTRICA		30%	



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



CONTRATO: **HAS-SyOP-FORTAMUN-006 - 2022**

OBRA: **"Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Béisbol de la Localidad de Puerto Aventuras"**

FECHA INICIO: **18 DE MAYO DE 2022**

FECHA TERMINO: **15 DE AGOSTO DE 2022**

MONTO DE CONTRATO: **\$ 1,971,948.54 IVA INCLUIDO**

LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

EMPRESA: **"GESTIONA VERDE S. DE R. L. DE C.V."**

FECHA DE REPORTE: **30 DE JUNIO DE 2022**

AVANCE PROGRAMADO: **48.99%**

AVANCE FISICO: **30.00%**


AVANCE EN ESTIMACION: **29.00%**

CONVENIO  
MODIFICATORIO:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

MONTO DE CONVENIO: **IVA INCLUIDO**

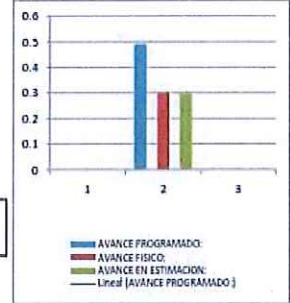

ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
PRELIMINARES, MANTENIMIENTO EN SANITARIOS, HERRERIAS E INSTALACION ELECTRICA	
OBSERVACIONES:	

SE AVANZA EN LOS TRABAJOS DE HERRERIA EN BARRA CON MALLA ATRAPA PELOTAS Y LA MESETA DE LOS LAVABOS. SE CORREN NIVELES EN LOS ANDADORES INTERIORES Y SE DESMONTAN LAS LUMINARIAS PARA CORREGIR LOS POSTES DE ILUMINACION

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
<b>REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE BEISBOL</b>			
A - PRELIMINARES		90%	
B - MANTENIMIENTO EN SANITARIOS		75%	
C - HERRERIAS		50%	
D - OBRA EXTERIOR HIDROSANITARIAS		50%	
E - ALBAÑILERIA		25%	
F - BARRAS		10%	
G - FACHADA Y ACCESOS		0%	
H - ALBAÑILERIA INTERIOR		30%	
I - HABILITADO DE BODEGAS BAJO GRADAS		70%	
J - INSTALACION ELECTRICA		25%	



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
INFRAESTRUCTURA  
PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024







H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

CONTRATO: HAS-SOP-FORTAMUN-012-2022

OBRA: Rehabilitación del Mercado municipal Diana Laura Rojas en la colonia Luis Donaldo Coloso

FECHA INICIO: 02 de Agosto de 2022

FECHA TERMINO: 29 de Septiembre de 2022

MONTO DE CONTRATO: \$ 2,995,712.81

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: CLINKER DESARROLLOS INTEGRALES, S. DE RL DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 29 de agosto de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 24%

AVANCE FISICO: 14%

AVANCE EN ESTIMACIÓN: 0%

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

MONTO DE CONVENIO:



ETAPA DE LA OBRA			
<b>OBSERVACIONES:</b>			
SE ESTAN REALIZANDO TRABAJOS DE DESMANTELAMIENTO DE WC, LAVABOS Y MIRRORIOS EN EL SANITARIO DE CABALLEROS, COLOCACION DE PISO, REAFRANCION DE RAMPLAS EN FIRME DE LOCALES, RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE			
<b>ALCANCES</b>			
PARTIDAS	CANTIDAD	EJECUTADO	UNIDAD
<b>PRELIMINARES</b>			
DESMANTELAMIENTO DE TANQUES DE GAS ESTACIONARIO	10	100%	PZA
DESMANTELAMIENTO DE TUBERIA EXISTENTE	240	100%	ML
COLOCACION DE BASES	60	100%	PZA
REPARACION DE FIBRAS EN MURDO	100	100%	ML
<b>SANITARIO CABALLEROS</b>			
DESMANTELAMIENTO DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
DESMANTELAMIENTO DE WC	2.00	100%	PZA
COLOCACION DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
RECUBRIMIENTO PARA MISETA	0.26	100%	M2
COLOCACION DE PISO	10.50	100%	M2
<b>SANITARIO DAMAS</b>			
DESMANTELAMIENTO DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
DESMANTELAMIENTO DE WC	3.00	100%	PZA
COLOCACION DE LAVABOS	2.00	100%	PZA
COLOCACION DE WC	3.00	100%	PZA
COLOCACION DE PISO	10.50	100%	M2
RECUBRIMIENTO PARA MISETA	0.26	100%	M2
COLOCACION DE COCADERA	1.00	100%	PZA
<b>HABILITACION DE LOCALES PLANTA ALTA</b>			
REPARACION DE RAMPLAS EN FIRME	343.84	70%	ML
<b>IMPERMEABILIZACION</b>			
RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE	2707.18	90%	M2







CONTRATO: HAS-SI-OP-FORTAMUN-014-2022

OBRA: "REPAVIMENTACION DE LA AV. 70 NORTE ENTRE AV. CONSTITUYENTES Y CALLE 30 NORTE EN LA COLONIA EL PEDREGAL"

MONTO DE CONTRATO: \$1,918,026.35 IVA INCLUIDO

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.

EMPRESA: CONSTRUCTORA IMMUSUR, S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 30 de Junio de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 30.00%

AVANCE FISICO: 23.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 0.0%



ETAPA DE LA OBRA

FOTOGRAFIAS

EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

SE ESTA TRABAJANDO EN EL TRABAJOS PRELIMINARES, TERRACERIAS Y PERFORACION DE POZOS, SUMINISTRO DE MATERIAL CEMENTANTE, FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
TRAZO Y NIVELACION	1,304.60	100.00%	M2
DESPALME DE MATERIAL VEGETAL	601.92	100.00%	M2
RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE	156.50	100.00%	M3
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	250.27	100.00%	M3
SUMINISTRO DE MATERIAL	307.15	100.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	307.15	100.00%	M3
PERFORACION DE POZO DE ABSORCION	60.00	100.00%	ML



*[Handwritten signature]*





CONTRATO: HAS-SIvOP-RF-015-2022

OBRA:

"REPARACION DE VIALIDADES EN DIVERSOS PUNTOS DE PLAYA DEL CARMEN"

MONTO DE \$6,766,012.82 IVA INCLUIDO

CONTRATO: PLAYA DEL CARMEN SOLIDARIDAD QUINTANA ROO

EMPRESA: CONSTRUCTORA RIVAL S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE: 30 de Junio de 2022

AVANCE PROGRAMADO: 22.00%

AVANCE FISICO: 25.00%

AVANCE EN ESTIMACION: 0.0%



ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
------------------	-------------

EN PROCESO DE EJECUCION DE ACUERDO AL CONTRATO.

OBSERVACIONES:

SE ESTA TRABAJANDO EN EL CRUCERO DE LA 115 AVENIDA NORTE CON AVENIDA PASEO CENTRAL Y EL CRUCERO DE LA AV. XPUHA Y AVENIDA PASEO CENTRAL

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNID AD
DEMOLICION DE PAVIMENTO	1,089.77	50.00%	M3
TRAZO Y NIVELACION	7,629.53	50.00%	M2
EXCAVACION EN CAJA MATERIAL TIPO B	545.18	50.00%	M3
AFINE Y COMPACTACION DE FONDO DE EXCAVACION	7,629.53	50.00%	M2
SUMINISTRO DE MATERIAL	1,330.87	25.00%	M3
FORMACION Y COMPACTACION DE TERRACERIAS	1,330.87	25.00%	M3
RIEGO DE LIGA	7,629.53	15.00%	M2
CARPETA AFALTICA	7,629.53	15.00%	M2



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024





CONTRATO: HAS-SI/OP-RF-016-2022  
OBRA: "Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad".

FECHA DE REPORTE: 30 de Junio de 2022  
AVANCE PROGRAMADO: 13.00%  
AVANCE FÍSICO: 6.00%

FECHA INICIO: 13 DE JUNIO DEL 2022  
FECHA TERMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022  
MONTOS DE CONTRATO: \$4,478,123.34

REPROGRAMACION

CONVENIO: HAS-SI/OP-RF-016-2022

CONVENIO: HAS-SI/OP-RF-016-2022

FECHA INICIO: 13 DE JUNIO DEL 2022  
FECHA TERMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FECHA INICIO: 13 DE JUNIO DEL 2022  
FECHA TERMINO: 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN, MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  
EMPRESA: INGENIERIA Y DISEÑO ESPECIALIZADO DE LA RIVIERA S.A DE C.V



ETAPA DE LA OBRA	FOTOGRAFIAS
PRELIMINARES	
OBSERVACIONES:	

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2024

SE COLARON CADENAS DE DESPLANTE EN AREA DE PREPARACION, SE EXCARVA Y HABILITA ACERO PARA CADENAS DE DESPLANTE Y COLUMNAS DEL AREA DE CREMACION



ALCANCES			
CONCEPTOS	CLAVE	CANTIDAD	% AVANCE
PRELIMINARES	A	0.89%	0.89%
CIMENTACION	B	6.31%	3.00%
ESTRUCTURA	C	17.12%	2.00%
ALBAÑERIA Y ACABADOS	D	12.59%	0.00%
CANCELERIA Y HERRERIA	E	1.42%	0.00%
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	F	0.51%	0.00%
INSTALACIONES ELECTRICAS	G	7.56%	0.00%
JARDENERIA	H	0.8%	0.00%
OBRA EXTERIOR	I	30.74%	0.00%
AREA PREPARACION DE CUERPOS	J	0.50%	0.00%
AREA SALA VELACION	R	0.72%	0.00%
TOTAL		100%	6%




CONTRATO: **HAS-SyOP-RF-017-2022**  
OBRA: **"Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad"**

FECHA INICIO: **13 DE JUNIO DE 2022**  
FECHA TERMINO: **30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
MONTO DE CONTRATO: **\$ 2,408,354.39 IVA INCLUIDO**  
LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO**  
EMPRESA: **ACEROS Y PERFILES DEL CARIBE S.A. DE C.V.**

FECHA DE REPORTE: **30 DE JUNIO DE 2022**  
AVANCE PROGRAMADO: **20.00%**  
AVANCE FISICO: **10.00%**  
AVANCE EN ESTIMACION: **0.00%**

CONVENIO MODIFICATORIO: **FECHA DE INICIO: FECHA DE TERMINO: MONTO DE CONVENIO: IVA INCLUIDO**

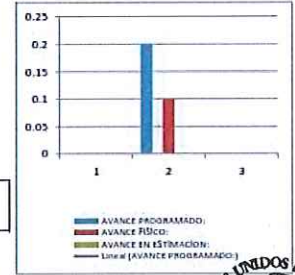


ETAPA DE LA OBRA
PRELIMINARES, MANUTENIMIENTO EN SANITARIOS, HERRERIAS Y OBRA EXTERIOR
OBSERVACIONES:

FOTOGRAFIAS
-------------

SE INICIARON LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES Y PAVIMENTACION EN EL PARADERO UBICADO EN LA AVENIDA COLOSIO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA 115 NORTE.

CONCEPTOS	CANTIDAD	% AVANCE	UNIDAD
<b>REHABILITACION DE PARADEROS EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD</b>			
<b>A.1 PARADERO AVENIDA COLOSIO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y AVENIDA 113 NORTE</b>			
A.1.1 PRELIMINARES		50%	
A.1.2 ESTRUCTURA METALICA		10%	
A.1.3 ILUMINACION		0%	
A.1.4 GUARNICIONES Y BANQUETAS		10%	
A.1.5 PAVIMENTACION		25%	
<b>A.2 PARADERO AVENIDA 28 DE JULIO ENTRE CALLE TULUM Y CALLE COBA</b>			
A.2.1 ESTRUCTURA METALICA		0%	
A.2.2 ILUMINACION		0%	
A.2.3 GUARNICIONES Y BANQUETAS		0%	
<b>A.3 PARADERO AVENIDA CTM ENTRE AV. 115 NORTE Y AV. CEMURYL</b>			
A.3.1 PRELIMINARES		0%	
A.3.2 ESTRUCTURA METALICA		0%	
A.3.3 ILUMINACION		0%	
A.3.4 GUARNICIONES Y BANQUETAS		0%	



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



CONTRATO: **IAS-SAC-PT-FORTAMUN-018-2022**

ODR: **Rehabilitación de parques para actividades de recreación y esparcimiento en el Municipio de Solidaridad**

FECHA INICIO: **14 de Agosto de 2022**

FECHA TERMINO: **11 de Octubre de 2022**

MONTO DE CONTRATO: \$ **7,488,132.64**

LOCALIDAD: **PLAYA DEL CARMEN, SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.**

EMPRESA: **CONSTRUDUAL SERVICIOS Y DISEÑO, S.A. DE C.V.**

FECHA DE REPORTE: **30 de Septiembre de 2022**

AVANCE PROGRAMADO: **14%**


AVANCE FÍSICO: **6%**

AVANCE EN ESTIMACIÓN: **0%**

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO:

MONTO DE CONVENIO:



**ETAPA DE LA OBRA**

SE ESTÁN REALIZANDO TRABAJOS DE RETIRO DE FALDÓN EN EL DOMO DEL PARQUE LÁZARO CÁRDENAS, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS DE LA CASETA DE VIGILANCIA DEL PARQUE NICTE HA, EXCAVACIÓN PARA GIMENTACIÓN, DEMOLICIÓN DE MUROS DE BLOQUE EXISTENTE EN EL PARQUE DEL PETÉN, RETIRO DE MALLA CICLÓNICA EN CAICHA DE FUTBOL EN EL PARQUE ECOLOGICO DE LA GUADALUPANA.

ALCANCES			
PARTIDAS	CANTIDAD	EJECUTADO	UNIDAD
<b>PARQUE NICTE HA</b>			
RETIRO DE ACONCRETO	2	100%	M2
RETIRO DE TUBERIA EN DREN COLECTOR	30	100%	ML
RETIRO DE GRAVA EXISTENTE EN DREN COLECTOR	0.01	100%	M3
DESARROLVE DE POZO DE ABSORCIÓN	1	100%	PZA
PERFORACION DE POZO DE ABSORCIÓN	1	50%	PZA
<b>PARQUE EL PETEN</b>			
RETIRO DE PASTO SINTETICO EN CAICHA DE FUTBOL	320	100%	M2
RETIRO DE ESTRUCTURA METALICA CON MALLA CICLONICA	38.40	100%	M2
CONDICION DE GRABACION	32.50	100%	ML
GRABACION EN PISO DE CONCRETO	40.50	100%	ML
<b>PARQUE GUADALUPANA CALLE JUVENTUD</b>			
RETIRO DE CAJON EXISTENTE	65.00	50%	ML
RETIRO DE PASTO SINTETICO EXISTENTE	518.40	100%	M2
RETIRO DE MALLA CICLONICA	113.40	100%	M2
<b>PARQUE GUADALUPANA ECOLOGICO</b>			
RETIRO DE MALLA CICLONICA	387.00	100%	M2
RETIRO DE PASTO SINTETICO	1167.48	100%	M2
RETIRO DE PLASTIMADERA EN BAFANDAL	28.00	100%	ML
DESAMTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA	242.35	100%	M2
<b>PARQUE LAZARO CARDENAS</b>			
DESAMTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA	174.00	100%	M2
RETIRO DE FALDON LATERAL	37.00	100%	ML
DESAMTELAMIENTO DE MALLA CICLONICA FUTBOL	272.00	100%	M2





**Resultados de la Actividad 4.** Se da seguimiento a la integración de 16 Expediente Técnicos Unitarios de Obra Pública, conteniendo la evidencia de la planeación, contratación, ejecución y control de las obras Públicas que realiza la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas:

No.	CON RECURSOS FISCALES
1	Elaboración, Gestión y Seguimiento de Trámites Estatales y/o Federales en Materia de Impacto Ambiental del H. Ayuntamiento de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 11 de abril del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-RF-001-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
2	Reparación de socavón en la Calle 1ra. Entre Avenida 30 y calle 35 del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-RF-002-2022 <b>Avance de Integración: 90%</b>
	<b>Firma de Contrato</b> 01 de junio del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-RF-015-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
4	Construcción de Crematorio en el Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 07 de junio del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-RF-016-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
5	Rehabilitación de Paraderos en el Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 07 de junio del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-RF-017-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

No.	CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN
6	Construcción de Pavimentación de Avenida Sur entre Avenida 115 y Avenida 75 del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 25 de abril del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-003-2022 <b>Avance de Integración: 43%</b>
7	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 16 de mayo del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-005-2022 <b>Avance de Integración: 42%</b>
8	Rehabilitación y Mantenimiento del Campo de Beisbol de la Localidad de Puerto Aventuras. <b>Firma de Contrato</b> 16 de mayo del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-006-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
9	Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Primera Etapa. <b>Firma de Contrato</b> 24 de mayo del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-007-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
10	Construcción de 50 Pozos de Absorción en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad Segunda Etapa. <b>Firma de Contrato</b> 24 de mayo del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-008-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
11	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Riviera Maya del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 30 de mayo del 2022 <b>N° Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-009-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>



No. CON RECURSOS RAMO 33 FORTAMUN	
12	Rehabilitación y Mantenimiento de la Unidad Deportiva Poliforum del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 30 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-010-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
13	Rehabilitación y Mantenimiento de Unidad Deportiva Mario Villanueva del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 30 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-011-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
14	Rehabilitación del Mercado Municipal Diana Laura Riojas en la Colonia Luis Donaldo Colosio. <b>Firma de Contrato</b> 31 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-012-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
15	Construcción de Pasos Peatonales en Diversos Puntos del Municipio de Solidaridad. <b>Firma de Contrato</b> 31 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-013-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>
16	Pavimentación de Av. 70 Norte entre Av. Constituyentes y Calle 36 Norte en la Colonia el Pedregal. <b>Firma de Contrato</b> 31 de mayo del 2022 <b>Nº Contrato</b> HAS-SIyOP-FORTAMUN-014-2022 <b>Avance de Integración: 30%</b>



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Como puede Observarse, la obra denominada “Reparación de socavón en la Calle 1ra. Entre Avenida 30 y calle 35 del Municipio de Solidaridad.”, con Núm. de contrato HAS-SIyOP-RF-002-2022, presenta avance del 90%, por lo que se considera para el cumplimiento de la actividad de Integración de Expediente Técnico Unitario de Obra Pública al contener la documentación comprobatoria de la inversión pública realizada.



INSPECCIONES POR USO DE LA VÍA PÚBLICA REALIZADAS	
Unidad Responsable	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Unidad Administrativa:	SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS
Eje de Gobierno PMD	3. DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL
Programa de Desarrollo PMD	III. INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL DESARROLLO
Línea de acción PMD:	5.- ESTABLECER UN PROGRAMA PARA CONSTRUIR, RENOVAR, EQUIPAR Y REHABILITAR LOS EDIFICIOS, PARQUES Y ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO.
Periodo que se informa:	DEL: 01 DE ABRIL 2022 AL: 30 DE JUNIO DE 2022.

**Objetivo del Proyecto:** Contribuir al cuidado y conservación de la vía pública para que el municipio de solidaridad cuente con una infraestructura de calidad, que sea funcional para la población, y brinde buena imagen a nuestro municipio.

**Descripción de la actividad/Proyecto:** Se inspecciona y vigila la vía pública, para que la población haga un adecuado uso de la misma contando con los permisos correspondientes en estricto apego a la normatividad aplicable.

**Población Objetivo:** La población del Municipio de Solidaridad

**Avances del proyecto Inspecciones por Uso de la Vía Pública:**

Se programaron realizar durante el ejercicio fiscal 2022, 1400 Inspecciones por uso de la vía pública entre los permisos que llega a gestionar la ciudadanía y las obras que se intervienen en la vía pública, durante el primer trimestre se realizaron 253 y este segundo trimestre se realizaron 229, representando un avance del 34.43% equivalente a 482 inspecciones de la vía pública realizada.

**Resultados Actividad/Proyecto:**

1. Se realizaron 117 actas de inspección por uso de la vía públicas, de las cuales tenemos que 39 actas de inspección fueron atendidas por los ciudadanos acudiendo a la oficina para darle el seguimiento oportuno al mismo, como a continuación enlisto:





ABRIL-2022									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
01/04/2022	41	DESARROLLOS HIDRULICOS DE CANCUN SA DE CV	55/CONSTITUYENTES-34	PEDREGAL	RUPTURA	AP	SIN ATENDER	05/04/2022	\$ 12,403.00
01/04/2022	42	GRUPO DESARROLLADOR HABITANIA GDH							
01/04/2022	43	CONAISA DE MEXICO SA DE CV	38/25	INFONAVIT-COLOSO	RUPTURA	RAMPA	ATENDIDO	P#65	
04/04/2022	44	SE DEJO NOTIFICACION	60/10-15	COLOSO	RUPTURA	TAPIAL	ATENDIDO		
05/04/2022	45	MANTENIMIENTO PLAYA DEL CARMEN S.C.	PASEO CENTRAL/CHEMUYIL-115	CRUZ DE SERVICIO	IMCUMPLIMIENTO	PERMISO-SIN REPARAR	ATENDIDO	08/04/2022	
06/04/2022	46	VALLE AURORA SA DE CV	125	CRUZ DE SERVICIO	RUPTURA	CAMELLON	SIN ATENDER		
06/04/2022	47	SE DEJO NOTIFICACION	20/42-44	ZAZIL-HA	RUPTURA	BANQUETA	SIN ATENDER		
06/04/2022	48	GRUPO CONSTRUCTOR BONARCHI SA DE CV	SIN NOMBRE/OLIVOS-GARZA		IMCUMPLIMIENTO				\$ 12,028.00
07/04/2022	49	3A INGENIEROS SA DE CV	OLIVOS/SIN NOMBRE-SUR	FLORES	IMCUMPLIMIENTO	PEMISO			\$
07/04/2022	50	RENTERIA BELTRAN ALBERTO	75/36-38	PEDREGAL	RUPTURA	REPARAR ENERGIA ELECTRICA		14/04/2022	\$ 12,028.00
12/04/2022	51	DORAID SAMI AJIB	JUAREZ/115-120	EJIDO	MODIFICACION	RAMPA	ATENDIDO	13/04/2022	1,300.00
12/04/2022	52	VALLE AURORA SA DE CV	115/ARCO VIAL	EJIDO	RUPTURA	CAMELLON	SIN ATENDER		
13/04/2022	53	MATERAMA SA DE CV	CARRETERA FED/34-38	PEDREGAL	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
13/04/2022	54	SE DEJO NOTIFICACION	ISLA VALVINAS/BERMUDAS	VILLAMAR	OBTRUCCION	MATERIAL-RAMPA	SIN ATENDER		
14/04/2022	55	SE DEJO NOTIFICACION	25/85	EJIDO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
18/04/2022	56	RUBA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	115/ARCO BAMBU	CENTRO	INVACION	TAPIAL	ATENDIDO		
18/04/2022	57	SE DEJO NOTIFICACION	125/5-SUR	BELLAVISTA	RUPTURA	RAMPA	SIN ATENDER		
18/04/2022	58	SE DEJO NOTIFICACION	AV.COLOSO	BOSQUE REAL	EXCAVACION	AGUA POTABLE	SIN ATENDER		
19/04/2022	59	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	11/135	BELLAVISTA	EXCAVACION	FIBRA OPTICA	ATENDIDO		
20/04/2022	60	SE DEJO NOTIFICACION	10/15.	ZAZIL HA	OBTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
20/04/2022	61	ESPINWAAL -Lvadero	10/40.	ZAZIL HA	RUPTURA	MATERIAL Y RAMPA	ATENDIDO		







RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2023 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

ABRIL - 2022									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
20/04/2022	62	SE DEJO NOTIFICACION	PLAYA AZUL	GUADALUPANA	EXCAVACION	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
21/04/2022	63	SE DEJO NOTIFICACION	60/10-15	AV. COLOSO	INVACION	TAPIAL	SIN ATENDER		
21/04/2022	64	SE DEJO NOTIFICACION	42/44	ZAZIL HA	RUPTURA	DRENAJE	SIN ATENDER		
25/04/2022	65	SE DEJO NOTIFICACION	25/30	ZAZIL-HA	INVACION	PUNTALES	SIN ATENDER		
25/04/2022	66	SE DEJO NOTIFICACION	FUENTE DE MINERVA	CENTRO DEL QUINTAS	OBTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	ATENDIDO		
25/04/2022	67	SE DEJO NOTIFICACION	26/20-10	CARMEN QUINTAS	RUPTURA	BANQUETA	SIN ATENDER		
27/04/2022	68	SE DEJO NOTIFICACION	26/20-10	DEL CARMEN	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
27/04/2022	69	SE DEJO NOTIFICACION	40/1	CENTRO VILLAS DEL CARMEN	RUPTURA	RAMPA	ATENDIDO		
28/04/2022	70	SE DEJO NOTIFICACION	PAVO REAL/CANORAS 7-CANARONAS 8		OBTRUCCION	TAPIAL- TIPO MALLA	ATENDIDO	05/05/2022	
29/04/2022	71	LOPEZ FELIX HECTOR OSWALDO	105/4	EJIDO	PERMISO	ANDAMIOS	ATENDIDO	022	
29/04/2022	72	SE DEJO NOTIFICACION	GANORA/CATALUÑA	CATALUÑA II	RUPTURA	TUBULARES	LIC. ADRIAN - OFICIO	16/05/2022	

MAYO - 2022.									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
02/05/2022	73	INMOBILIARIA 1034 SA DE CV	34/10-20.	GLO GUERRERO	INCUMPLIMIENTO	SIN REPARACION		12/05/2022	\$ 28,866.00
02/05/2022	74	SE DEJO NOTIFICACION	85/25-27	EJIDO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER	2DA#89	
02/05/2022	75	SE DEJO NOTIFICACION	30/130	EJIDO FORJADORES	RUPTURA	DRENAJE	ATENDIDO		
03/05/2022	76	SE DEJO NOTIFICACION	19		RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
03/05/2022	77	SE DEJO NOTIFICACION	40/60	PEDREGAL	RUPTURA	AGUA POTABLE	SIN ATENDER		
03/05/2022	78	FRANCISCO SANTILLAN ESCOBAR	16/130 -135	EJIDO	MODIFICACION	RAMPA	ATENDIDO		



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712.  
Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



MAYO - 2022.									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
03/05/2022	79	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	TECNOLOGICO/UNIVERSIDADES-HIPOCAMPO		INCUMPLIMIENTO	CEPA 24 HRS	SIN ATENDER		
04/05/2022	80	SE DEJO NOTIFICACION	17/80-85	EJIDO	MODIFICACION	RAMPA	SIN ATENDER		
04/05/2022	81	SE DEJO NOTIFICACION	20/42-44	ZAZIL-HA	RUPTURA	DRENAJE	SIN ATENDER		
04/05/2022	82	SE DEJO NOTIFICACION	75/CONSTITUYENTES TULUM/FELIPE CARRILLO PUERTO	PEDREGAL	INVACION	TAPIAL	ATENDIDO	05/05/2022	2
04/05/2022	83	SE DEJO NOTIFICACION	LOPEZ FELIX HECTOR OSWALDO	28 DE JULIO	OBSTRUCCION	MATERIA DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
04/05/2022	84	SE DEJO NOTIFICACION	94/30-35	COLOSIO	MODIFICACION	RAMPA	SIN ATENDER		
06/05/2022	85	SE DEJO NOTIFICACION	PAVO REAL/CANORAS 4-CANARONAS 7	VILLAS DEL CARMEN	INVACION	TAPIAL	ATENDIDO #70		
06/05/2022	86	SE DEJO NOTIFICACION	105/4	EJIDO	RUPTURA	BANQUETA	ATENDIDO		
09/05/2022	87	RAUL BENJAMIN TEC CAN RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	25/130-135 CHICHEN ITZA/PUNTA SOLIMAN	BELLAVISTA	RUPTURA	DRENAJE	SIN ATENDER		\$ 600.00
12/05/2022	88	SE DEJO NOTIFICACION	30/130	EJIDO	RUPTURA	FIBRA OPTICA - P#73	SIN ATENDER		
12/05/2022	90	SE DEJO NOTIFICACION	RIO FUERTE/RIO SAN FERNANDO	GALAXIA	OBSTRUCCION	DRENAJE	SIN ATENDER		
13/05/2022	91	SE DEJO NOTIFICACION	17/80-85	EJIDO	MODIFICACION	ANDAMIOS	SIN ATENDER		
17/05/2022	92	SE DEJO NOTIFICACION	8/130	EJIDO	RUPTURA	RAMPA	ATENDER		
16/05/2022	93	SE DEJO NOTIFICACION	CARRETERA FED/ESQ. 72		INVACION	BANQUETA	ATENDIDO		
16/05/2022	94	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES	CARMEN/RIO TAPURA-XEL-HA		INCUMPLIMIENTO	TAPIAL	SIN ATENDER		
16/05/2022	95	RODOLFO LAVENANT GONZALEZ	MISSION DEL CARMEN/MSANTA FE	MISSION DEL CARMEN	INVACION	PEMISO#40 DELIMITACION/BLOCK	ATENDER		
17/05/2022	96	SE DEJO NOTIFICACION	XEL-HA/BAHIA CHETUMAL		OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
17/05/2022	97	SE DEJO NOTIFICACION	TECNOLOGICO	PETEN	INVACION	MAYA	SIN ATENDER		\$ 17,027.50
17/05/2022	98	SE DEJO NOTIFICACION	ISLA DE COREGA	VILLAMAR II	DAÑO	MEZCLA	SIN ATENDER		
23/05/2022	99	SE DEJO NOTIFICACION	45	ALMENDRO S	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		





RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

MAYO - 2022.									
FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
18/05/2022	100	SE DEJO NOTIFICACION	DOMINICO/ESPADAÑA	MISION DEL CARMEN	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
18/05/2022	101	SE DEJO NOTIFICACION	110/25-27	FORJADORE S	INVASION	TAPIAL - MAYA	SIN ATENDER		
19/05/2022	102	SE DEJO NOTIFICACION	LAVA/AGUA	GALAXIA	OBSTRUCCION	ANDAMIOS	ATENDIDO		
19/05/2022	103	SE DEJO NOTIFICACION	AGUA/PEDREGAL	GALAXIA	OBSTRUCCION	SIMBRA	SIN ATENDER		
20/05/2022	104	AVENTURA MAXICA SA DE CV	CEDRO/GUAYABA	PUERTO AVENTURAS	RUPTURA	FIBRA OPTICA	SIN ATENDER		
20/05/2022	105	SE DEJO NOTIFICACION	72/CARRETERA FEDERAL		INVASION	TAPIAL	SIN ATENDER		
20/05/2022	106	CADENA COMERCIAL OXXO	20/68	EJIDO	INVASION	TAPIAL	SIN ATENDER	22/06/2022	\$ 6,000.00
23/05/2022	107	SE DEJO NOTIFICACION	BOSQUES DEL CIPRES/BOSQUES MAROMA	CRISTO REY	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
24/05/2022	108	SE DEJO NOTIFICACION	ARCO VIAL/SUR-110-105	EJIDO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
24/05/2022	109	SE DEJO NOTIFICACION	PASE CENTRAL-XPUHA	CRUZ DE SERVICIO	RUPTURA	SIN REPARAR	SIN ATENDER		
24/05/2022	110	SE DEJO NOTIFICACION	ALGAS/PE LORO CIPRES/FORTUNA-MAROMA	ARRECIFES	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
24/05/2022	111	SE DEJO NOTIFICACION		CRISTO REY	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
25/05/2022	112	SE DEJO NOTIFICACION	38/30	ZAZIL-HA	INCUMPLIMIENTO	PERMISO-SIN REPARAR	SIN ATENDER		
25/05/2022	113	GRUPO ASENJO SA DE CV	42/15-20	ZAZIL-HA	DAÑO	MEZCLA	SIN ATENDER	26/05/2022	\$ 2,000.00
25/05/2022	114	SALVAJES DESARROLLOS INMOBILIARIOS S. DE R.L. DE CV	40/15	ZAZIL			SIN ATENDER		
26/05/2022	115	SE DEJO NOTIFICACION	CTM/15-20	ZAZIL-HA	OBSTRUCCION	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
26/05/2022	116	SE DEJO NOTIFICACION	50/5-1	COLOSIO	INVASION		SIN ATENDER		
27/05/2022	117	SE DEJO NOTIFICACION	24/115-120	EJIDO	RUPTURA	RAMPA	SIN ATENDER		
27/05/2022	118	SE DEJO NOTIFICACION	30/85-90	EJIDO	OBSTRUCCION	TAPIAL	SIN ATENDER		
27/05/2022	119	SE DEJO NOTIFICACION	SOLIDARIDAD/MAYAB-GUAYABA		INCUMPLIMIENTO	PERMISO-SIN REPARAR	SIN ATENDER		



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712.

Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

MAYO - 2022.

FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
31/05/2022	120	OFELIA ZAVALA VADO	CARPINTEROS/INDUSTRIAL	NICTE-HA	TERRACERIA	URBANIZACION	ATENDIDO		
31/05/2022	121	SE DEJO NOTIFICACION	FLOR CIRUELO/PLAYA SERENA	PORTO ALTO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
31/05/2022	122	SE DEJO NOTIFICACION	6/5-ZOFEMAT	CENTRO	RUPTURA	HUNDIMIENTO	SIN ATENDER		

JUNIO - 2022.

FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
06/06/2022	122.1	SE DEJO NOTIFICACION	CRISTO REY	SAMALA	OBSTRUCCION N	RAMPA	ATENDIDO		
07/06/2022	123	SE DEJO NOTIFICACION	6/5-ZOFEMAT	CENTRO	OBSTRUCCION N	TAPIAL	SIN ATENDER		
08/06/2022	124	RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	MAYAB/CONSTITUYENTES		INCUMPLIMIENTO	PERMISO #30	SIN ATENDER	08/06/2022	\$ 500.00
08/06/2022	125	MALOMAX SA DE CV	BUHOS	PALMAS	DAÑO	MEZCLA		08/06/2022	2
08/06/2022	126	SE DEJO NOTIFICACION	8/130	EJIDO	MODIFICACION N	RAMPA	ATENDIDO	08/06/2022	2
08/06/2022	127	SE DEJO NOTIFICACION	ISLAS GEORGINAS	VILLAMAR	OBSTRUCCION N	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
09/06/2022	128	SE DEJO NOTIFICACION	CRISTO REY	SAMALA	OBSTRUCCION N	RAMPA	ATENDIDO		
09/06/2022	129	SE DEJO NOTIFICACION	34/55-FEDERAL	PEDREGAL	MODIFICACION N	BANQUETA	ATENDIDO	10/06/2022	2
09/06/2022	130	RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	RIO SAN FERNANDO/RIO URIBE- MAYAB	GALAXIA	INCUMPLIMIENTO	PERMISO/MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
10/06/2022	131	SE DEJO NOTIFICACION	CONSTRUCTORES	NICTE-HA	RUPTURA	BANQUETA	SIN ATENDER		
10/06/2022	132	SUPER WILLYS SA DE CV	SUR/PASEO XCACEL	XCACEL	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
14/06/2022	133	SUPER WILLYS SA DE CV	LILIS/SOLIDARIDAD	FLORES	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
15/06/2022	134	PARRA LOPEZ GERMAN	CONSTRUCTORES	NICTE-HA	OBSTRUCCION N-DAÑO	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER	10/06/2022	200.00
15/06/2022	135	PARAISO DEL CARMEN I	20/30	PARAISO DEL CARMEN	RUPTURA	BANQUETA	ATENDIDO		



Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712.

Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLANTA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
15/06/2022	136	SE DEJO NOTIFICACION	CARPINTERO-CONSTRUCTORES	NICTE-HA	URBANIZACION N	SIN PERMISO	SIN ATENDER		
15/06/2022	137	7-ELEVEN DE MEXICO SA DE CV	SOLIDARIDAD/MAYAB-GUAYABA		RUPTURA OBSTRUCCION N	ENERGIA ELECTRICA MURETE	SIN ATENDER		
15/06/2022	138	SE DEJO NOTIFICACION	85/10	EJIDO			SIN ATENDER		
15/06/2022	139	7-ELEVEN DE MEXICO SA DE CV	CIRUELO	PORTO ALTO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDER		
16/06/2022	140	SE DEJO NOTIFICACION	85/25-27	EJIDO	RUPTURA OBSTRUCCION N	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
16/06/2022	141	SE DEJO NOTIFICACION	CRISTO REY	SAMALA	OBSTRUCCION N	RAMPA	ATENDIDO		
16/06/2022	142	SE DEJO NOTIFICACION	LOMAS/FUENTES	MISION DEL CARMEN	OBSTRUCCION N	ANDAMIO	SIN ATENDER		
17/06/2022	143	SE DEJO NOTIFICACION	42/10-15	ZAZIL-HA	RUPTURA	BANQUETA	SIN ATENDER		
21/06/2022	144	SE DEJO NOTIFICACION	115/8	EJIDO	RUPTURA	BANQUETA	SIN ATENDER		
21/06/2022	145	SE DEJO NOTIFICACION	21/100-110	FORJADORES	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
	146	SE DEJO NOTIFICACION	35/2	CENTRO	INVASION	TAPIAL	SIN ATENDER		
23/06/2022	147	ROGELIO TELLEZ BARONA	30/1RA Y 1RA BIS	CENTRO	RUPTURA	RAMPA	SIN ATENDER		
23/06/2022	148	INMOBILIARIA 1034	34/20-10	GONZALO GUERERERO	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	ATENDIDO		
24/06/2022	149	ENRIQUE CUERVO	TECNOLOGICO	GUADALUPANA	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
27/06/2022	149.1	LAURA MENDEZ	74/35-40	COLOSIO	OBSTRUCCION N	SIMBRA	SIN ATENDER		
27/06/2022	150	ENRIQUE CUERVO	TECNOLOGICO	GUADALUPANA	RUPTURA	ENERGIA ELECTRICA	SIN ATENDER		
28/06/2022	151	CABLEMAS TELECOMUNICACIONES	ISLAS BERMUDAS	VILLAMAR	RUPTURA	FIBRA OPTICA	SIN ATENDER		
28/06/2022	152	SE DEJO NOTIFICACION	21/100-110	FORJADORES	RUPTURA	BANQUETA	SIN ATENDER		
29/08/2022	153	SE DEJO NOTIFICACION	ALGAS/PEZ DASI	ARRECIFE	OBSTRUCCION N	MATERIAL DE CONSTRUCCION	SIN ATENDER		
30/06/2022	154	SE DEJO NOTIFICACION	85/29-31	EJIDO	SELLOS 4-5	ACTAS:74 Y 140	SIN ATENDER		
30/06/2022	155	SE DEJO NOTIFICACION	72/CARRETERA FEDERAL	PEDREGAL	OBSTRUCCION N	TAPIAL	ATENDER		



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.

Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



FECHA	#	NOMBRE	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	FECHA	PAGADO
30/06/2022	156	SE DEJO NOTIFICACION	20/50-52	COLOSIO	OBSTRUCCION N	ANDAMIOS			

2. Se recibieron 112 solicitudes de permisos para uso de la vía pública, de los cuales se entregaron **82** permisos para uso de la vía pública, de acuerdo a lo siguiente:

ABRIL -2022.												
NUMERO PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	OBSERVACION	ESTATUS	PAGADO		
01/04/2022	56			GRUPO KATNA SA DE CV	25/30-32	CENTRO			08/04/2022	\$ 19,300.00		
01/04/2022	57			DESARROLLOS SIMCA SA DE CV	FLAMINGOS/42-44	CENTRO		BANQUETA	08/04/2022	\$ 5,700.00		
22/04/2022	58	DAVID	GAMBOA	TRUJEQUE	15/125	BELLAVISTA		RAMPA		\$ 7,978.00		
01/04/2022	59			CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	ENLACE BALAMTUN	BALAMTUN		FIBRA OPTICA	29/04/2022	\$ 29,720.00		
05/04/2022	60			GRUPO DESARROLLADOR HABITANIA DGH	CTM/15-20	ZAZIL-HA		TAPIAL-RENOVACION	05/04/2022	\$ 3,800.00		
05/04/2022	61											
05/04/2022	62											
07/04/2022	63											
07/04/2022	64				20/30	CENTRO			14/04/2022	\$ 9,000.00		
07/04/2022	65				25/38	INFONAVIT			01/04/2022	\$ 4,000.00		
07/04/2022	66	TERESITA SOLEDAD	FIGUEROA	Y ALBO	ANDRES QROO	PEDREGAL			08/04/2022	\$ 2,050.00		
07/04/2022	67				52/1	COLOSIO			27/04/2022	\$ 1,890.00		



ABRIL -2022.										
NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
08/04/2022	68			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	SUR/CAMELIA-OLIVOS	FLORES	AGUA POTABLE-DRENAJE		11/04/2022	\$ 5,300.00
08/04/2022	69			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	80/KIN-39	EJIDAL	AGUA POTABLE - DRENAJE		13/04/200	\$ 1,900.00
11/04/202	70	IVONNE	VELAZQUEZ		23/105	FORJADO RES	ENERGIA ELECTRICA	\$ 39,200.00	13/04/2022	\$ 5,200.00
21/04/2022	71			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	XEL-HA/DEL CARMEN-COLOMBIA	PETEN	POCETAS		PASE A CAJA	
21/04/2022	72			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	XEL-HA/BRASIL-MEXICO	GUADALU PANA	POCETAS		28/04/2022	\$ 39,200.00
21/04/2022	73			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	XEL-HA/PASEO DEL MAYAB	GUADALU PANA	POCETAS		28/04/2022	\$ 58,800.00
21/04/2022	74			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	BAHIA ASUNCION/BC HETUMAL	GUADALU PANA	POCETAS		28/04/2022	\$ 36,400.00
21/04/2022	75			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	NICARAGUAVE CUADOR-BRASIL-COLOMBIA	PETEN	POCETAS		28/04/2022	\$ 39,200.00
21/04/2022	76			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	MAYAB/PERLA S-JUVENTUD	GUADALU PANA	POCETAS		28/04/2022	\$ 89,600.00
21/04/2022	77			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	24,22,20,16,14,25	EJIDAL	FIBRA OPTICA		08/06/2022	\$ 446,000.00
21/04/2022	78			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	5TA.	CENTRO PEDREGA L	FIBRA OPTICA		24/05/2022	\$ 36,000.00
19/04/2022	79	BROR	FEDERICO		44/70		ANDAMIOS		27/04/2022	\$ 1,700.00
20/04/2022	80			SUPER WILL YS SA DE CV	CTM/10-15	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA	\$ 4,240.00		
20/04/2022	81			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	RIO SAN FERNANDO/M	GALAXIA	REGISTROS FIBRA OPTICA			\$ 8,000.00



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
					AYABRIO URIBE					
20/04/2022	82			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV CABLEMAS TELECOMUNICACIONES SA DE CV	11 SUR/70	EJIDAL	FIBRA OPTICA		25/05/2022	\$ 14,974.00
20/04/2022	83			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	6/30-25	CENTRO	FIBRA OPTICA		29/04/2022	\$ 5,290.00
20/04/2022	84			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	CONSTITUYEN TES	EJIDAL	FIBRA OPTICA		25/05/2022	\$ 4,406.00
20/04/2022	85			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	SOLIDARIDAD/ JUAREZ- MUJERES	28 DE JULIO	FIBRA OPTICA		28/04/2022	\$ 45,660.00
20/04/2022	86	MIGUEL	SANCHEZ PEREZ	INMOBILIARIA AVENTURA MAGICA SA DE CV	75/36-38	EJIDAL	RAMPA	\$ 800.00		
20/04/2022	87			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	CEDRO/GUAY ABA	PTO-AVEN TURAS	ENERGIA ELECTRICA		27/04/2022	\$ 26,600.00
20/04/2022	88			RBA CATV SA DE CV	OLIVOS/SIN NOMBRE	FLORES	FIBRA OPTICA			\$ 4,800.00
21/04/2022	89			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV OPERACIONES COMERCIALES DE LA PENINSULA SA DE CV	80/28-30	EJIDAL	AGUA POTABLE			\$ 1,700.00
25/04/2022	90			AMIGOS ATENDIDOS AMIGOS SA DE CV	BLV LAS PALMAS/PALM A AUGUSTA	PALMAS	FIBRA OPTICA		08/06/2022	\$ 1,813,700.00
03/05/2022	91	WILLYS		GUSA CAPITAL SA DE CV	LILIS/SOLIDARI DAD		ANDAMIOS		12/05/2022	\$ 1,600.00
26/04/2022	92			URBANIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV	14/10-5TA	CENTRO	FIBRA OPTICA			\$ 2,400.00
26/04/2022	93			URBANIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV	CARRT FED/7 DIAG	EJIDAL	FIBRA OPTICA			\$ 38,041.00
26/04/2022	94			URBANIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV	LILIS		RENVIELACION DE CAJA		29/04/2022	\$ 2,000.00
26/04/2022	95			URBANIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV	LILIS/ESTRELL A		DRENAJE SANITARIO		29/04/2022	\$ 3,666.00

H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS PLAZA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta, Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P.77712.

Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122





RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2023 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

MAYO - 2022.

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
02/05/2022				RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	PUERTO MAYA	PUERTO AVENTURAS	FIBRA OPTICA	\$ 501,880.00		
02/05/2022				DESARROLLOS HIDRAULICOS SA DE CV	ISLA/STA MARIA-ISLA AZORES	VILLAMAR	AGUA POTABLE		04/05/2022	\$ 1,540.00
02/05/2022				DESARROLLOS HIDRAULICOS SA DE CV	PAVO REAL/CTM	VILLAS DEL SOL	AGUA POTABLE		04/05/2022	\$ 1,980.00
02/05/2022				OMEGA CONSTRUCCIONES SA DE CV	60/15-10	COLOSIO	TAPIAL		19/05/2022	\$ 2,000.00
100				CADURMA SA DE CV	PETEMPICH		DRENAJE SANITARIO		16/05/2022	\$ 50,000.00
09/05/2022				URBANIZACIONES DEL CENTRO SA DE CV	LILIS/SOLIDARIDAD		ENERGIA ELECTRICA	\$ 9,680,104.00	13/05/2022	\$ 7,000.00
04/05/2022				BB DEL SUR SA DE CV	CONSTI/20	VARIOS GUERRERO	FIBRA OPTICA ANDAMIOS		PRESUPUESTO	\$ 500.00
104				CADURMA SA DE CV	PETEMPICH	ARCO VIAL	AGUA POTABLE		16/05/2022	\$ 3,600.00
05/05/2022				DECOCAN SPIA DE CV	CALZADA PTO. MAYA	PUERTO AVENTURAS	RAMPA		09/05/2022	\$ 8,288.00
05/05/2022				COMERCIALIZADORA VERTIGO SA DE CV	70	EJIDAL	RAMPA	\$ 1,000.00		PASE A CAJA
12/05/2022				DESARROLLOS EKASA SA DE CV	10/24.	CENTRO	ANDAMIOS		20/05/2022	\$ 2,000.00
12/05/2022				DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	100/25-27	FORJADORE S	AGUA POTABLE		17/05/2022	\$ 3,240.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024

Avenida C.T.M. entre Avenidas 115 y 125 Norte, Super Manzana 053, Lote 022, Planta Alta,  
Fraccionamiento la Gran Plaza de la Riviera, Solidaridad, Quintana Roo, C.P. 77712.

Teléfono-extensión. 8773050 Ext.10122



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

MAYO - 2022.

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
16/05/2022	109			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	GUATEMALAVECUA DOR-ARGENTINA	MUNDO HABITAT	FIBRA OPTICA	\$ 225,440.00	PRESUPUESTO	
20/05/2022	110			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	26/25-30	GLO GUERRERO	AGUA POTABLE		27/05/2022	\$ 1,440.00
09/06/2022	111			BORPROPERTY SA DE CV	32 LT111 MZA.64	CENTRO	TAPIAL AGUA POTABLE Y DRENAJE		16/06/2022	\$ 7,360.00
112				GRUPO CHECHEN SA DE CV	KANTENAH	CRUZ DE SERVICIO	MANIOBRA		01/06/2022	\$ 39,000.00
113	ABEL	RODRIGUEZ	ARCEO		25/CTM	COLOSIO			19/05/2022	\$ 1,400.00
20/05/2022	114			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	TECNOLOGICO/PLAYA OASIS-CHEMUYIL	PARAISO	AGUA POTABLE		20/05/2022	\$ 400.00
20/05/2022	115			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	15/135-140	BELLAVISTA	AGUA POTABLE		20/05/2022	\$ 1,800.00
20/05/2022	116			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	1/15-20	AVIACION	AGUA POTABLE		20/05/2022	\$ 1,800.00
20/05/2022	117	TERESITA SOLEDAD	FIGUEROA Y ALBO		ANDRES QR	PEDREGAL	RAMPA FIBRA OPTICA	\$ 5,782.00		
20/05/2022	118			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	8 UBICACIONES	BOSQUE REAL	ENERGIA ELECTRICA			
19/05/2022	119			INSGAR ENTERPRICES SA DE CV	1/1-3.	AVIACION			20/05/2022	\$ 4,062.00
24/05/2022	120			OPERACIONES COMERCIALES DE LA PENINSULA SA DE CV	LILIS	ZONA COSTERA	RAMPA		26/05/2022	\$ 4,062.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
5 de mayo de 2022  
PLAZA DEL CAMBIO, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



MAYO - 2022.

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
24/05/2022	121			OPERACIONES COMERCIALES DE LA PENINSULA SA DE CV	AVENIDA SUR	XCACEL	RAMPA		26/05/2022	\$ 3,086.00
24/05/2022	122			OPERACIONES COMERCIALES DE LA PENINSULA SA DE CV	ESTRELLA	PALMANOVA	RAMPA		26/05/2022	\$ 4,164.00
24/05/2022	123	EMILIA	TUN		RIO URIDJUANA	VILLAS RIVIERA	RAMPA		15/06/2022	\$ 1,000.00
24/05/2022	124			BORPROPTY SA DE CV	1RA/40-42	ZAZIL-HA	TAPIAL-PUNTALES		25/05/2022	\$ 15,639.00
24/05/2022	125			CONAISA MEXICO SA DE CV	38/25-20	COLOSIO	ENERGIA ELECTRICA		01/06/2022	\$ 8,960.00
24/05/2022	126	ZENAIDA	QUIAM		CONST/60-65	EIJDAL	DRENAJE SANITARIO		25/05/2022	\$ 1,000.00

JUNIO - 2022.

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
01/06/2022	127			GRUPO DESARROLLADOR HABITANIA DGH	CTM/15-20	ZAZIL-HA	MANIOBRA	\$ 1,000.00	01/06/2022	
01/06/2022	128	<b>H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</b>				48/1	COLOSIO	TAPIAL		\$ 9,100.00
01/06/2022	129	<b>PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO 2021 - 2024</b>				24,22,20,18,16,14-125	EIJDAL	FIBRA OPTICA	\$ 282,500.00	



JUNIO - 2022.

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
01/06/2022	130			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	8 UBICACIONES	BOSQUE REAL	FIBRA OPTICA	\$ 67,160.00	PASE A CAJA	
01/06/2022	131			TOWN TOWER DEVELOPMENTS SAPI DE CV	25/5TA -10	XAMAN-HA	TAPIAL			\$ 3,810.00
01/06/2022	132			7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	SOLIDARIDAD/MAY AB	LOS OLIVOS	RAMP		02/06/2022	\$ 5,000.00
01/06/2022	133			7-ELEVEN MEXICO SA DE CV	FLOR DEL CIRUELO/PLAYA SERENA	PORTO ALTO	RAMP		02/06/2022	\$ 8,200.00
01/06/2022	134			INMOBILIARIA 1034 SA DE CV	AV59N/30-34	GONZALO GUERRERO	ENERGIA ELECTRICA			\$ 196,600.00
01/06/2022	135			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	24N/22,20,18,16,14-125	EJIDAL	FIBRA OPTICA	\$ 629,580.00		
01/06/2022	136			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN, S.A. DE C.V	7S/DIAG 75S	EJIDAL	AGUA POTABLE Y DRENAJE		09/06/2022	\$ 3,310.00
02/06/2022	137			FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV	115/58	CRUZ DE SERVICIO	ENERGIA ELECTRICA			\$ 23,000.00
02/06/2022	138			JV DESARROLLOS SAPI DE CV	ANDRES QR	PEDREGAL	TAPIAL		06/06/2022	\$ 2,700.00
02/06/2022	139			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	AMANECER/NICTECAOBA	EJIDAL	POCETAS	\$ 22,000.00		
06/06/2022	140			HOTELERA KAVIA SA DE CV	24/115-120	EJIDAL	TAPIAL		08/06/2022	\$ 5,200.00
06/06/2022	141			MXT FIBER PARTNERS SAPI DE CV	CARRT FEDI/XELHA / CHICHENITZA		FIBRA OPTICA	\$ 492,000.00		



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



JUNIO - 2022.

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
09/06/2022	142			MXT FIBER PARTNERS SAPI DE CV	COLOSIO/FLOR DE CIRUELO/LAS PALMAS II		FIBRA OPTICA	\$ 270,000.00		
07/06/2022	143			BANCA MIFELSA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	10/5TA-1RA	CENTRO	TAPIAL	\$ 8,000.00	09/06/2022	\$ 8,000.00
08/06/2022	144			GENERAL ITALY SA DE CV	90/3-5	EJIDO	POCETA	\$ 4,000.00	10/06/2022	\$ 4,000.00
08/06/2022	145			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	50/75-70	PEDREGAL	AGUA POTABLE	\$ 900.00	09/06/2022	\$ 900.00
08/06/2022	146			INMOBILIARIA 1034 SA DE CV	10/34	GLO GUERRERO	E.ELECT. / BANQUETA	\$ 27,000.00	17/06/2022	\$ 27,000.00
07/06/2022	147			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	118/125-130	EJIDAL	DRENAJE SANITARIO	\$ 1,420.00		
10/06/2022	148			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	SIAN KAAH/BLVD DE LAS AMERICAS	MUNDO HABITAT	FIBRA OPTICA	\$ 174,500.00		
10/06/2022	149			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	COLOSIO/STA MARIA	GALAXIA II	FIBRA OPTICA	\$ 235,200.00		
10/06/2022	150			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	CARRETERA FED/ TINTAL	TINTAL	POCETA	\$ 98,000.00	22/06/2022	\$ 98,000.00
15/06/2022	151			SUPER WILLYS SA DE CV	LILIS/SOLIDARIDAD	REAL IBIZA	ENERGIA ELECTRICA	\$ 19,452.00	PASE A CAJA	
15/06/2022	152			SUPER WILLYS SA DE CV	SUR/GORRIONES-CHEMUYIL	FLORES	ENERGIA ELECTRICA	\$ 12,914.00	PASE A CAJA	
16/06/2022	153			BRICKBOR SA DE CV	AV.25	CENTRO	TAPIAL	\$ 5,160.00	17/06/2022	\$ 5,160.00



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024



JUNIO - 2022.

NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
15/06/2022	154			FIZQR SAPI DE CV	CHEMUYIL	PARAISO PLAYA	RAMPA		16/06/2022	\$ 800.00
16/01/1900	155			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	1RA/15-20	AVIACION	DRENAJE SANITARIO		27/06/2022	\$ 2,760.00
17/03/2022	156			TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SAPI DE CV	BALAMCANCHE	PLAYACAR	FIBRA OPTICA	\$ 3,400.00		
22/06/2022	157			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	115/4	EIJDAL	AGUA POTABLE		27/06/2022	\$ 1,580.00
22/06/2022	158	JORGE ANDRES BRITO	SAN GERMAN		SOLIDARIDAD	28 DE JULIO	AGUA POTABLE Y DRENAJE		24/06/2022	\$ 9,200.00
22/06/2022	159			PARAISO DEL CARMEN I RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	20/30	CENTRO	BANQUETA		23/06/2022	\$ 4,500.00
22/06/2022	160			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	XEL-HA/MAYAB	GUADALUPAN A	FIBRA OPTICA	\$ 3,600.00		
22/06/2022	161			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	ASCENSION/CHETUMAL	GUADALUPAN A	FIBRA OPTICA	\$ 4,720.00		
22/06/2022	162			RED NACIONAL ULTIMA MILLA SAPI DE CV	MAYAB/PERLAS-JUVENTUD	GUADALUPAN A	FIBRA OPTICA	\$ 24,020.00		
22/06/2022	163			BANCA MIFELSA FIDEICOMISO 815/2017	38/ESQ. ZOFEMAT	CENTRO	PLACAS		29/06/2022	\$ 3,000.00
22/06/2022	164			DESARROLLOS HIDRAULICOS DE CANCUN SA DE CV	26/5-10.	XAMAN-HA	AGUA POTABLE	\$ 1,680.00		
23/06/2022	165			CECO CENTROS COMERCIALES SA DE CV	TECNOLOGICO/HIPOCA MPO		RAMPA	\$ 14,800.00	PASE A CAJA	
23/06/2022	166			NWBH SA DE CV	MAYAB/UNIVERSIDADE S		ENERGIA ELECTRICA	\$ 212,800.00		



RENOVAMOS PARA CRECER  
**SOLIDARIDAD**  
GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

Secretaría de Infraestructura  
y Obras Públicas

JUNIO - 2022.										
NUMERO DE PERMISO	NOMBRES	APELLIDO	APELLIDO	RAZON SOCIAL	DIRECCION	COLONIA	DESCRIPCION	POR PAGAR	FECHA	PAGADO
24/06/2022	167			ARQUITECTURA MAS 4	10/48-50	COLOSIO	TAPIAL	\$ 5,600.00	PASE A CAJA	

Elaboró: Ing. Yalit Guzmán González, Profesional Especializado de la Subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

RESPONSABLE

Arq. Fabián Antonio Herrera Quiam  
Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas.

AUTORIZA

C. Teresita del Niño Jesús Flota Alcocer  
Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas



H. AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PÚBLICAS  
PLAYA DEL CARMEN, QUINTANA ROO  
2021 - 2024
